

# Ontwerp-projectplan Waterwet


Verplaatsing stuw 261BU en vervanging stuw 261BZD

|               |                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Documenttitel | Ontwerp-projectplan Waterwet Verplaatsing stuw 261BU<br>en vervanging stuw 261BZD |
| Status        | Concept                                                                           |
| Datum         | 9 december 2020                                                                   |

## 1. AANLEIDING EN DOEL

Stuw 261BU, welke als uitlaat dient van de Brink, is momenteel achterloops en dient vervangen te worden. Enkele meters benedenstrooms zijn momenteel rijplaten in de watergang gebracht om tegendruk te bieden.

Stuw 261BZD, welke als inlaat dient voor de Brink, is op dit moment een afsluiter. Deze dient vervangen te worden door een klepstuw zodat de inlaat exacter regelbaar is. De Brink wordt door het waterschap ingezet als waterbuffer voor drogere periodes.

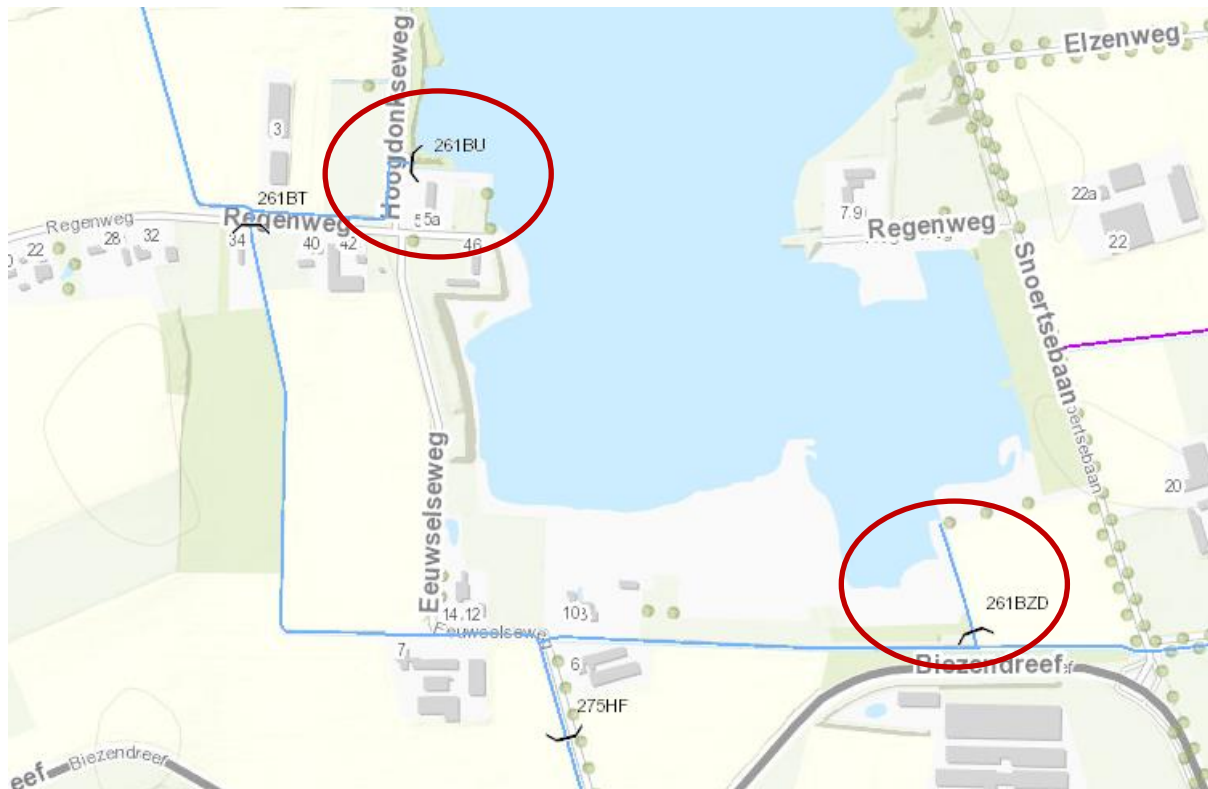

*Figuur 1 Locatie stuw 261 BU en 261BZD*

## 2. LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED

De Brink ligt aan de hoogdonkseweg in Liessel. Op de brink vinden zandwinningen plaats door de Xella zandsteenfabriek.

## 3. BESCHRIJVING VAN DE WATERSTAATSWERKEN

Stuw 261BU is een klepstuw maar is achterloops waardoor er onnodig en ongewenst water de Brink verlaat. Deze zal enkele meters benedenstrooms vervangen worden door een nieuwe klepstuw.

Het inlaatwerk 261BZD bestaat uit een afsluitklep die open en dicht wordt gezet om de waterstand op de Brink te regelen. Om nauwkeuriger water in te laten dient deze afsluitklep vervangen te worden door een klepstuw.

#### **4. BESCHIKBAARHEID GRONDEN**

Stuw 261 BU ligt momenteel op grond in eigendom van Xella Hoogdonk. De nieuwe locatie is in eigendom van het waterschap.

Afsluiter 261BZD ligt op eigendom van Staatsbosbeheer en een particuliere eigenaar. Er hoeft geen grond te worden aangekocht in het kader van de aanpassingen.

#### **5. EFFECTEN VAN HET PLAN**

Het doel van de aanpassing is het verhelpen van de negatieve effecten van de huidige situatie:

- Het voorkomen van waterverlies door de achterloopsheid van huidige stuw 261BU
- Het (beter) kunnen sturen van de inlaat van water richting de Brink.

Er zullen geen negatieve effecten gemoeid zijn met het plan. Tijdens de uitvoering wordt de omgeving tijdelijk belast met werkverkeer.

#### **6. WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD**

Planning: april 2021

Wijze van uitvoering: De uit te voeren werkzaamheden zullen worden vastgelegd in een plan van aanpak. Vooraf vindt met de aangrenzende eigenaren afstemming plaats over de werkzaamheden en worden zaken als toegang tot het werkterrein, betreden percelen en eventueel opslag van materialen en materieel afgestemd. Tevens worden eventuele andere aandachtspunten door de afstemming vooraf vroegtijdig gesignaleerd.

De werkzaamheden worden onder toezicht van het waterschap uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden zullen in de eerste maanden controles plaatsvinden op de peilen en de effecten van de aanpassingen en wordt dit ook besproken met de aangrenzende eigenaren.

#### **7. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD**

##### **7.1 Legger**

De nieuwe locatie van stuw 261BU zal worden ingemeten en op de legger worden opgenomen. Ook de nieuwe informatie van stuw 261BZD zal op de legger worden opgenomen.

##### **7.2 Beheer en onderhoud**

De stuwen wordt door het waterschap bediend en onderhouden.

De stuwen zullen de volgende laagste en hoogste peil krijgen:

261BU:

Maximale reikwijdte:

Laagste stuwstand 27,7m NAP

Hoogste stuwstand 28,4 m NAP

Beheermarge:

Streefpeil: 28,08 – 28,23 m NAP

261BZD:

Laagste peil 28,0 m NAP

Hoogste peil 29,0 m NAP

## DEEL II VERANTWOORDING

### 1) Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder

- Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).
- Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

### 2) Verantwoording op basis van beleid

#### 2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan 2016 – 2021

In het waterbeheerplan 2016 – 2021 is opgenomen dat in de planperiode toegewerkt wordt naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem. In dat kader dient waterconservatie op Hoogdonk geoptimaliseerd te worden.

#### 2.2 Toets overig beleid

Keur waterschap Aa en Maas

Voor het vervangen of herplaatsen van een stuw in een A water worden de voorschriften uit de Algemene regels Keur in acht genomen. Dat zijn:

Voor het vervangen van stuwen worden de voorwaarden uit de Beleidsregels Keur waterschap Aa en Maas toegepast.

### 3) Verantwoording van de keuzen in een project

*Vervanging stuwen*

De stuwen (in en uitlaat Hoogdonk) dienen vervangen te worden om het watersysteem te optimaliseren. Stuw 261BU dient vervangen te worden omdat deze op dit moment lekt. Stuw 261BZD dient vervangen te worden te maken.

*Wat wordt aangepast*

Vervangen van stuw 261 BU enkele meters benedenstrooms om achterloopsheid (lekken) te voorkomen. Het waterschap draagt de kosten voor de vervanging van de stuwen.

*Belanghebbende(n) geïnformeerd*

Waterschap Aa en Maas zal belanghebbende(n) vooraf informeren over het project, uitvoerende aannemer zal met belanghebbende(n) de planning van de uitvoering communiceren.

## **RECHTSBESCHERMING**

### **UITGEBREIDE UNIFORME OPENBARE VOORBEREIDINGSPROCEDURE (AFD. 3.4 Awb)**

#### **Zienswijze**

*Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Voordat het waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Een reactie moet vóór afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen.*

#### **Beroep en hoger beroep**

*Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingediend bij de Raad van State.*

#### **Crisis- en herstelwet**

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

#### **Verzoek om voorlopige voorziening**

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening” worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd.
