

INRICHTINGSMAATREGELEN T.B.V. PROJECT WATERSCHAPSZORG

DEELGEBIED 11 - KAMPEREILANDEN

Z/21/044150

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter Van Deenweg 186
8025 BM Zwolle
Postbus 60, 8000 AB Zwolle


E-mail: waterschapszorg@wdodelta.nl
Website: www.wdodelta.nl/waterschapszorg
Telefoonnummer: 088 - 2331200

Datum: 10-12-2021

Status: Definitief 1.0

Het afdelingshoofd Vergunningen, handhaving en grondzaken van het Waterschap Drents Overijsselse Delta besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, namens het dagelijks bestuur het onderhavige projectplan vast te stellen.(*)

Zwolle, 20 december 2021



(* Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid tot vaststelling van dit projectplan gedelegeerd bij besluit van 4 januari 2016. Dit besluit is gepubliceerd op www.overheid.nl in het Waterschapsblad van 11 januari 2016, jaargang 2016, nr. 145. Vervolgens is via mandaat en ondermandaat genoemd afdelingshoofd bevoegd geworden.)

Leeswijzer

Dit projectplan bestaat uit vier delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het plan van belang zijn.

1.1. Inhoud

PROJECTPLAN WATERWET	1
INRICHTINGSMAATREGELEN T.B.V. PROJECT WATERSCHAPSZORG	1
DEELGEBIED 11 - KAMPEREILANDEN	1
LEESWIJZER	3
1. INHOUD	4
DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING	5
1. AANLEIDING EN DOELEN	5
1.1. AANLEIDING	5
1.2. DOELEN	5
2. PLANGEBIED	6
3. INRICHTINGSWERKZAAMHEDEN T.B.V. PROJECT WATERSCHAPSZORG.	7
3.1 Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden	7
3.2 Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen	8
3.2 Inrichtingsmaatregelen om kleine waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
4. BESCHIKBAARHEID GRONDEN	21
5. EFFECTEN	21
6. UITVOERING (WIJZE WAAROP HET WERK ZAL WORDEN UITGEVOERD)	21
7. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET BEPERKEN VAN NADELIGE GEVOLGEN	21
8. LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD	22
9. SAMENWERKING	22
DEEL II – VERANTWOORDING	24
1. WET- EN REGELGEVING	24
2. BELEID	25
3. PROJECTKEUZES	26
4. VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN	27
DEEL III – RECHTSBESCHERMING	28
1. BEZWAAR	28
2. BEROEP	28
3. CRISIS- EN HERSTELWET	28
4. VOORLOPIGE VOORZIENING	28
DEEL IV – BIJLAGEN	29
1. KAARTEN EN TEKENING	29
1.1 Overzichtskartaat maatregelen projectplan Vledder	29
1.2 Kaarten met locaties van maatregelen uit rapportage waterschapszorg	29
1.3 Kaarten met locaties van knelpunten uit de knelpuntenanalyse KWK	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. VERGUNNINGENSCAN DEELGEBIED VLEDDER	29

DEEL I – PROJECTBESCHRIJVING

1. Aanleiding en doelen

1.1. Aanleiding

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft in 2017 nieuwe hydrologische criteria vastgesteld waarmee watergangen worden ingedeeld. Dit was nodig vanwege de fusie in 2016 en vanwege de wettelijke eis om het beheer en onderhoud van het watersysteem op hydrologische criteria te baseren. Er zijn drie categorieën, namelijk A-, B- en C-watergangen. Ook wel de primaire watergangen (A), secundaire watergangen (B) en overige watergangen (C) genoemd. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat sommige watergangen van status gaan wijzigen en daarmee ook het beheer en onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat WDODelta stopt met het schouwen van een bepaalde sloot, in het geval van een wijziging van een B- naar een C-status. Ook kan het zijn dat WDODelta het onderhoud van een watergang overdraagt aan een aanliggende eigenaar of andersom. De komende jaren voert WDODelta de nieuwe indeling van watergangen in het gehele beheergebied in. Dit wordt de invoering van Waterschapszorg genoemd. Meer informatie over Waterschapszorg is te vinden in deel II, hoofdstuk 2 van dit Projectplan.

Uit de nieuwe hydrologische criteria volgt een nieuwe indeling van watergangen. Door de nieuwe indeling van watergangen, wijzigen voor een deel ook de onderhoudsplichtigen. Om het voor de toekomstige onderhoudsplichtigen mogelijk te maken het onderhoud aan de watergang uit te voeren, past WDODelta daar waar nodig de onderhoudsinrichting aan. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. het verplaatsen van afrastering, het weghalen, verplaatsen en vervangen van dammen en duikers en het frezen en inzaaien van voormalige onderhoudspaden.

De nieuwe indeling van watergangen wordt per deelgebied stapsgewijs ingevoerd. Voor deelgebied Kampereilanden zijn de werkzaamheden bekend die hiervoor nodig zijn. Werkzaamheden die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn beschreven in dit Projectplan Waterwet.


Daar waar de maatregelen leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk, zijn deze ook beschreven in dit Projectplan Waterwet.

1.2. Doelen

In dit projectplan worden maatregelen beschreven die de onderhoudsinrichting van watergangen aanpassen zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan deze watergangen kunnen uitvoeren. De nieuwe onderhoudsplichtigen worden formeel vastgelegd in de Legger Oppervlaktewaterlichamen;

1.3. Plangebied

In totaal zijn er 25 deelgebieden. In dit rapport wordt deelgebied 11 besproken. Deelgebied 11, Kampereilanden is westelijk gelegen in het beheergebied van WDO Delta, zie figuur 1. Het deelgebied ligt ten noorden van Kampen en IJsselmuiden en bevat onder andere de stad Genemuiden.

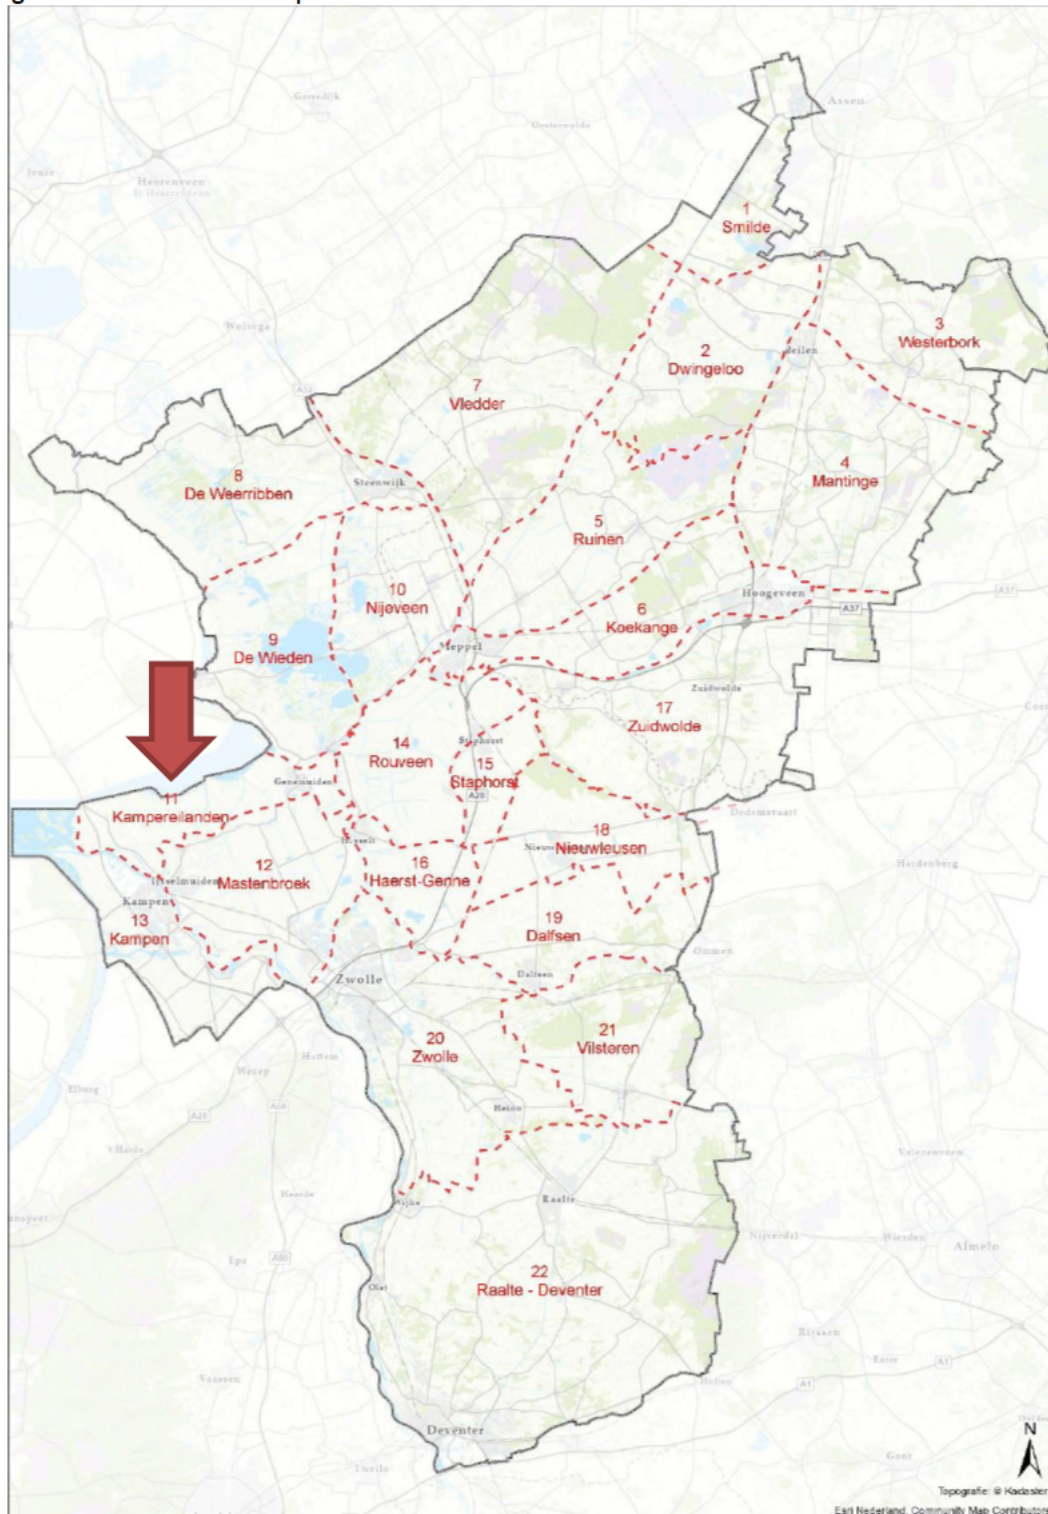


Figuur 1 – Overzichtstekening deelgebieden.

1.4. Inrichtingswerkzaamheden t.b.v. project waterschapszorg.

3.1 Maatregelen die leiden tot inrichtingswerkzaamheden

Als gevolg van statuswijzigingen van watergangen is gekeken of inrichting moet worden aangepast om het onderhoud over te kunnen dragen aan de nieuwe onderhoudsplichtige. Maatregelen die nodig zijn om de onderhoudsinrichting aan te passen noemen we waterschapszorg maatregelen. Alle maatregelen die leiden tot een wijziging van een waterstaatswerk zijn opgenomen in dit projectplan. In de afbeelding hieronder een totaal overzicht van deze maatregelen. De overzichtstekening is tevens als bijlage 1.1 bij dit projectplan gevoegd.

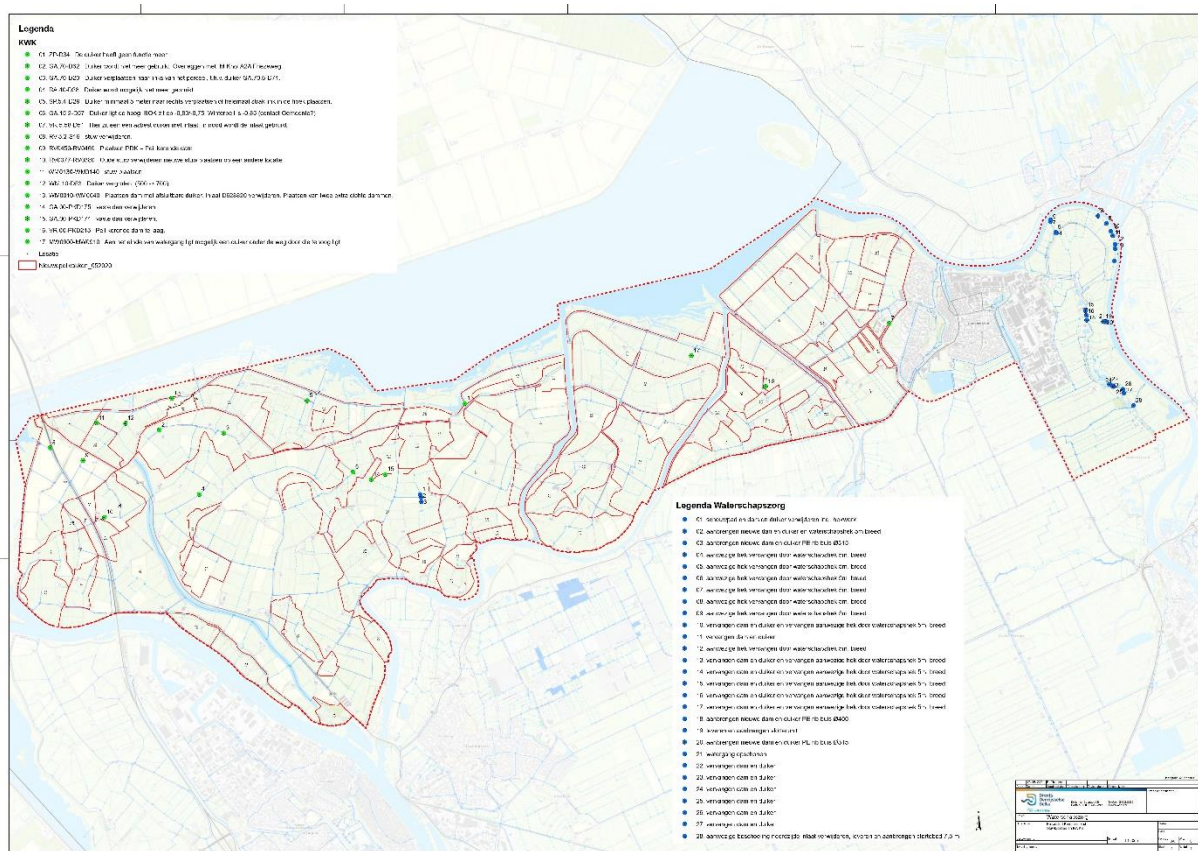

Figuur 2 – Overzicht maatregelen.

3.2 Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen

In onderstaande tabel staan de inrichtingswerkzaamheden als gevolg van een statuswijziging die leiden tot een aanpassing aan een waterstaatskundig werk.

Doel			Onderhoudsinrichting aanpassen door gewijzigde indeling watergangen (Waterschapszorg)	
	Maatregel	Locatie		
Werknummer 1	-Nieuwe dam en duiker plaatsen 8m boven breedte. -Bestaande dam verwijderen. - Dam + duiker (RA.5.24-D89) verwijderen	Kampereilanden Watergang RV0090- RV0110 Zie bijlage 1.2		
Werknummer 2	-Nieuwe Dam + Duiker plaatsen in watergang GA1070-GA1090. - Nieuwe Dam + Duiker plaatsen in watergang GA1090-GA1100	Kampereilanden Watergang GA1070- GA1090 Zie bijlage 1.2		
Werknummer 3	-Het onderhoudspad ophogen. - in/ uitlaat automatiseren. (GC.15.10-D58) - Het verwijderen van de duiker (GC.15.5-D12), (GC.15.5-D13) en (GC.15.5-D14), plaatsen nieuwe.	Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden Watergang GC0040- GC0050 tot en met GC0070-GC0080 Zie bijlage 1.2		
Werknummer 4	Op verschillende locaties: -vervangen dammen en duikers	Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden Watergang GC0350- GC0370 tot en met GC0490-GC0500. Zie bijlage 1.2		
Werknummer 5	- De aanwezige beschoeiing aan de noordzijde van de inlaat SD-D1 verwijderen - Het verwijderen van de duiker (SD-D6), (SD-D2), (SD-D3), (SD-D4), (SD-D5) en nieuwe dam + duiker plaatsen. - 250 meter vanaf de inlaat vijzelen/op profiel brengen aan de zijde van de hoofdwaterkering	Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden Watergang SD0010- SD0030 tot en met SD0050-SD0080 Zie bijlage 1.2		
Werknummer 6	-Het verwijderen van de duiker (SD-D52). Nieuwe dam + duiker plaatsen. -watergang opschonen en baggeren -Het aanbrengen van dam inclusief duiker op verschillende plekken. -In greppel pvc-buis (125 mm) plaatsen en aanvullen met grond voor vlakke onderhoudsroute.	Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden Watergang SD0080- SD0090 tot en met SD0170-SD0180 Zie bijlage 1.2		



Tabel 1 – Inrichtingsmaatregelen om waterschapszorg knelpunten op te lossen

Beschrijving werkzaamheden per werknummer

Werknummer 1. Watergang RV0090-RV0110.

Locatie:

De positie van de nieuw te plaatsen dam, duiker en hek is in de westelijke watergang langs de N50 (RA0230-RA0293) en is gelegen ten oosten van de Kattewaardweg 7 en watergang RV0090-RV0110 te Kampereilanden.

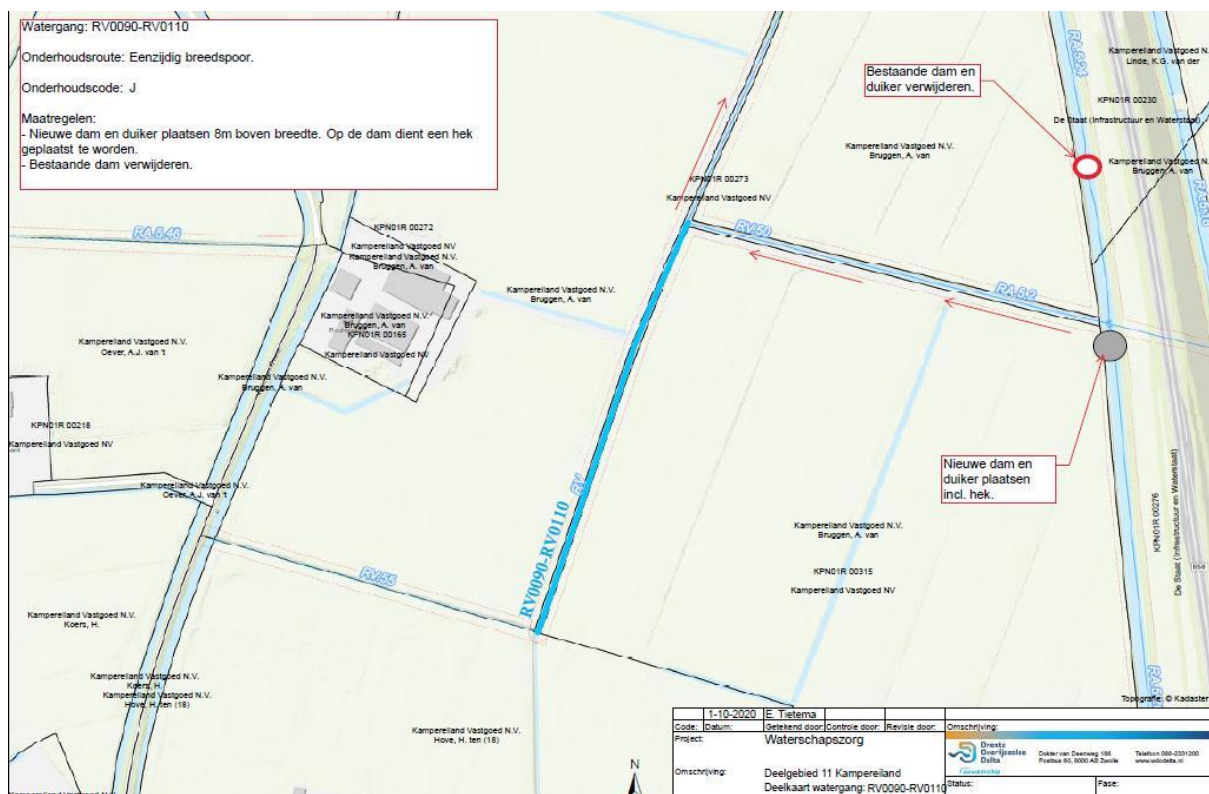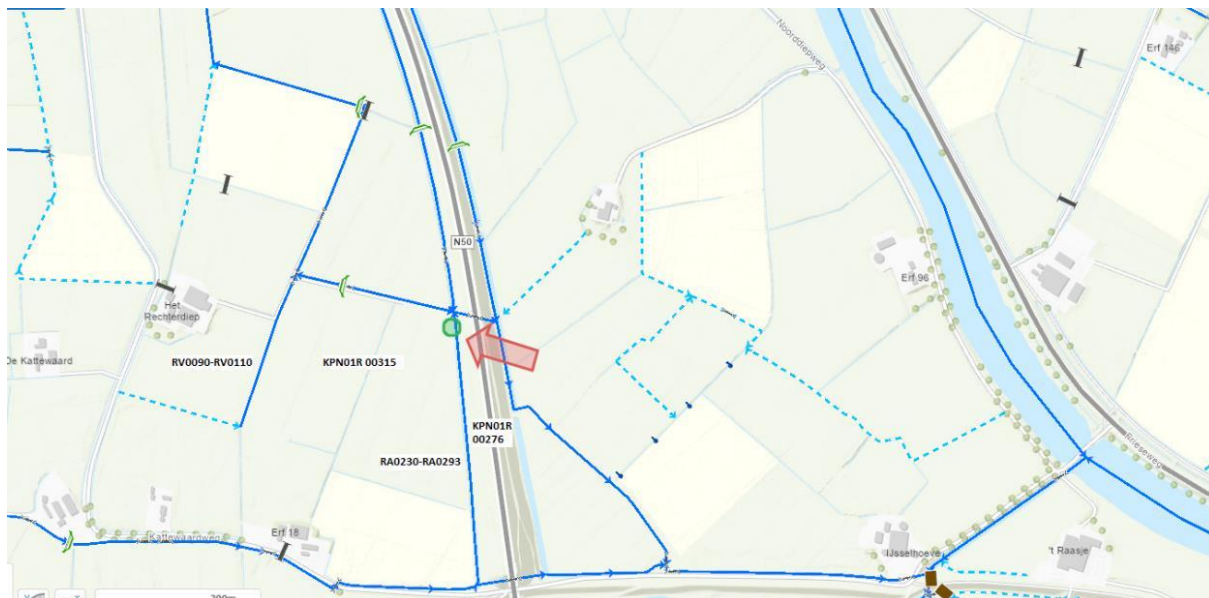

Leggerprofiel:

- Lengte	289 meter
- Bodembreedte	0,8 meter
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,15 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,15 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd
- Onderhoudsinrichting	Eenzijdig Breedspoor
- Watergang type	A>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren/pachters bevinden zich aan de watergang:

- Perceel KPN01R 00315: Kampereilanden Vastgoed NV (pachter: de heer A. van Bruggen);
- Perceel KPN01R 00276: De Staat (Infrastructuur en Waterstaat).

Aanleiding werkzaamheden:

Ten behoeve van een efficiëntere onderhoudsroute dient er een nieuwe dam + duiker geplaatst te worden.

Werkzaamheden:

1. Nieuwe Dam + Duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Diameter $\varnothing 1.000\text{mm}$

Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Hydrologie bepaalt de inwendige diameter + de BOK. Zie grijze stip op kaart.



- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

3. Dam + duiker (RA.5.24-D89) verwijderen, zie rood-witte stip op kaart.

Een kaart met de locatie van werknummer 1 is te vinden in bijlage 1.2.

Werknummer 2. Watergang GA1070-GA1090.

Locatie: Watergang GA1070-GA1090 ligt ten westen van de Welleweg (ter hoogte van huisnummer 2) en ten noorden van de Nesweg (ter hoogte van nummer 8) te Kampereilanden.

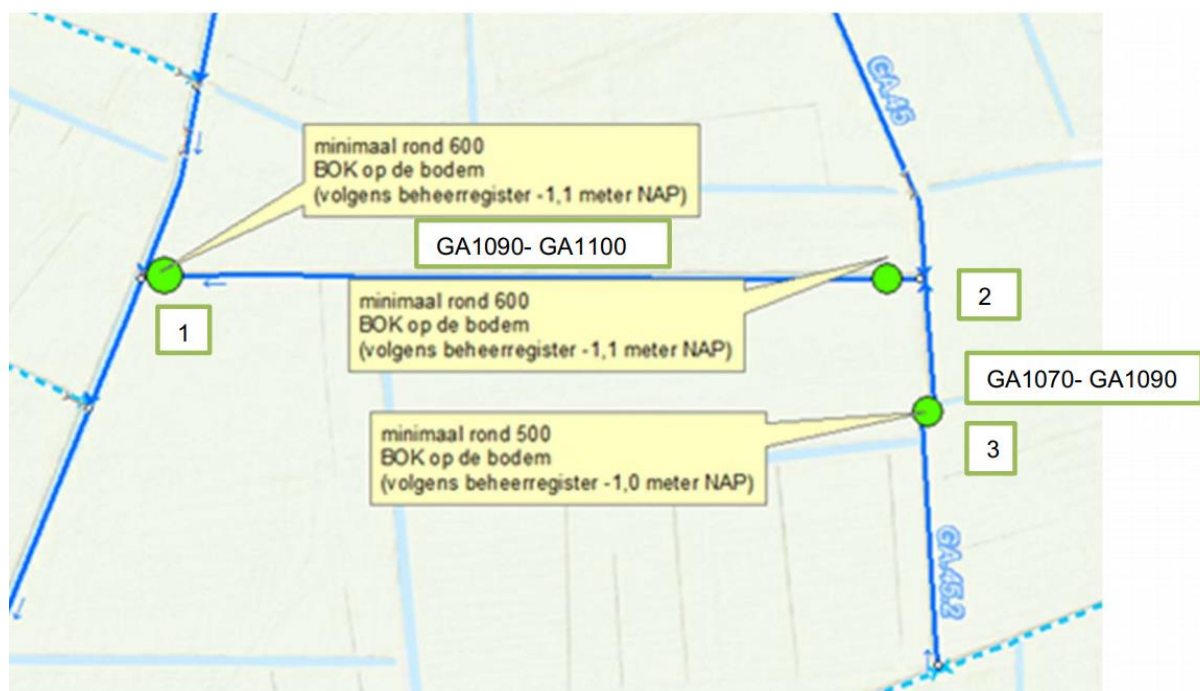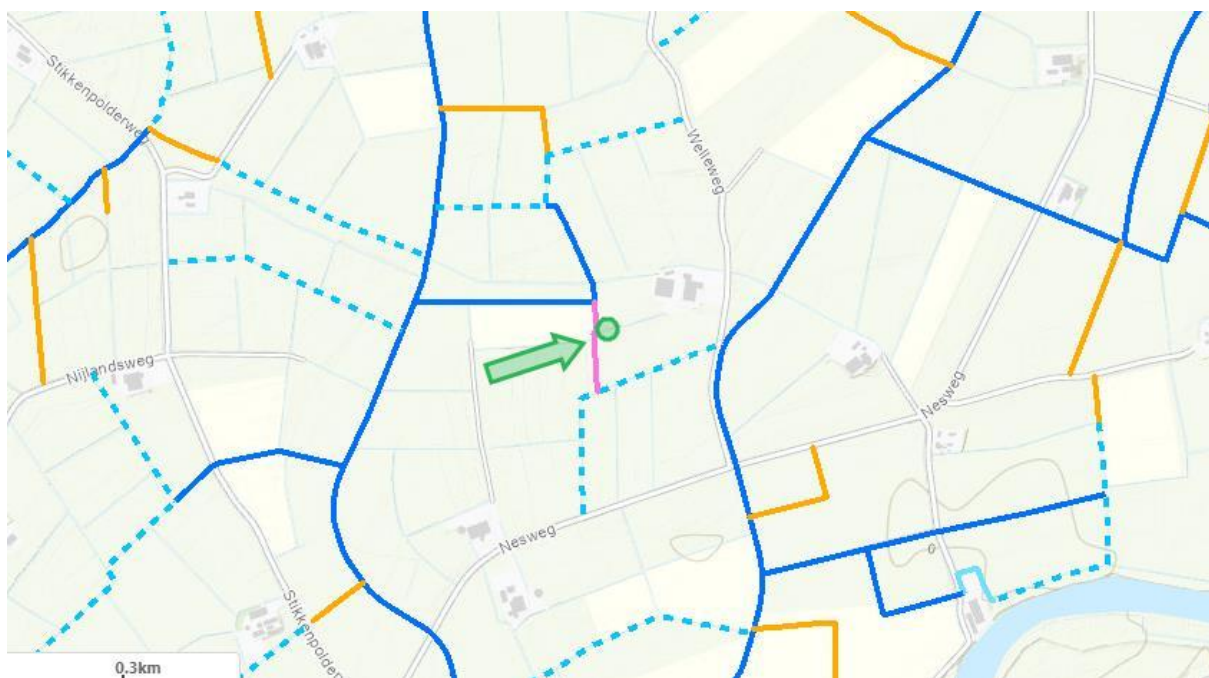

Leggerprofiel:

- Lengte	200 meter
- Bodembreedte	0,70 meter
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,00 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,00 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd
- Onderhoudsinrichting	Eenzijdig Breedspoor
- Watergangtype	B>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren/pachters bevinden zich aan de watergang:

- Perceel KPN01T 00245: Kampereiland Vastgoed N.V. (pachters: de heer Z.M. Stoel en de heer P.G. Kloosterman).

Aanleiding werkzaamheden:

N.a.v. de statuswijziging van de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden:

1. Nieuwe Dam + Duiker plaatsen in watergang GA1090-GA1100 (zie bijgevoegde tekening in bijlage 1.2; noord-oostelijke dam) met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton ø600mm). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Op deze dam een ijzeren waterschap hek plaatsen en aanleggen conform aanleg catalogus.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

2. Nieuwe Dam + Duiker plaatsen in watergang GA1090-GA1100 (zie bijgevoegde tekening in bijlage 1.2; westelijke dam) met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton ø600mm). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Op deze dam een ijzeren waterschap hek plaatsen en aanleggen conform aanleg catalogus.


- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

3. Nieuwe Dam + Duiker plaatsen in watergang GA1070-GA1090 (zie bijgevoegde tekening in bijlage 1.2; zuid-oostelijke dam) met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton ø600mm). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Op deze dam een ijzeren waterschap hek plaatsen en aanleggen conform aanleg catalogus.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

Een kaart met de locatie van werknummer 2 is te vinden in bijlage 1.2.

Locatie: Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden.

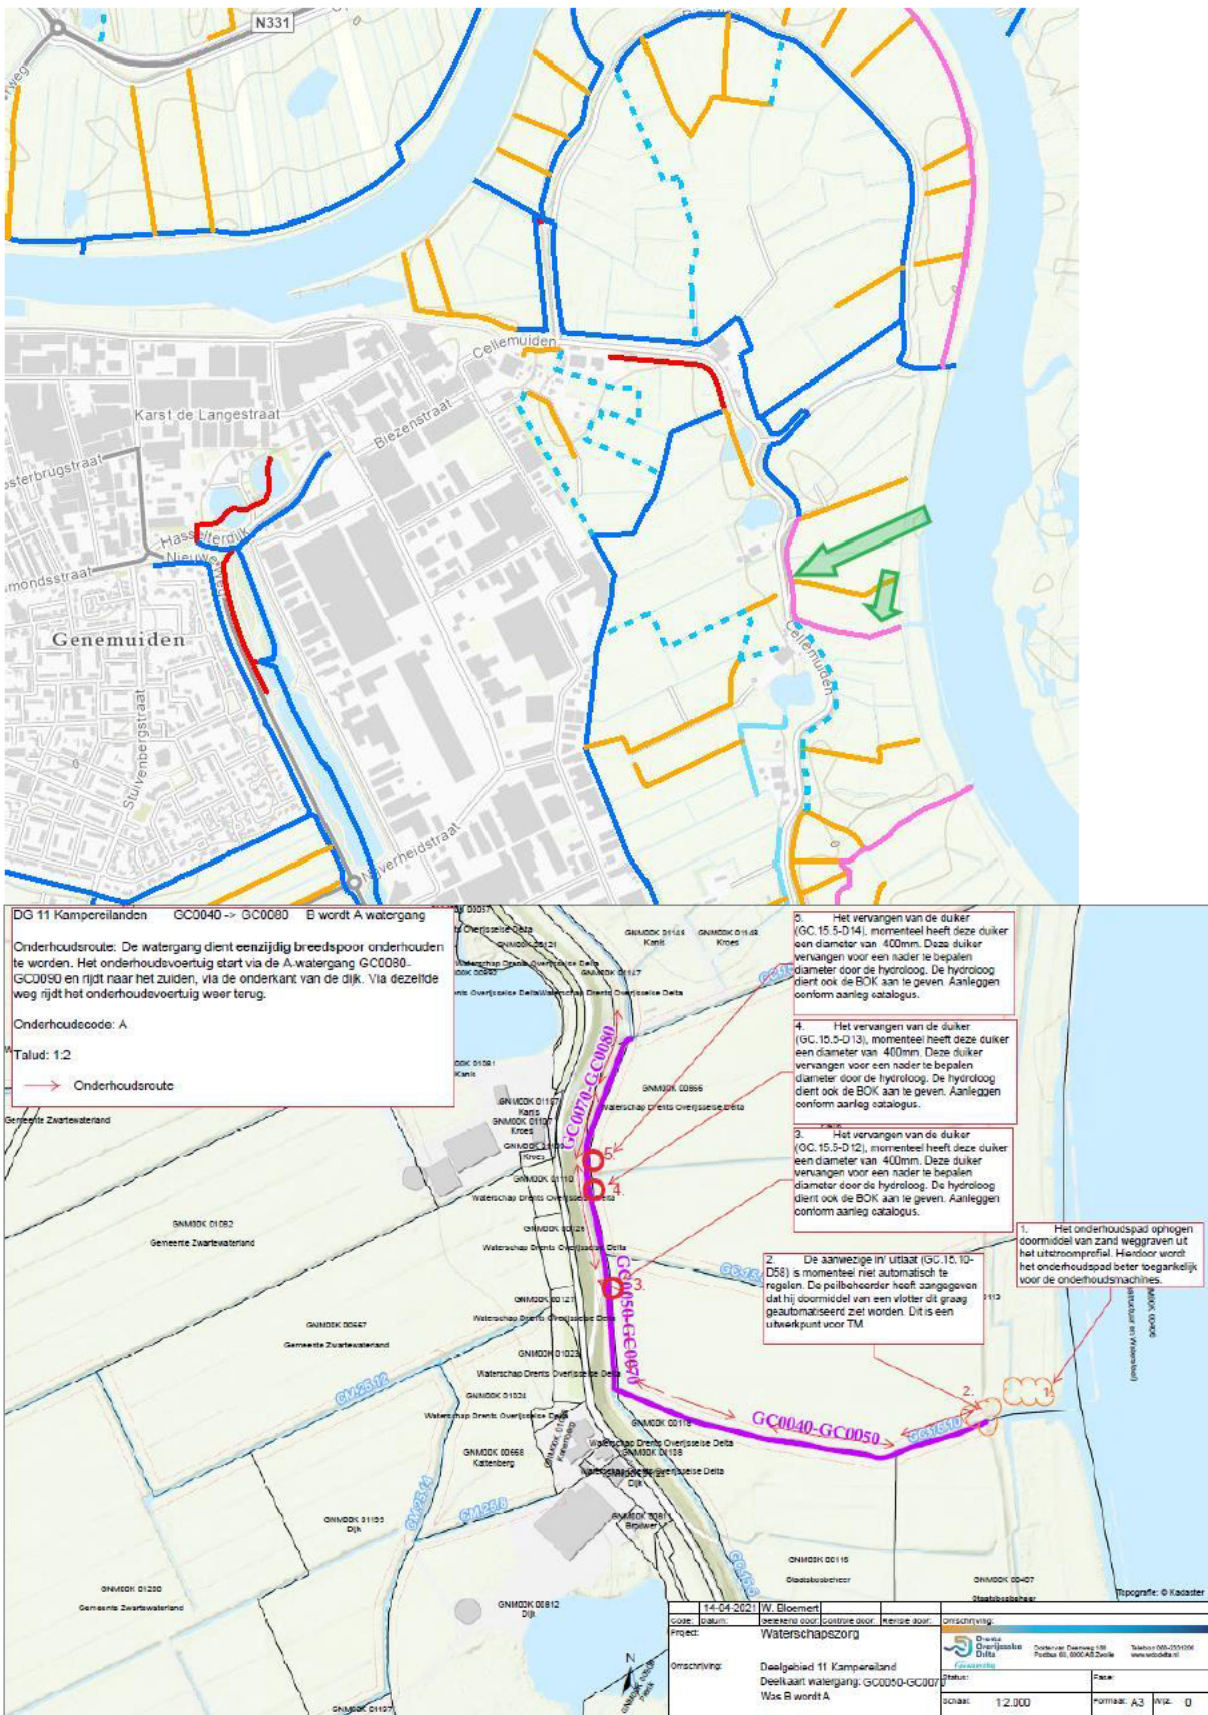

Leggerprofiel:

- Lengte (totaal)	500 meter
- Bodembreedte	Variërend van 0,70 m. (GC0040-GC0050) tot 0,90 m. (GC0070-GC0090)
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,45 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,40 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd.
- Onderhoudsinrichting	Eenzijdig Breedspoor
- Watergangtype	B>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren/pachters bevinden zich aan de watergang:

- Perceel GNM00K 00113: de heer D. van Dijk;
- Perceel GNM00K 00867: de heer C.R. Pierik;
- Perceel GNM00K 00118: WDOD (dijkbeheer);
- Perceel GNM00K 00116 en 00407: Staatsbosbeheer (pachter: D. van Dijk).

Aanleiding werkzaamheden:

N.a.v. de statuswijziging van de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden:


1. Het onderhoudspad ophogen doormiddel van specie (circa 1 kuub per strekkende meter) weggraven uit het uitstroombroef. Hierdoor wordt het onderhoudspad beter toegankelijk voor de onderhoudsmachines.
3. Het verwijderen van de duiker (GC.15.5-D12), momenteel heeft deze duiker een diameter van 400mm. Een nieuwe duiker plaatsen (beton) met minimale boven breedte van 8 meter.
Diameter ø600mm beton
 - Taluds dam bekleden met stapelzoden.
 - Taluds en grondlichaam dam inzaaien.
4. Het verwijderen van de duiker (GC.15.5-D13), momenteel heeft deze duiker een diameter van 400mm. Een nieuwe duiker plaatsen (beton) met minimale boven breedte van 8 meter.
Diameter ø600mm beton
 - Taluds dam bekleden met stapelzoden.
 - Taluds en grondlichaam dam inzaaien.
5. Het verwijderen van de duiker (GC.15.5-D14), momenteel heeft deze duiker een diameter van 400mm. Een nieuwe duiker plaatsen (beton) met minimale boven breedte van 8 meter.
Diameter ø600mm beton
 - Taluds dam bekleden met stapelzoden.
 - Taluds en grondlichaam dam inzaaien.
6. *Op de legger staat dat in de GC0040-GC0050 een duiker ligt. Dit is onjuist. Er ligt een betonplaat over de watergang als zijnde een bruggetje. In overleg met gebiedsbeheerder is besloten hier een dam met duiker te maken, zodat situatie overeenkomt met de Legger.*

Een kaart met de locatie van werknummer 3 is te vinden in bijlage 1.2.

Werknummer 4. Watergang GC0350-GC0370 tot en met GC0490-GC0500.

Locatie:

Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden

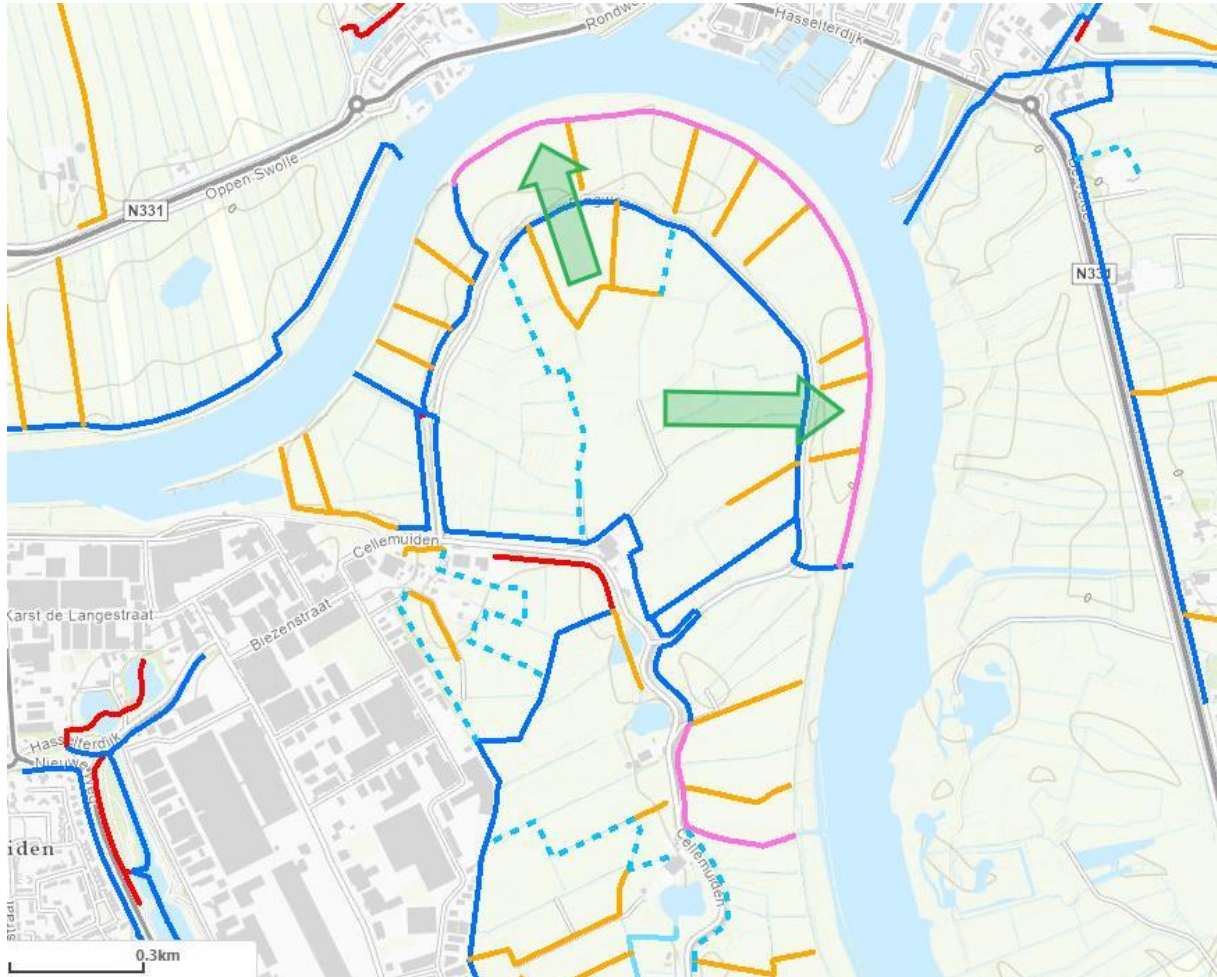

Leggerprofiel:

- Lengte (totaal)	1800 meter
- Bodembreedte	0,70 meter
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,30 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,30 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd
- Onderhoudsinrichting	Eenzijdig Breedspoor
- Watergangtype	B>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren bevinden zich aan de watergang:

- Percelen GNM00K 00075, 00567, 00568, 00341 en 00515: de heer A. Tuin;
- Percelen GNM00K 00340, 00342, 00082: Staatsbosbeheer;
- Perceel GNM00K 00514: de heer D. van Dijk;
- Percelen GNM00K 00083 en 00084: de heer J. Weens;
- Perceel GNM00K 00085: mevrouw B.A. Oldenhuis;
- Perceel GNM00K 00072: de heer L. Zwanepol.

Aanleiding werkzaamheden:

N.a.v. de statuswijziging van de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden:

2. Het verwijderen van de duiker (GC.20.8-D20) + Nieuwe Dam en duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang.

Diameter ø500mm, beton

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

4. Het verwijderen van de duiker (GC.20.8-D21). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang.

Diameter ø500mm, beton

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

6. Het verwijderen van de duiker (GC.20.8-D22). Nieuwe Dam + Duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A – Watergang.

Diameter ø500mm, beton

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

8. Het verwijderen van de duiker (GC.20.8-D23). Nieuwe Dam + Duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A – Watergang.

Diameter ø500mm, beton

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

Een kaart met de locatie van werknummer 4 is te vinden in bijlage 1.2.

Werknummer 5. Watergang SD0010-SD0030 tot en met SD0050-SD0080.

Locatie:

Op Cellemuiden ten oosten van Genemuiden.



Leggerprofiel:

- Lengte (totaal)	585 meter
- Bodembreedte	Variërend van 0,70 m. (SD0010-SD0030) tot 0,90 m. (SD0050-SD0080)
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,50 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,35 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd, zie wel: vijzelen (punt 7)
- Onderhoudsinrichting	Eenzijdig Breedspoor
- Watergangtype	B>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren/pachters bevinden zich aan de watergang:

- Percelen HST00G 00969 00774 00553: WDOD (dijkbeheer);
- Perceel HST00G 00777, 00968, 00435 00773 00437 00440: Staatsbosbeheer (pachter: de heer D.G. Selles).

Aanleiding werkzaamheden:

N.a.v. de statuswijziging van de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

Werkzaamheden: **Zie bijlage kaart Erik Tietema**

1. De aanwezige beschoeiing aan de noordzijde van de inlaat SD-D1 verwijderen. Lengte 15m. Leveren en aanbrengen stortebed lang 7,5m. Vezel versterkt stampbeton conform aanlegcatalogus.

2. Het verwijderen van de duiker (SD-D6). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker $\varnothing 500\text{mm}$, beton
- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

3. Het verwijderen van de duiker (SD-D2). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker $\varnothing 500\text{mm}$, beton
- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

4. Het verwijderen van de duiker (SD-D3). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker $\varnothing 500\text{mm}$, beton
- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

5. Het verwijderen van de duiker (SD-D4). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker $\varnothing 500\text{mm}$, beton
- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.


6. Het verwijderen van de duiker (SD-D5). Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker $\varnothing 500\text{mm}$, beton
- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

7. 250 meter vanaf de inlaat vijzelen/op profiel brengen aan de zijde van de hoofdwaterkering. Exacte locatie door directie- toezichthouder te bepalen. Verbreding is minder dan 30 centimeter. Werkzaamheden blijven binnen de legger van deze watergang

Een kaart met de locatie van werknummer 5 is te vinden in bijlage 1.2.

Werknummer 6 . Watergang SD0080-SD0090 tot en met SD0170-SD0180.

Locatie: Op Cellemuiden ten oosten Genemuiden

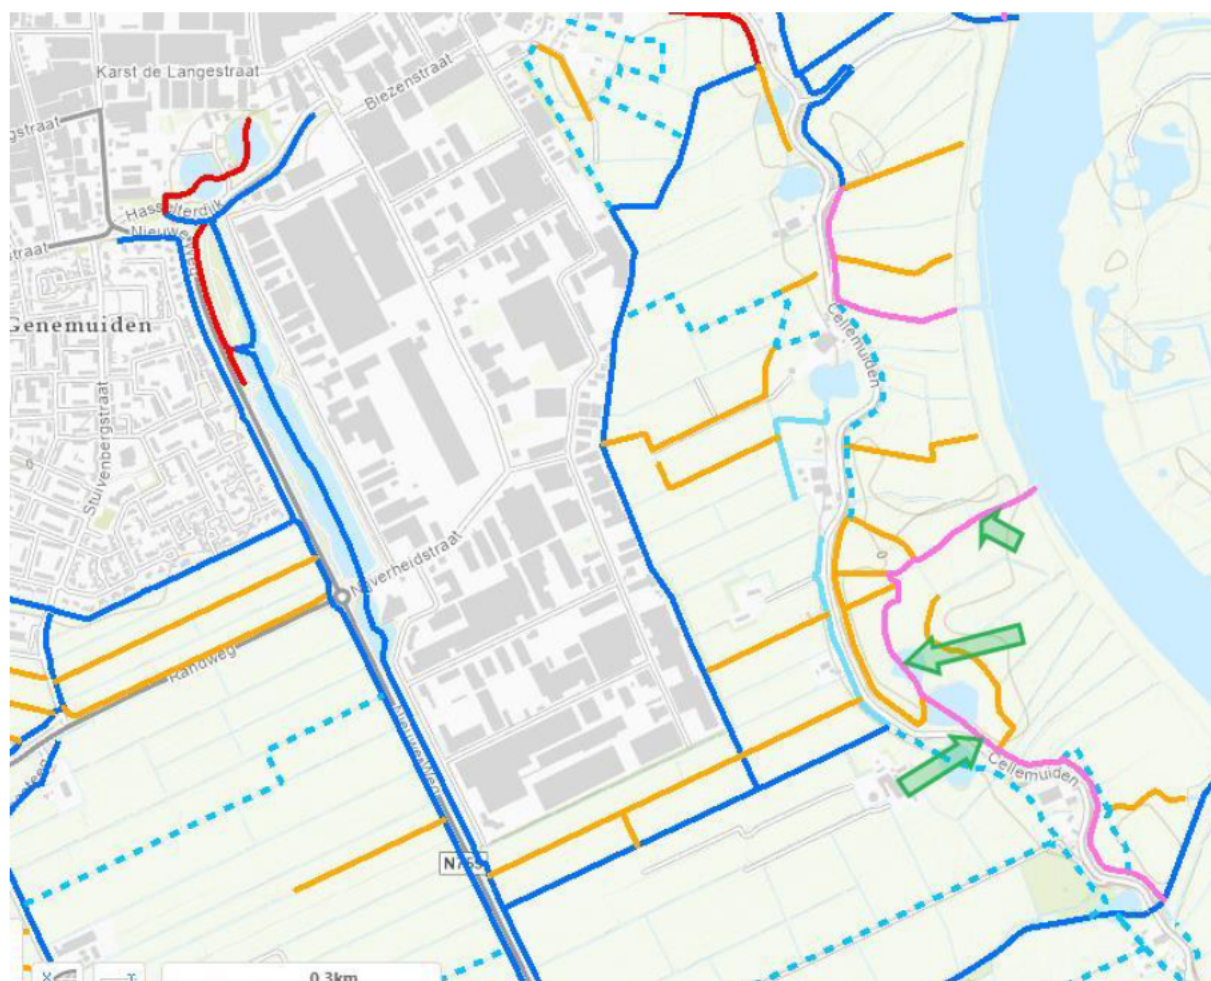

Leggerprofiel:

- Lengte (totaal)	800 meter
- Bodembreedte	0,90 meter
- Bodemhoogte be.str	NAP -1,79 m
- Bodemhoogte bo.str	NAP -1,50 m
- Taluds	Blijft gehandhaafd
- Onderhoudsinrichting	Tweezijdig breedspoor
- Watergangtype	B>A

Aanliggende eigenaren:

De volgende eigenaren/pachters bevinden zich aan de watergang:

- Perceel HST00G 00444: Staatsbosbeheer (pachter: de heer C.R. Pierik);
- Perceel HST00G 00553: WDOD (dijkbeheer);
- Percelen GNM00K 00403 en 00404: Staatsbosbeheer (pachter: de heer D.G. Selles);
- Percelen GNM00K 00405, 00407, 00399 en 00400: Staatsbosbeheer (pachter: de heer C.R. Pierik);
- Perceel HST00G 00443: de heer D.G. Selles;
- Perceel GNM00K 00401: de heer D.G. Selles.

Aanleiding werkzaamheden:

N.a.v. de statuswijziging van de watergang moeten meerdere inrichtingsmaatregelen worden gerealiseerd ten behoeve van de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

De werkzaamheden bij werk 5 en 6 op tekening. M_P02146-SI-W06-C02 bevinden zich binnen de zone waterstaatswerk van de primaire waterkering.

De werkzaamheden moeten buiten het stormseizoen (15 oktober – 15 april uitgevoerd moeten worden en niet bij verwachte hoge waterstanden. Als het werk is gestart moet dit aansluitend afgemaakt moet worden.

Er mag s 'nachts of buiten werktijd geen ontgraving open of onafgewerkt liggen.

Werkzaamheden:

1. Het verwijderen van de duiker (SD-D52) + inlaat. Nieuwe dam + duiker plaatsen met 8 meter boven breedte. Lengte van de duiker is 12 meter (beton). Duiker komt te liggen in een A - Watergang. Duiker ø600mm, beton. Voor bovengenoemde duiker een nieuwe inlaat plaatsen. Zie rode pijl onderin overzichtskaart.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

2. Tussen de twee kolken de watergang opschonen en baggeren, maaisel afvoeren. Bagger ter plekke verspreiden over het land (circa 25 kuub). Zie paarse pijlen

3. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watergang) met een boven breedte van 8 meter tussen perceel GNM00K 00401 en GNM00K00403. - Taluds dam bekleden met stapelzoden.

- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

4. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watergang) met een boven breedte van 8 meter in perceel GNM00K 00407.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

5. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watergang) met een boven breedte van 8 meter tussen perceel GNM00K 00407 en GNM00K00399.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

6. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watgang) met een boven breedte van 8 meter tussen perceel GNM00K 00400 en GNM00K00399.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

7. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watgang) met een boven breedte van 8 meter in perceel GNM00K 00400.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

8. In greppel pvc-buis beton 300 mm plaatsen en aanvullen met grond voor vlakke onderhoudsroute. Minimaal 12 meter. Zie oranje pijl bovenin kaart.

(→ activiteit is omgevingsvergunningplichtig – vergunning aangevraagd)

9. Het aanbrengen van dam inclusief duiker 315mm (C-watgang) met een boven breedte van 8 meter, op de plaats van de blauwe stip in de kaart.

- Taluds dam bekleden met stapelzoden.
- Taluds en grondlichaam dam inzaaien.

Een kaart met de locatie van werknummer 6 is te vinden in bijlage 1.2.

1.5. Beschikbaarheid gronden

De voorgestelde maatregelen worden gedeeltelijk op gronden uitgevoerd die niet in eigendom zijn van WDO Delta. Dit is afgestemd met de betreffende eigenaren.

1.6. Effecten

Naast statuswijzigingen zijn ook een aantal waterhuishoudkundige knelpunten, aangedragen door beheer en onderhoud, opgelost. Hierdoor is de aan- en afvoer situatie van dit deelgebied verbeterd.

1.7. Uitvoering (wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd)

Na vaststelling van dit projectplan staat uitvoering van maatregelen gepland voor het 1^e kwartaal van 2022. De snelheid waarmee het werk kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Voorafgaand zal vanuit het waterschap afstemming zijn met de eigenaren, aanwonenden en andere belanghebbenden. Hiermee kunnen afspraken gemaakt worden over bereikbaarheid en het minimaliseren van overlast tijdens uitvoering. Ook zal er afstemming zijn met betrokken overheden en nutbedrijven. Indien nodig worden meldingen/vergunningen aangevraagd.

WDO Delta stelt alle direct belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte van een calamiteit of een ongewoon voorval en de maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen te beperken. Het waterschap houdt een logboek bij van alle ongewone voorvallen en calamiteiten.

1.8. Voorzieningen gericht op het beperken van nadelige gevolgen

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

Het realiseren van maatregelen voor project waterschapszorg (zoals beschreven in dit projectplan) heeft geen nadelige gevolgen voor belanghebbenden of aanliggend eigenaren.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Om nadelige gevolgen van de uitvoering te voorkomen is overleg gevoerd met aanliggende eigenaren. Eventuele schade aan rij- en werkstroken wordt hersteld. Uitvoeringsschade is nu niet voorzien, maar mocht die toch optreden, dan wordt die vergoed. Ook gewaserving en/of inkomstenschade als gevolg van de uitvoering van dit projectplan wordt vergoed.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Procedureverordening nadeelcompensatie Waterschap Drents Overijsselse Delta.

1.9. Legger, Beheer en Onderhoud

Op 21 september 2021 is de definitieve legger voor deelgebied Kampereilanden door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Hierin staat de nieuwe indeling van watergangen in dit deelgebied die door de vastgestelde hydrologische uitgangspunten tot stand is gekomen. De legger treedt pas in januari 2023 in werking. Tot die tijd blijft de huidige situatie van onderhoudsplicht van kracht en heeft het waterschap de tijd om de situatie aan te passen door het uitvoeren van werkzaamheden.

De gewijzigde situatie wordt opgenomen op de Legger oppervlaktewaterlichamen en in het Beheerregister. Dit zijn de statuswijzigingen van verschillende A- en B-watergangen en nieuwe of verwijderde kunstwerken. De C-watergangen zijn niet meer in de Legger opgenomen. Dit zijn watergangen die onder verantwoordelijkheid vallen van de betreffende grondeigenaren en alleen nodig zijn voor de ontwatering van individueel eigendom. Er ligt ook geen schouwplicht op deze watergangen.

Doordat watergangen van status zijn gewijzigd in dit gebied, heeft WDO Delta een gewijzigd areaal aan watergangen dat onderhouden moet worden.

1.10. Samenwerking

9.1 Afstemming binnen waterschap Drents Overijsselse Delta

Door middel van een automatisch gegenereerd rekenmodel is een kaart gegenereerd waarop de nieuwe indeling van watergangen staat. Deze kaart kent echter nog onzekerheden en heeft daardoor een zekerheid van ca. 70%. In werksessies met 'interne adviseurs' van WDO Delta van verschillende vakgebieden (B&O, hydrologie, ecologie) is deze kaart praktisch en theoretisch beoordeeld en aangepast naar een kaart met een zekerheid van ca. 95%. Met die kaart is vervolgens het omgevingsproces opgestart met de grondeigenaren en andere belanghebbenden.

9.2 Afstemming met eigenaren en belanghebbenden

Met de gecontroleerde en beoordeelde statuswijzigingen van watergangen die op de 95% kaart staat is een inloopbijeenkomst georganiseerd en zijn persoonlijk gesprekken ingepland met de belanghebbenden in dit deelgebied. Dit betreffen niet alleen individuele perceeleigenaren, maar ook gemeenten, provincie en terrein behorende organisaties.

Als uit deze gesprekken bleek dat een watergang een andere status zou moeten krijgen dan voorgesteld, is dit wederom besproken met interne adviseurs van WDO Delta.

In de persoonlijke gesprekken met belanghebbenden is ook de besproken welke wijzigingen in de onderhoudsinrichting gerealiseerd moet worden, om de onderhoudsplicht te kunnen overdragen. Deze

werkzaamheden zijn aangedragen door de belanghebbenden en vervolgens besproken met de interne adviseurs van WDO Delta.

DEEL II – VERANTWOORDING

1. Wet- en regelgeving

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd en een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. Daaronder valt:

- a) Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- b) Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen.
- c) Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan richten zich met name op punt a).

Het waterschap is als beheerder verplicht vanuit artikel 5.1 van de Waterwet om voor de in beheer zijnde waterstaatswerken een legger vast te stellen en bij te houden. In deze legger staan de waterlopen (sloten, kanalen en rivieren) en de kunstwerken (zoals stuwen en gemalen) die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in. In de legger staat waaraan ze moeten voldoen, wie onderhoudsplichtig is en wat de beschermingszones zijn. Het waterschap mag op basis van eigen beleid criteria vaststellen op basis waarvan watergangen een bepaalde status krijgen en als zodanig op de legger worden opgenomen.

WDODelta heeft in 2017 nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan de watergangen opnieuw worden ingedeeld. Deze criteria zijn zo vastgesteld dat WDODelta de functies in een gebied zoals landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk kan bedienen met het aan- en afvoeren van water. Op basis van deze criteria worden watergangen opnieuw ingedeeld in A-, B- en C-watergangen. De A-watergangen worden onderhouden door WDODelta, de B- en C- watergangen door de (aanliggende) perceeleigenaren. Met de nieuwe A-watergangen beheert en onderhoudt WDODelta een systeem van watergangen waarmee wateroverlast en –schaarste kan worden voorkomen of beperkt.

2. Beleid

De maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan komen voort uit de invoering van het beleid Waterschapszorg dat in 2017 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water: wie beheert en onderhoudt welke watergang? WDODelta wil water zo goed mogelijk aan- en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies in een gebied (zoals landbouw en natuur) zo optimaal mogelijk. Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote, regionaal belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleinere watergangen en de individuele perceelsloten worden onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren.

Het klimaat verandert echter. Perioden van droogte worden afgewisseld door intense regenbuien waarbij veel water in korte tijd valt. In de toekomst lijken de verschillen tussen nat en droog ook nog eens steeds extremer te worden. Goed onderhouden watergangen die dit extra water kunnen afvoeren in de natte tijden en water kunnen aanvoeren in droge perioden zijn daarbij cruciaal.

Om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de toekomst, heeft het waterschap daarom nieuwe criteria vastgesteld op basis waarvan watergangen worden ingedeeld. Het waterschap is verplicht om hydrologische uitgangspunten te gebruiken als basis voor deze criteria. Dus: de hoeveelheid water die door een watergang stroomt is bepalend voor de status van de watergang. Deze nieuwe indeling wordt in vier jaar tijd ingevoerd in het gehele beheergebied van WDODelta. Het gevolg van deze nieuwe indeling is dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal watergangen wil het waterschap zelf in onderhoud nemen, het onderhoud van andere watergangen wil het waterschap juist overdragen. De maatregelen zoals beschreven in dit projectplan zijn nodig, zodat de nieuwe onderhoudsplichtigen het onderhoud aan de watergangen kunnen uitvoeren. Daarnaast stop het waterschap met de jaarlijkse controle op onderhoud bij een deel van de zogenaamde schouwwatergangen. Zie voor meer informatie: www.wdodelta.nl/waterschapszorg.

Na de realisatie van de plannen zal het gebied conform het beleid 'Inrichting, Beheer en Onderhoud Op Maat' (IBOOM) worden uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan dat het beheer en onderhoud wordt afgestemd op de functies in een gebied, zoals landbouw en natuur. Bij dit maatwerk wil het waterschap ook rekening houden met de gebiedskenmerken, wensen en ideeën van de inwoners.

3. Projectkeuzes

De te realiseren maatregelen hebben als doel dat de watergangen effectief en efficiënt beheerd en onderhouden kunnen worden. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige in de nieuwe situatie de watergang goed moet kunnen onderhouden (maaïen / schoon maken) en dat het waterpeil in de watergang goed beheerd moet kunnen worden. Alle keuzes die gemaakt zijn die geleid hebben tot de maatregelen zoals beschreven in dit Projectplan, zijn voortgekomen vanuit deze voorwaarde. Na realisatie van de inrichtingsmaatregelen worden de aanpassingen aan waterstaatswerken vastgelegd in de Legger van het waterschap.

4. Vergunningen, ontheffingen en meldingen

4.1 Vergunningenscan

Er is een vergunningenscan uitgevoerd om te bepalen welke vergunningen aangevraagd en welke meldingen gedaan moeten worden voor de realisatie van de werkzaamheden. Voor de werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, is dit bij de betreffende gemeente aangevraagd. De vergunningenscan is uitgevoerd voor alle werkzaamheden die uitgevoerd worden, dus ook de werkzaamheden die niet in dit projectplan zijn opgenomen. Deze vergunningen scan is in bijlage 2 van dit projectplan opgenomen.

4.2 Natuurtoets

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een Flora en Fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis hiervan stelt de aannemer een ecologische werkprotocol op en stemt deze af met het Waterschap. Mocht uit deze inventarisatie blijken dat er bijzonderheden worden geconstateerd, zal worden gewerkt conform wet- en regelgeving.

4.3 Algemene zorgplicht voor natuur

De Wet natuurbescherming eist dat schade aan de natuur zoveel mogelijk wordt beperkt. Hieraan wordt voldaan doordat het waterschap werkt volgens de vigerende natuurbeschermingswetgeving, de Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen en een maximale inspanning levert om de bestaande natuur te beschermen. De werkzaamheden hebben een lokaal en een kort durend karakter. Tijdens uitvoering van werkzaamheden heeft ook de aannemer een zorgplicht ten aanzien van Flora en Fauna.

DEEL III – RECHTSBESCHERMING

1. Bezwaar

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode schriftelijk bezwaar tegen het projectplan indienen. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het dagelijks bestuur van waterschap zijn ingediend.

Er kan desgewenst gebruik worden gemaakt van het e-formulier op de website: [Bekendmakingen | Waterschap Drents Overijsselse Delta \(wdodelta.nl\)](https://www.wdodelta.nl/Bekendmakingen/Waterschap-Drents-Overijsselse-Delta)

2. Beroep

Binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar staat voor belanghebbenden beroep open bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen) onder overlegging van een afschrift van de beslissing op bezwaar. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen bezwaar te hebben ingediend.

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

3. Crisis- en herstelwet

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

4. Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overlegd. Ook voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Zie voor het digitaal indienen van zo'n verzoek onder "Beroep".

DEEL IV – BIJLAGEN

1. Kaarten en tekening

1.1 Overzichtskaart maatregelen projectplan Kampereilanden

1.2 Kaarten met locaties van maatregelen uit rapportage waterschapszorg

2. Vergunningenscan deelgebied Kampereilanden

Bijlage 1.1

Overzichtskaart maatregelen projectplan Kampereilanden

Bijlage 1.2

Kaarten met locaties maatregelen uit rapportage waterschapszorg

Bijlage 2

Vergunningenscan alle werkzaamheden
