

Projectplan Hoekwant-, Zijdenetten- en Zeebiestocht Noord en Zuid “Aanleg duurzame oevers”



Waterschap Zuiderzeeland

20 januari 2021

PROJECTPLAN WATERWET

Datum	9 februari 2021
Onderwerp	Projectplan voor de aanleg van m duurzame oever in de Hoekwant-, Zijdenetten- en Zeebiestocht Noord en Zuid van de Flevopolder.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland besluit, gelet op artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet, het onderhavige projectplan voor de aanleg van duurzame oevers langs de Hoekwant-, Zijdenetten- en Zeebiestocht Noord en Zuid Flevopolder vast te stellen en over te gaan tot publicatie.

Lelystad, 9 februari 2021,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur



ing. W. Slob MSc.

de voorzitter,



ir. H.C. Klavers.

Inhoudsopgave

Deel I	Aanleg duurzame oever	1
1	Projectplan	1
1.0	Projectplan	1
1.1	Samenvatting	1
1.2	Projectbeschrijving	1
1.3	Bestaande en nieuwe eigendomssituatie	1
1.4	Bereikbaarheid en uitvoeringsperiode	2
1.5	Legger	2
1.6	Beschrijving van de werkzaamheden	4
1.7	Wijze van uitvoering	4
1.8	Toekomstig onderhoud	4
1.9	Informeren betrokkenen	4
1.10	Schadevergoeding en gedoogplicht	5
2	Verantwoording	5
2.0	Toetsing Waterwet	5
2.1	Wetten, regels en beleid	6
2.2	Noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten	6
3	Rechtsbescherming	7
3.0	Korte procedure	7
4	Bijlagen	8
1.	Bijlage: Archeologisch onderzoek	9
2.	Bijlage: Bodemkwaliteit	10
3.	Bijlage: Overzichtskaart werkzaamheden/ eigendommen	12
4.	Bijlage: Profieltekeningen	13
Deel II	Contactpersoon uitvoering werken	14

Deel I Aanleg duurzame oever

1 Projectplan

1.0 Projectplan

De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder vindt plaats overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan (artikel 5.4 van de Waterwet). Het plan bevat ten minste:

- een beschrijving van het betrokken werk (zie onder 1.2);
- een beschrijving van de wijze waarop het wordt uitgevoerd (zie onder 1.6 en 1.7);
- een beschrijving van de te treffen voorzieningen die gericht zijn op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk (zie onder 1.9 en 1.10).

1.1 Samenvatting

Op basis van het Oeverbeleid 2004 worden oevers van tochten gelegen in agrarisch gebied: "duurzaam", en grenzend aan bos- en natuurterreinen: "natuurvriendelijk" ingericht op het moment dat de oevers toe zijn aan groot onderhoud.

Op 2 februari 2017 heeft de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland ingestemd met het voorstel "*versnelde aanleg duurzame oevers 2017-2021*". In deze periode wordt ca. 100 kilometer natuurvriendelijke- en duurzame oevers aangelegd. De Hoekwant-, Zijdenetten- en Zeebiestocht Noord en Zuid zijn tochten die in het kader van de versnelde aanleg "duurzaam" worden ingericht.

1.2 Projectbeschrijving

Het project omvat het aanleggen van 4.825- m duurzame oever waarvan 980m Hoekwanttocht (westzijde), 2.565m Zeebiestocht Zuid(noordzijde), 780 m Zijdenettentocht (oostzijde), 500 m Zeebiestocht Noord (zuidzijde) ter hoogte van de kavels administratief bekend U14 t/m 22, U25, T30 en T31 (figuur 1).



Figuur 1 Oriëntatie locatie met perceelnummers (rode lijn)

1.3 Bestaande en nieuwe eigendomssituatie


In de huidige situatie is het waterschap eigenaar van de ondergrond van de hoofdwatergang (tocht) en oeverconstructie. De benodigde ruimte voor de aanleg van het bermtalud voor

de duurzame oever kan niet geheel op eigen ondergrond worden gerealiseerd. De aanleg van de duurzame oever zal waar noodzakelijk op eigendom van de aangrenzende aangelande worden gerealiseerd en waar nodig wordt deze grond in eigendom verworven. De eventuele verwerving van gronden is er opgericht om onderhoud van de aangelegde oever in de toekomst te kunnen uitvoeren. In bijlage 3 is een overzichtstekening van de te verwerven stroken grond opgenomen.

1.4 Bereikbaarheid en uitvoeringsperiode

In afwijking van het Oeverbeleid heeft de Algemene Vergadering in 2009 besloten dat aanleg en het onderhouden van watergangen gedurende het hele jaar kunnen plaatsvinden, rekening houdend met bestaande wet- en regelgeving.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en bereikbaarheid van het werk zijn werkstroken langs de tocht en aan- en afvoerroutes benodigd (figuur 2). De werkstrook en aan en afvoerroutes zijn gedurende het gehele jaar beschikbaar voor de voorbereiding, de uitvoering van het werk en eventuele herstel werkzaamheden. De oever is direct bereikbaar vanaf de openbare weg en zal, zoals in onderstaande figuur is weergegeven, worden bereikt. Over het gebruik van percelen en het inrichten van werkstroken wordt met eigenaren/gebruikers afspraken gemaakt. (zie ook paragraaf 1.8)

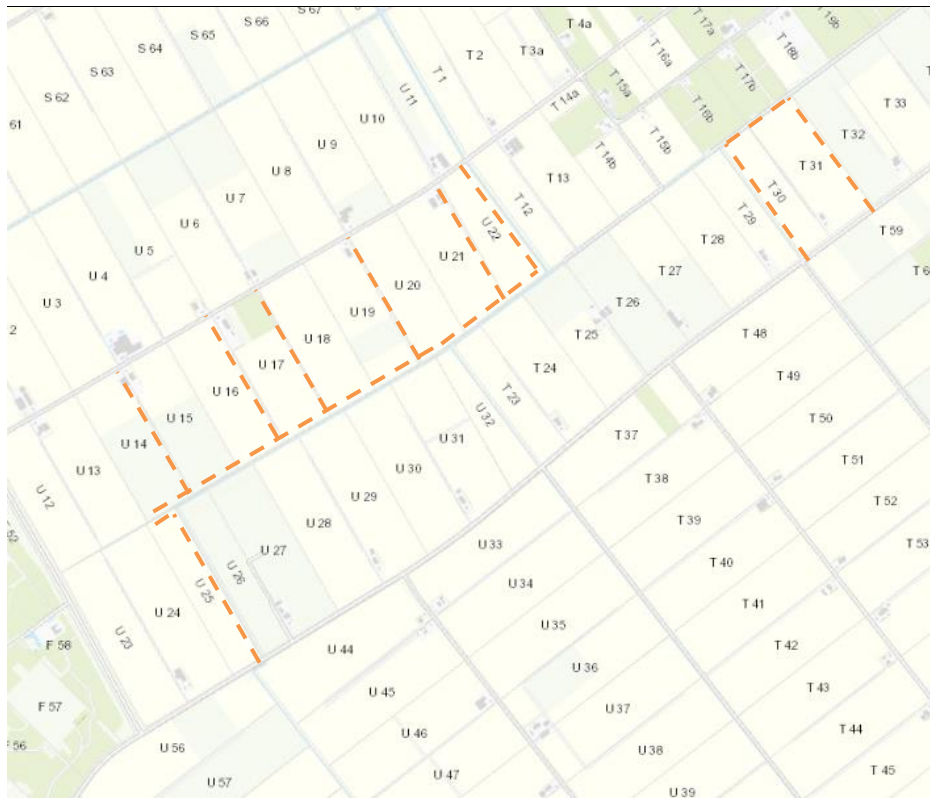

Figuur 2 (optionele) transportroutes over percelen

1.5 Legger

In de bestaande legger hebben de tochten een wisselende afmeting (leggerprofiel). In 2019 zijn ten behoeve van de aanleg van duurzame oevers aan de andere zijden van de tochten de legger afmetingen beoordeeld en waar nodig aangepast vastgesteld. De aanpassing van de legger betreft aanpassingen ten aanzien van de inrichting. De onderhavige oevers worden in de legger aangemerkt als duurzaam ingericht. In bijgevoegde figuur 3 tabel is aangegeven welke leggerprofielen de tochten hebben. In tabel 3 zijn de standaard afmetingen voor de verschillende leggerprofielen weergegeven.



Figuur 3 Leggerprofielen zoals vastgelegd in de legger


AFMETINGEN VAARTEN EN TOCHTEN												
OMSCHRIJVING	b	d	f	g	h	k	a	c	e	duurzaam		
										e	j	l
L4(dz)	2.0	1.0	1:2	1:2	1:2			6.0	0.50	150	1:4	1.00
L5(dz)	3.0	1.0	1:2	1:2	1:2				0.50	150	1:4	1.00
L6(dz)	2.4	1.0	1:4	1:2½	1:2		6.4	8.9	0.50	150	1:4	1.00
L6a(dz)	2.6	1.2	1:2	1:2	1:2				0.75	150	1:4	1.00
L6b(dz)	2.4	1.0	1:4	1:2½	1:2		6.4	8.9	3.50			
L7(dz)	3.4	1.0	1:4	1:2½	1:2		7.4	9.9	0.50	150	1:4	1.00
L7a(dz)	3.4	1.2	1:2	1:2	1:2				0.75	150	1:4	1.00
L8(dz)	2.3	1.2	1:4	1:2½	1:2		7.1	10.1	0.75	150	1:4	1.00
L8a(dz)	2.3	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00
L9(dz)	3.1	1.2	1:4	1:2½	1:2		7.9	10.9	0.75	150	1:4	1.00
L9a(dz)	3.0	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00
L10(dz)	4.0	1.2	1:4	1:2½	1:2		8.8	11.8	0.75	150	1:4	1.00
L10a(dz)	3.7	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00
L11(dz)	4.8	1.2	1:4	1:2½	1:2		9.6	12.6	1.00	150	1:4	1.00
L11a(dz)	4.4	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00
L12(dz)	2.7	1.5	1:4	1:2½	1:2		8.7	12.45	1.00	150	1:4	1.00
12a(dz)	5.0	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00
L13(dz)	5.7	1.5	1:2	1:2	1:2				1.00	150	1:4	1.00

Tabel 1. Standaard leggerprofielen waterschap Zuiderzeeland

1.6 Beschrijving van de werkzaamheden

Realisatie duurzame oever

Het werk omvat het inrichten van het werkterrein (ca. 4.825m oeverlengte) (zie bijlage 3 overzichtstekening) inclusief het maaien en verwijderen van begroeiing op het talud en op de oeverlijn. De zode van het talud wordt vervolgens ontgraven en tijdelijk op de werkstrook (ca. 15 meter breed) gezet. De nieuwe insteek wordt uitgezet, de oude beschoeiing verwijderd en afgevoerd. Een nieuwe (lichte) beschoeiing (Europees (FSC of soortgelijk) gewaarmerkt hout) wordt vervolgens onder water geplaatst en vormt de scheiding van plasberm en het onderwater talud. De plasberm (ca. 1:5) en het talud (ca. 1:2) worden door ontgraving op het ontworpen profiel gebracht. Het geheel aan ontgraven grond wordt in z'n geheel afgevoerd. Het talud wordt na het profileren ingezaaid met graszaad en het werkterrein wordt opgeruimd. In onderstaande figuur 3 is een voorbeeldprofiel opgenomen. De overige profieltekeningen zijn opgenomen in bijlage 4.

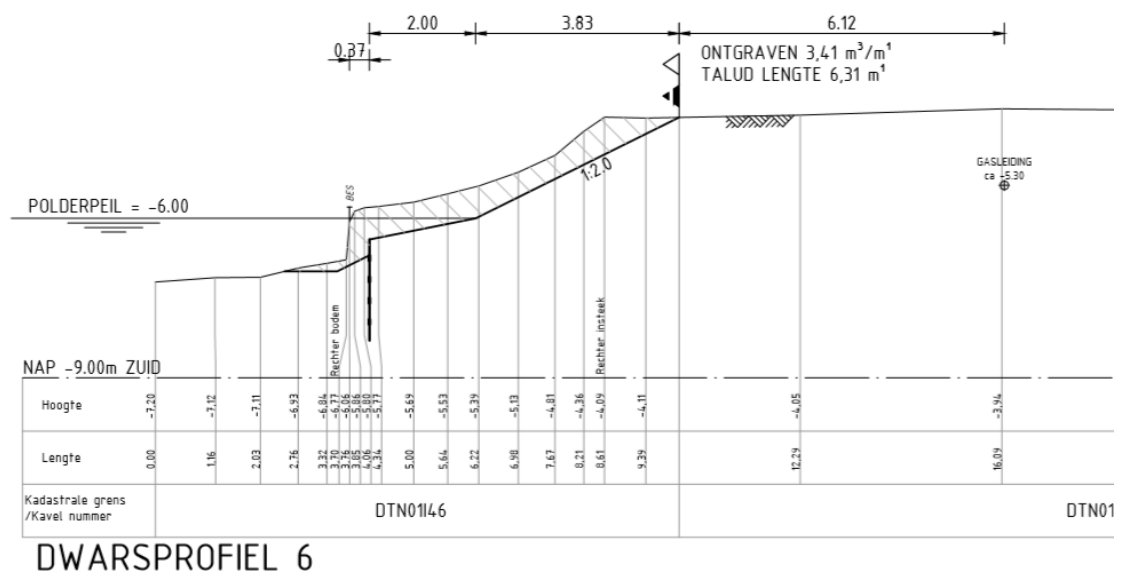

Figuur 3 voorbeeld inrichting L5dz leggerprofiel Zijdenettentocht (oostzijde)

1.7 Wijze van uitvoering

De werkzaamheden bestaan uit de volgende activiteiten:

- uitzetten werkstrook en nieuwe insteek;
- maaien en ontgraven zode in het talud
- verwijderen en afvoeren Oude beschoeiing;
- aanvoeren en plaatsen lichte beschoeiing;
- profileren plasberm en talud;
- afvoeren vrijgekomen grond;
- inzaaien talud;
- opruimen werkterrein.

1.8 Toekomstig onderhoud

Toekomstig oeveronderhoud wordt uitgevoerd conform vastgesteld beleid. Dit houdt in:

- periodiek, eens per twee jaar, maaien van de begroeiing op talud en plasberm;
- periodiek eens per vijf tot tien jaar uitvoeren van klein onderhoud, zoals het uitkrabben van de plasberm;
- noodzaak tot het uitvoeren van baggerwerkzaamheden wordt eens per zeven jaar bepaald.

1.9 Informeren betrokkenen

Het werk wordt, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland, uitgevoerd door een aannemer. Ongeveer een jaar van tevoren stuurt Waterschap Zuiderzeeland een schriftelijk bericht aan de eigenaren en/of gebruikers die grenzen aan de oever, welke duurzaam of natuurvriendelijk wordt ingericht.

Vervolgens wordt met elke betrokkene afzonderlijk overlegd over:

- uit te voeren werkzaamheden;
- bij aanleg duurzame oevers eventueel de aankoop van de benodigde strook grond;
- de ontvangst van vrijkomende grond en baggerspecie;
- de schadeloosstelling in het kader van de werkzaamheden;
- de technische aspecten worden vastgelegd in een "overeenkomst uitvoering" en de financiële aspecten in een koopovereenkomst, dan wel een "overeenkomst gedeeltelijke ontbinding pacht". In geval van verpachte gronden wordt zowel met de pachter als met de bloot eigenaar een overeenkomst afgesloten;
- beoogde uitvoering is gepland voor 2021. Indien sprake is van wijziging van de planning wordt dit afgestemd met belanghebbenden.

1.10 Schadevergoeding en gedoogplicht

Schadevergoeding

Ten aanzien van de voorziene werkzaamheden is artikel 7.14 van de Waterwet van toepassing. Op basis hiervan tracht Waterschap Zuiderzeeland minnelijke overeenstemming te krijgen met de grondeigenaren / gebruikers over de uitvoering van de werkzaamheden.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden voor de realisering van duurzame oevers, vindt bij grondverwerving volledige schadevergoeding plaats en kent Waterschap Zuiderzeeland de volgende vergoedingen toe, indien van toepassing:

- vermogensschadevergoeding bij grondverwerving (grondaankoop);
- inkomensschadevergoeding;
- gemis betalingsrechten;
- inkomensderving werkstrook per gewas;
- zakelijke vergoedingen;
- een uitschuifvergoeding;
- maaivergoeding;
- werkstrook herstelvergoeding;
- behandelvergoeding/deskundigenvergoeding;
- vergoeding voor accountantsverklaring (indien van toepassing);
- vergoeding onderhoud werkstrook;
- gemis mestplaatsingsruimte.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt jaarlijks bovenstaande vergoedingen (normbedragen) vast.

Gedoogplicht

In artikel 5.24 van de Waterwet is opgenomen dat het waterschap rechthebbenden van onroerende zaken kan verplichten om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen.

Indien een aangeland of grondgebruiker geen toestemming verleent voor de aanleg, zal gedoogplicht worden opgelegd. De aangeland of grondgebruiker moet dan gedogen dat de oever op zijn grond wordt aangelegd en/of gebruik moet worden gemaakt van (een) werkstro(o)k(en) op de kavel(s). In die gevallen wordt de oever toch duurzaam ingericht. Het gedoogbesluit wordt ingeschreven in de openbare kadastrale registers.

2 Verantwoording

2.0 Toetsing Waterwet

De Waterwet is gericht op (artikel 2.1 van de Waterwet):

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Ad a. Voorkoming en waar nodig beperking overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

De huidige inrichting voldoet op een aantal trajecten niet aan de profielbreedte eis voor de bestaande leggerprofiel. Daarnaast is berekend dat voor een aantal trajecten het benodigde

profiel niet overeenkomt met de vastgestelde (bestaande) leggerprofielen. Op basis van deze constatering wordt voorgesteld om de legger op een aantal locaties aan te passen en de inrichting te wijzigen. Te samen met het duurzaam inrichten van de tochten, dragen de aanpassingen op een positieve wijze bij aan de waterhuishouding.

Ad b. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen:

Op basis van de verplichtingen uit de KRW¹ heeft het waterschap in samenwerking met de Provincie Flevoland waterkwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende deelgebieden geformuleerd en geldt er een resultaatsverplichting om die doelstellingen te behalen. In Flevoland kan de ecologische kwaliteit van het water met name verbeteren door aanpassingen in de inrichting van watergangen. Door harde overgangen (zoals beschoeiingen) te vervangen door zachte overgangen (inrichten met natuurvriendelijke oevers), ontstaat meer structuurdiversiteit.

Ad c. Vervulling van de maatschappelijke functies van het watersysteem
Door de realisering van de duurzame of natuurvriendelijke oever met bijkomende werkzaamheden voldoet de watergang aan de leggerafmetingen en kan het gebruik van de gronden eraan grenzend volgens de bestemming plaatsvinden.

Conclusie toetsing doelstellingen Waterwet:

De uitvoering van dit plan is in overeenstemming met de doelstelling van de Waterwet. Tevens wordt met de aanleg van de duurzame en/of natuurvriendelijke oever voldaan aan de opgestelde doelstellingen uit de KRW¹ en het BAW².

2.1 Wetten, regels en beleid

Op het werk zijn onder andere navolgende wetten en regelgeving van toepassing:

- Wet Natuurbescherming;
- Oeverbeleid: realisering van de duurzame en natuurvriendelijke oevers conform oeverbeleid uit 2004;
- KRW (Kaderrichtlijn Water);
- BAW (Bestuursakkoord Water);
- Erfgoedwet archeologie;
- Wetbodembescherming;
- Programma Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van Wet natuurbescherming (Natura 2000 gebieden);
- Aanbestedingsregels conform vastgesteld Aanbestedingsbeleid Waterschap Zuiderzeeland 2007;

2.2 Noodzakelijke vergunningen en relevante besluiten

Voor de aanleg van duurzame- of natuurvriendelijke oevers worden via het omgevingsloket onder meer de navolgende meldingen/ vergunningsaanvragen en onderzoeken in gang gezet:

1. Melding of vergunningaanvraag in het kader van de Ontgrondingenwet;
2. Archeologisch onderzoek en daaruit voortvloeiende uitvoeringsrichtlijnen;
3. Bodemonderzoek in verband met milieuvoorschriften;

Ad. 1 Ontgrondingenwet

Afstemming met provincie Flevoland leert dat een melding voor de ontgroning volstaat voor de omschreven werkzaamheden. De melding wordt in gang gezet zodra de projectplanprocedure is doorlopen.

Ad 2. Archeologisch onderzoek

In opdracht van het waterschap is onderzoek verricht naar de archeologische waarden in het plangebied. Het onderzoek wijst uit dat de geplande werkzaamheden zonder archeologisch onderzoek kunnen worden uitgevoerd. In bijlage 1 is overzichtskaart archeologische waarden.

¹ KRW: Kaderrichtlijn water

² BAW: Bestuursakkoord Water

Ad 3. Bodemonderzoek

Grondonderzoeken ten behoeve van de vaststelling van de bodemkwaliteit zijn ingang gezet. De eerste resultaten duiden op grondkwaliteit landbouw/natuur. Ook op basis van de bodemkwaliteitskaart (*Lieverse CSO, 13 december 2019*) Provincie Flevoland zijn de gronden aangemerkt met bodemkwaliteit Landbouw/natuur. (zie bijlage 2) Op basis daarvan kan de grond in het werk worden toegepast en/of kan worden afgevoerd conform de werkwijze van het projectplan.

3 Rechtsbescherming

3.0 Korte procedure


Als een projectplan is vastgesteld wordt dit bekend gemaakt. Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken bezwaar maken tegen het projectplan. Het bezwaarschrift kan om advies worden voorgelegd aan een bezwarencommissie. Deze commissie adviseert het college van Dijkgraaf en Heemraden over het bezwaar. Het college neemt een besluit op het bezwaar en stelt het projectplan vast. Dit besluit wordt bekend gemaakt. Tegen dit besluit staat beroep open bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. In beginsel kunnen alleen degenen die een bezwaar hebben ingediend tegen het vastgestelde projectplan, beroep instellen.

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift staat de uitvoering van het projectplan niet in de weg. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht, dan dient een voorlopige voorziening te worden gevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of bij de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

4 Bijlagen

- 1) Archeologisch onderzoek
- 2) Bodemkwaliteit
- 3) Overzichtskaart werkzaamheden/ eigendommen
- 4) Profieltekeningen

1. Bijlage: Archeologisch onderzoek

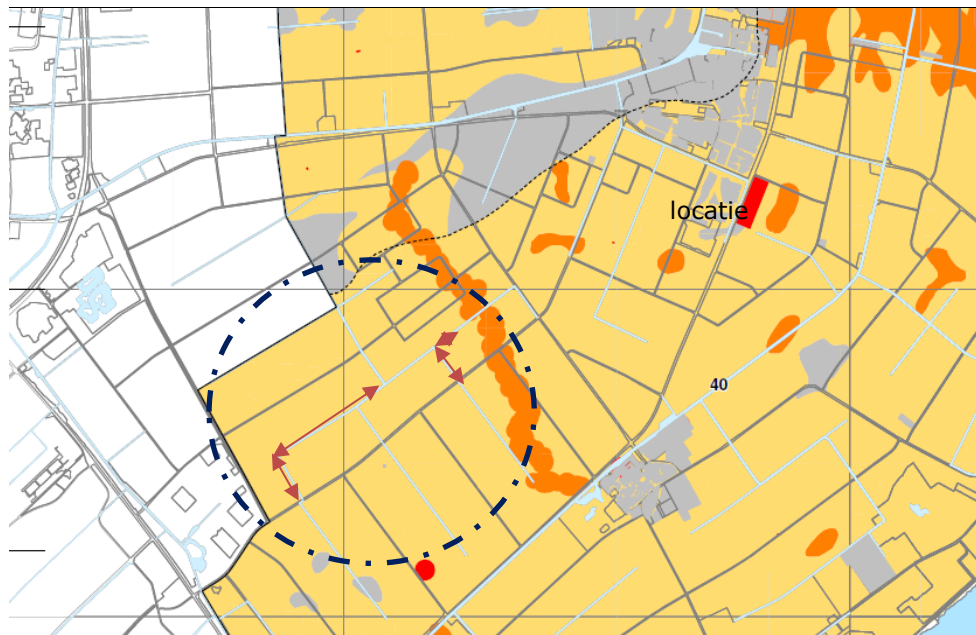


Figuur 4 archeologisch waardevolle gebieden met duiding werkgebied




Figuur 5 legenda


2. Bijlage: Bodemkwaliteit

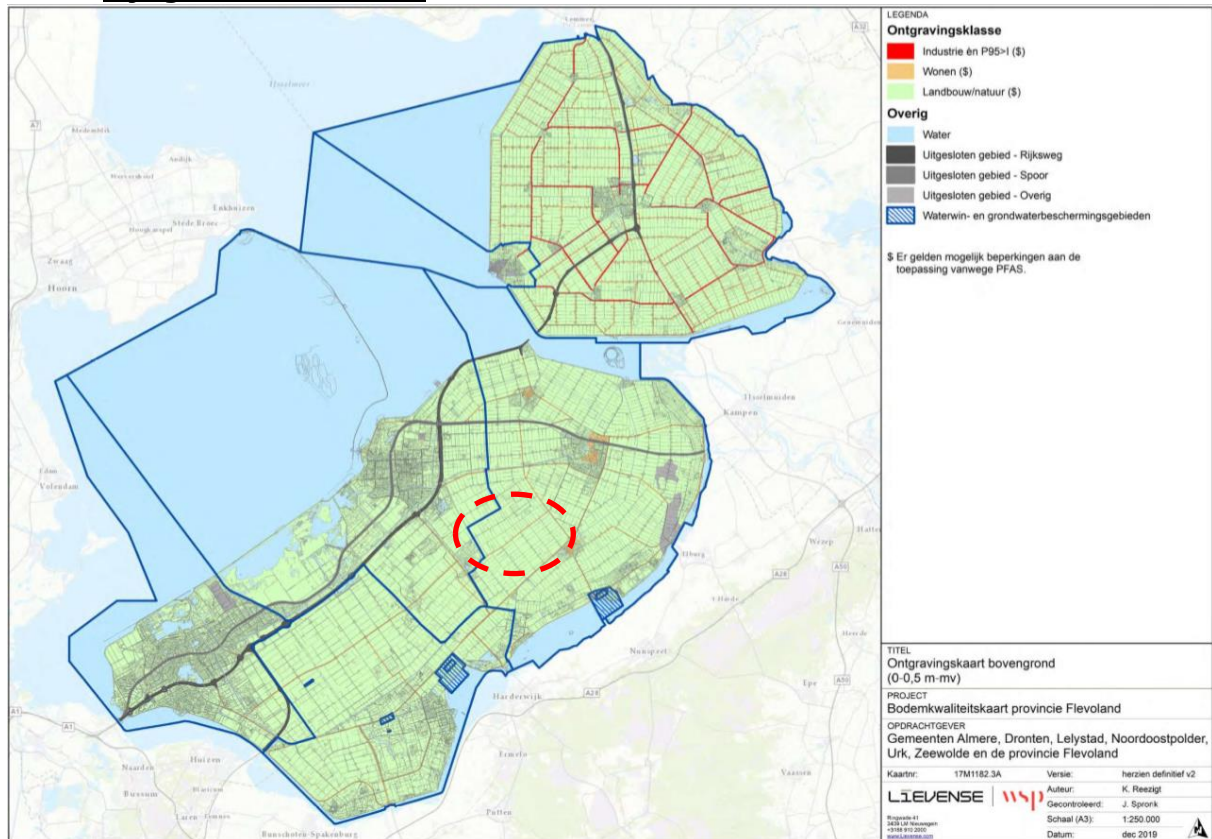

Figuur 6 bodemkwaliteitskaart 0 - 0,5m -mv.

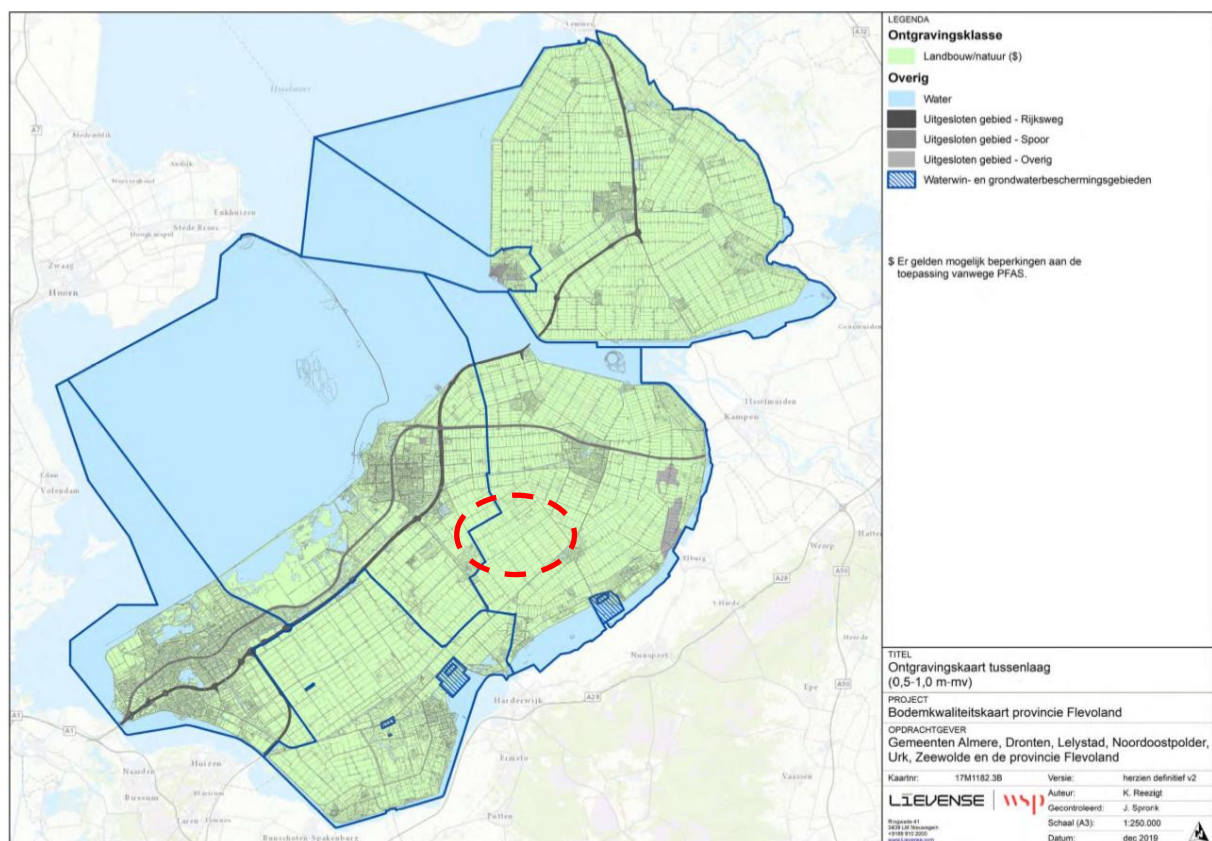

Figuur 7 bodemkwaliteitskaart 0,5-1,0m -mv.

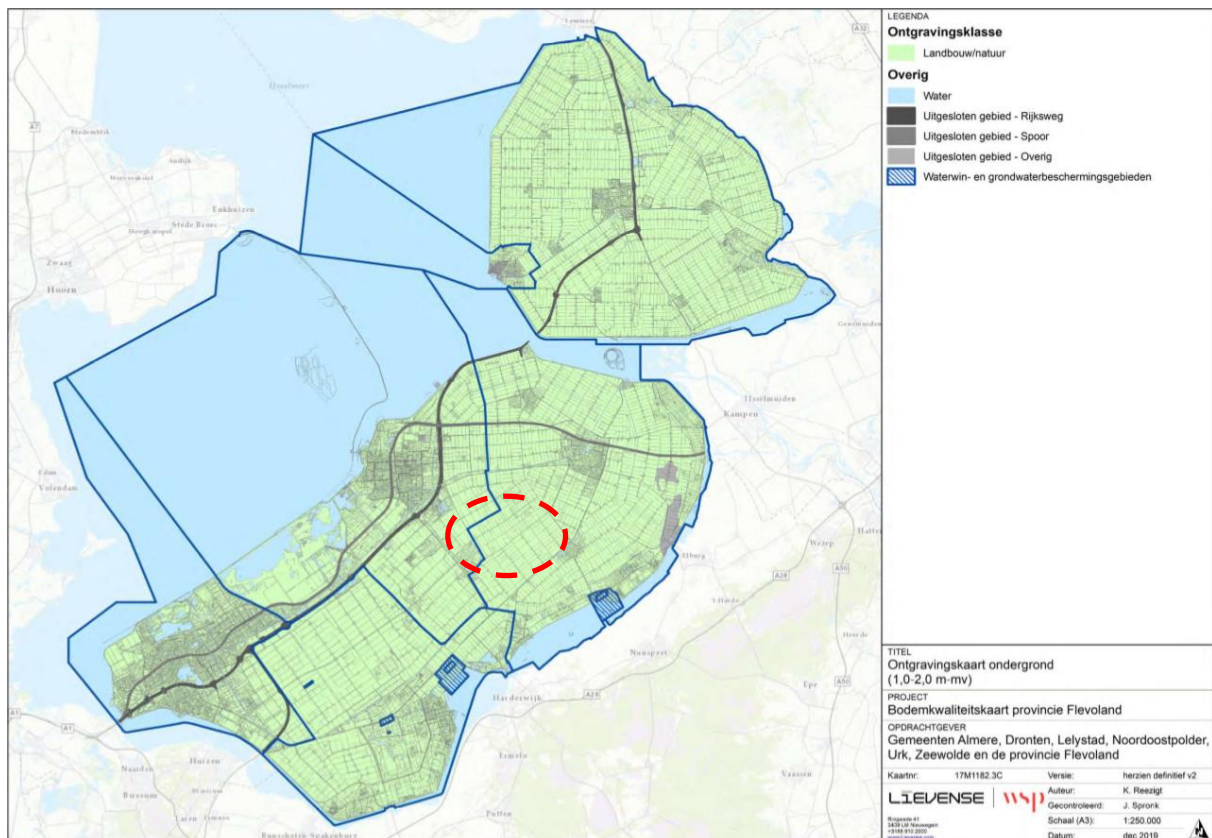

Figuur 8 bodemkwaliteitskaart 1,0-2,0m -mv.

Bodemkwaliteitskaart provincie Flevoland

Rapportage partijkeuring Zeebiestocht Noord te Biddinghuizen

***In opdracht van:
Buro Noord B.V.***

Auteur: ing. H. Pieters Datum: 18 januari 2021 Projectnummer: 904276
--

5 Conclusie en aanbeveling

5.1 Conclusie

Op basis van de analyseresultaten en toetsingen van de partijkeuring Zeebiestocht Noord kan worden geconcludeerd dat:

- op basis van het Besluit bodemkwaliteit de partij Altijd toepasbaar is;
- op basis van het Tijdelijk handelingskader PFAS de partij voldoet aan, de toepassingssituatie(s) voor landbodembodem, “Landbouw/natuur, wonen of industrie”.

5.2 Aanbeveling

Toepassing van grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dient formeel vijf dagen voorafgaand aan het toepassen gemeld te worden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

Het onderhavige rapport, dat geldt als erkende kwaliteitsverklaring, dient bij de meldingen te worden overlegd.

Rapportage partijkeuring Hoekwanttocht, partij 1 en 2 te Biddinghuizen

***In opdracht van:
Buro Noord B.V.***

Auteur: ing. H. Pieters Datum: 19 januari 2021 Projectnummer: 904276
--

5 Conclusie en aanbeveling

5.1 Conclusie

Op basis van de analyseresultaten en toetsingen van de partijkeuring Hoekwanttocht Noord kan worden geconcludeerd dat:

- op basis van het Besluit bodemkwaliteit de partij altijd toepasbaar is;
- op basis van het Tijdelijk handelingskader PFAS de partij voldoet, voor de toepassing op landbodem, aan de toepassingssituatie(s): “Landbouw/natuur, wonen of industrie”.

5.2 Aanbeveling

Toepassing van grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dient formeel vijf dagen voorafgaand aan het toepassen gemeld te worden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

Het onderhavige rapport, dat geldt als erkende kwaliteitsverklaring, dient bij de meldingen te worden overlegd.

Rapportage partijkeuring Zijdenettentocht Noord te Biddinghuizen

***In opdracht van:
Buro Noord B.V.***

Auteur: ing. H. Pieters Datum: 15 januari 2021 Projectnummer: 904276
--

5 Conclusie en aanbeveling

5.1 Conclusie

Op basis van de analyseresultaten en toetsingen van de partijkeuring Zijdenettentocht Noord kan worden geconcludeerd dat:


- op basis van het Besluit bodemkwaliteit de partij Altijd toepasbaar is;
- op basis van het Tijdelijk handelingskader PFAS de partij voldoet aan alle de toepassingssituatie(s) voor landbodem.

5.2 Aanbeveling

Toepassing van grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dient formeel vijf dagen voorafgaand aan het toepassen gemeld te worden bij www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

Het onderhavige rapport, dat geldt als erkende kwaliteitsverklaring, dient bij de meldingen te worden overlegd.

3. Bijlage: Overzichtskaart werkzaamheden/ eigendommen

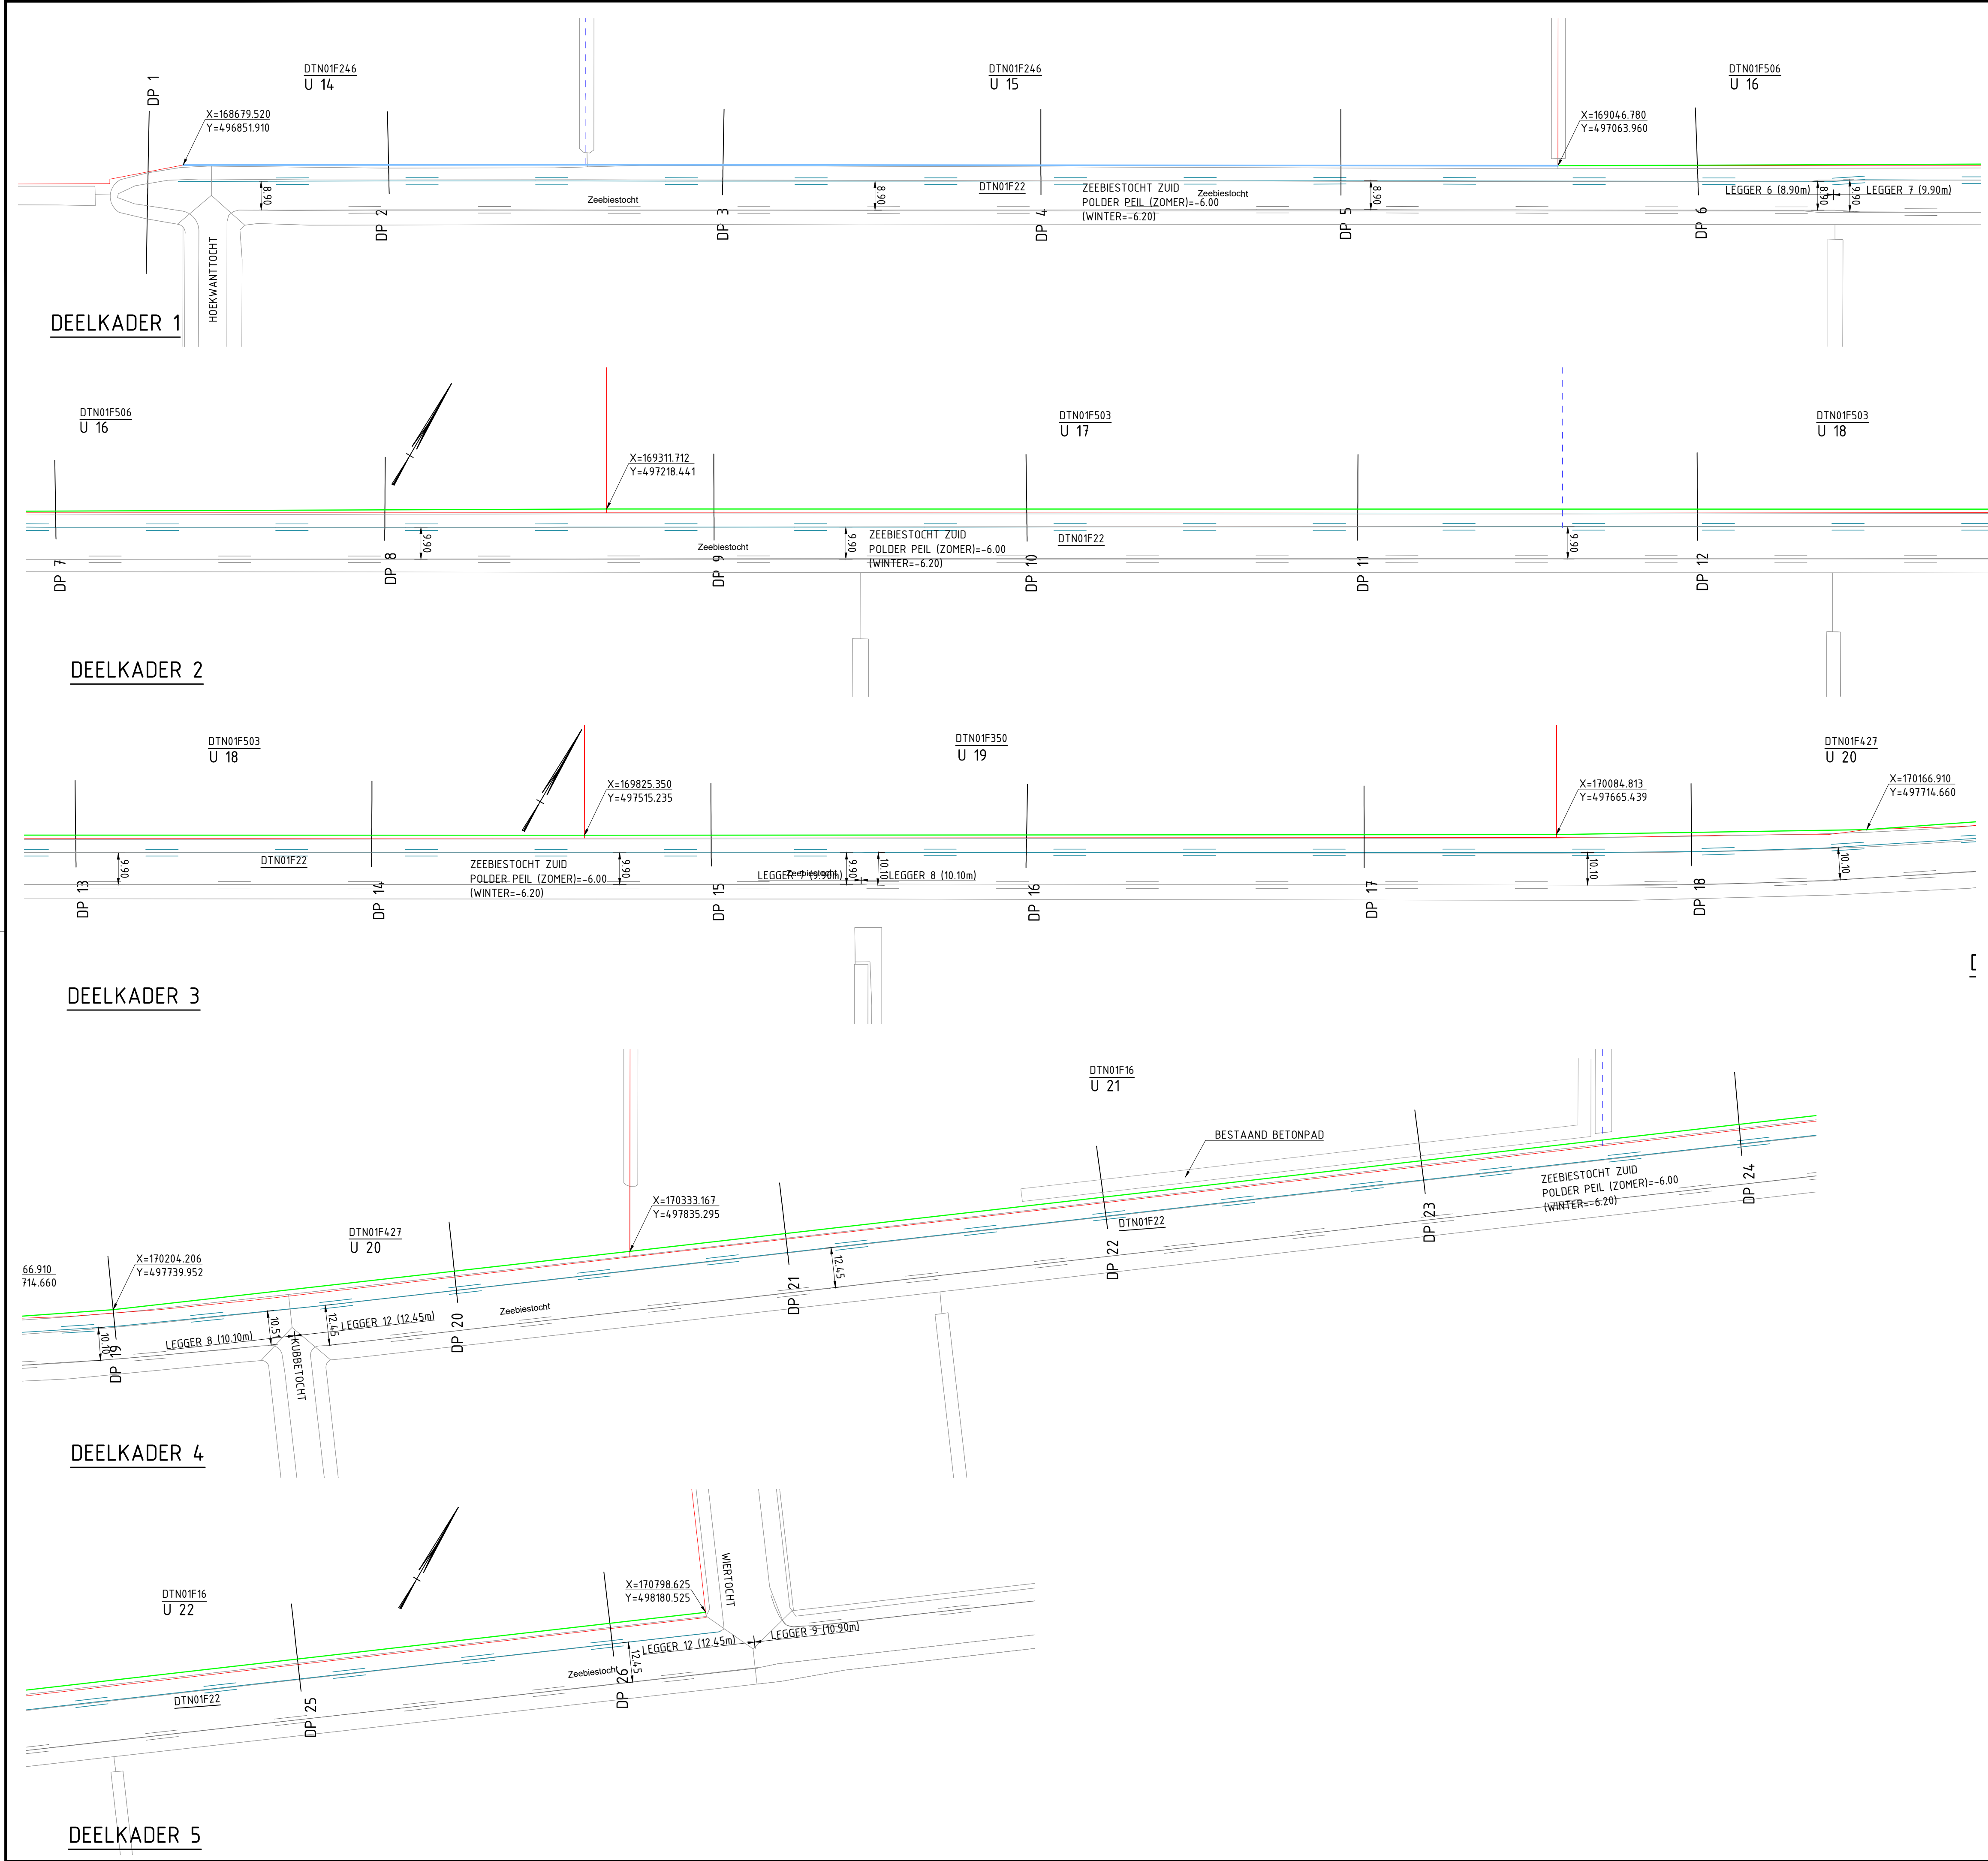

SITUATIE OVERZICHT
SCHAAL 1:20000

WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT ZUID				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSRENS/BEVOEGDE EIGENDOMSRENS (GRONDAANKOOP)	KAVELBREEDTE (m)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01F246 - U14 (DEEL)	---	14,7 (dp1 - dp2)	1,46 (dp1 - dp2)	215
DTN01F246 - U15 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	3,28 (dp3 - dp5)	985
DTN01F506 - U16	175	306 (dp6 - dp8)	3,73 (dp6 - dp8)	1142
DTN01F503 - U17 (DEEL)	343	294 (dp9 - dp11)	3,73 (dp9 - dp11)	1096
DTN01F503 - U18 (DEEL)	305	298 (dp12 - dp14)	3,66 (dp12 - dp14)	1091
DTN01F350 - U19	260	300 (dp15 - dp17)	3,92 (dp15 - dp17)	1175
DTN01F427 - U20	415	301 (dp18 - dp20)	4,08 (dp18 - dp20)	1229
DTN01F16 - U21 (DEEL)	531	302 (dp21 - dp23)	3,96 (dp21 - dp23)	1196
DTN01F16 - U22 (DEEL)	472	277 (dp24 - dp26)	4,19 (dp24 - dp26)	1160
		2525		9289


VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS
- - - HUIDIGE KAVEL GRENS (INDICATIEF)
- BEOOGDE INSTEK, TEVENS BESTAANDE KADASTRALE GRENS
- BEOOGDE KADASTRALE GRENS, TEVENS BEOOGDE INSTEK
- BESTAANDE BESCHOEIING
- BEOOGDE BESCHOEIING

041 KAVEL NUMMER
ZWD03A91 PERCEEL NUMMER


MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

A	-	-	-	-
0	12-01-2021	gwe	-	-
Code	Datum	Getekend door	Controle door	Toezicht door
			Omschrijving	
			LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911	
Project:			Duurzame oevers	
Omschrijving:			ZEEBIESTOCHT ZUID KAVELS U26, U27, U28, U29, U30, 31, U32 GRONDAANKOOP	
Besteknummer:			Schaal:	1:1000
Tekeningsnummer:			P-WG205-CI-003	
			Status:	Definitief
			Fase:	Projectplan procedure
			Formaat:	A1
			Wijz:	0
			Blad:	1
			Aantal:	4

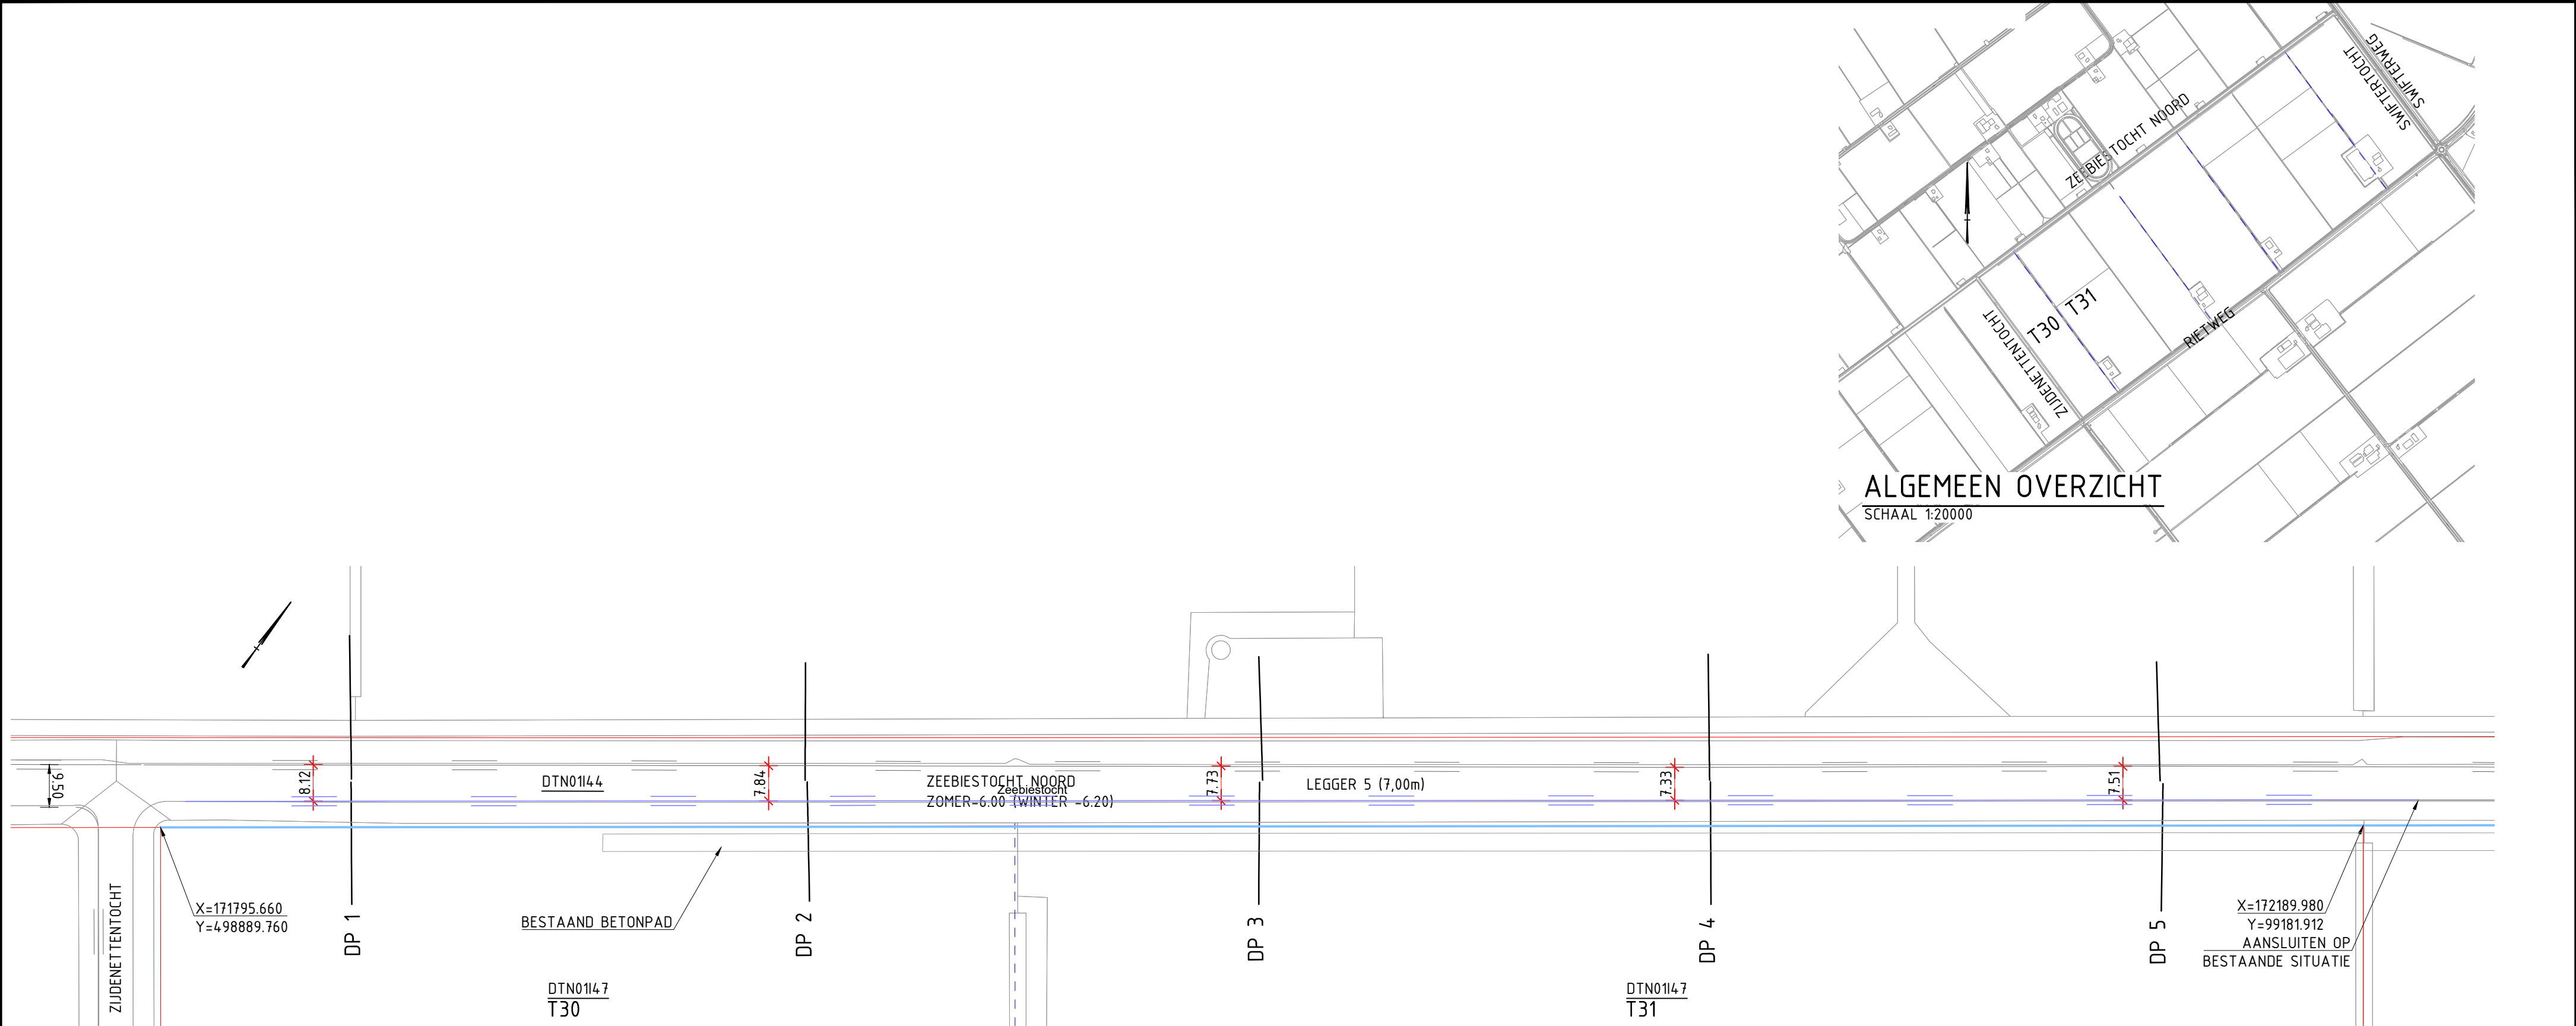

ALGEMEEN OVERZICHT

SCHAAL 1:20000

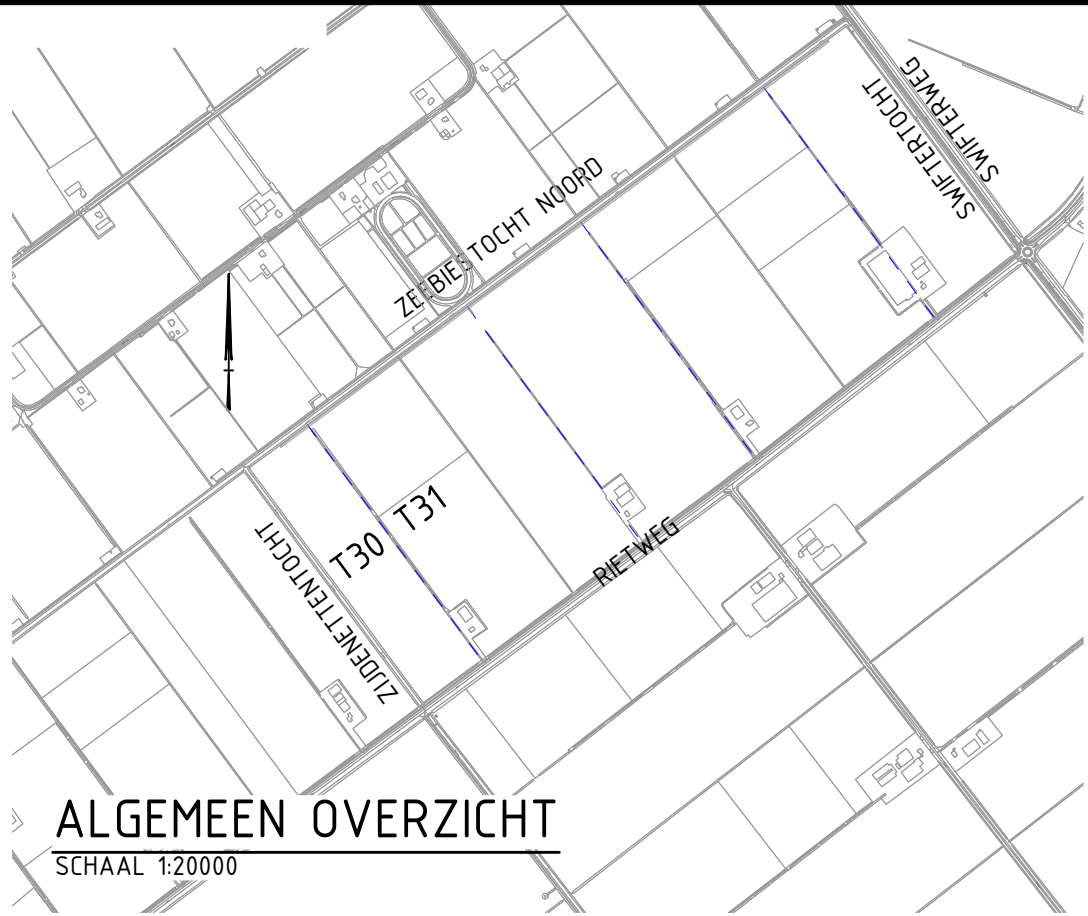

WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT NOORD KAVELS T30 EN T31				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSGRENS/BEOOGDE EIGENDOMSGRENS (GRONDAANKOOP)	KAVELBREEDTE (m¹)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m¹)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01147 - T30 (DEEL)	---	190 (dp1 - dp2)	2,86 (dp1 - dp2)	543
DTN01147 - T31 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	2,38 (dp3 - dp5)	715
				1258




VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUDIGE KADASTRALE GRENS
- HUDIGE KAVEL GRENS (INDICATIEF)
- BEOOGDE INSTEEL, TEVENS BESTAANDE KADASTRALE GRENS
- BESTAANDE BESCHOEIING
- BEOOGDE BESCHOEIING

041 KAVEL NUMMER
ZWD03A91 PERCEEL NUMMER

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

A	-	-	-	-	-
0	12-01-2021	gwe	-	-	-
Code:	Datum:	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving:
				LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911	
Adviseur/aannemer:					
Project: Duurzame oevers					
Omschrijving: ZEEBIESTOCHT NOORD KAVELS T30 EN T31 GRONDAANKOOP				Status: Definitief	
Besteknummer: -				Fase: Projectplan procedure	
Schaal: 1:1000				Formaat: A2	
Tekeningsnummer: P-WG205-CI-002				Wijz. 0	
				Blad: 1	
				Aantal: 2	

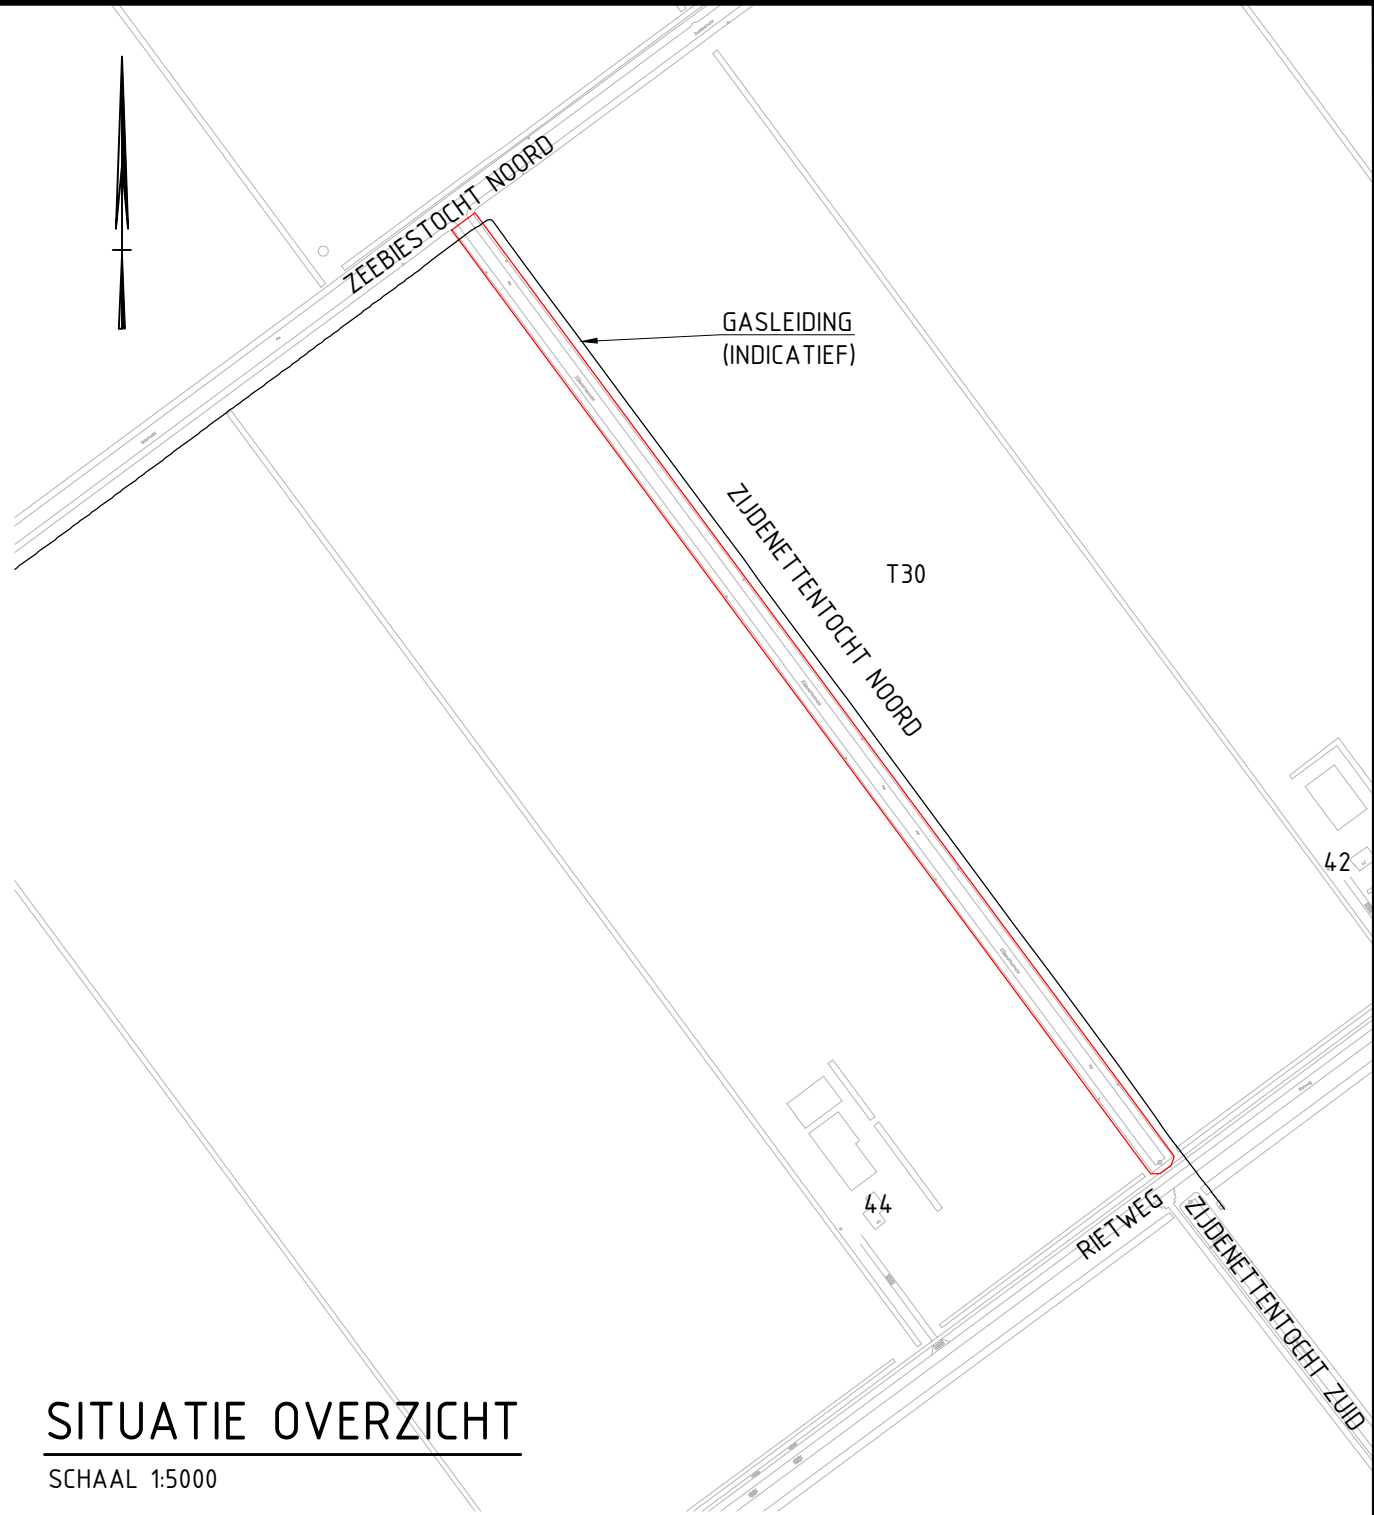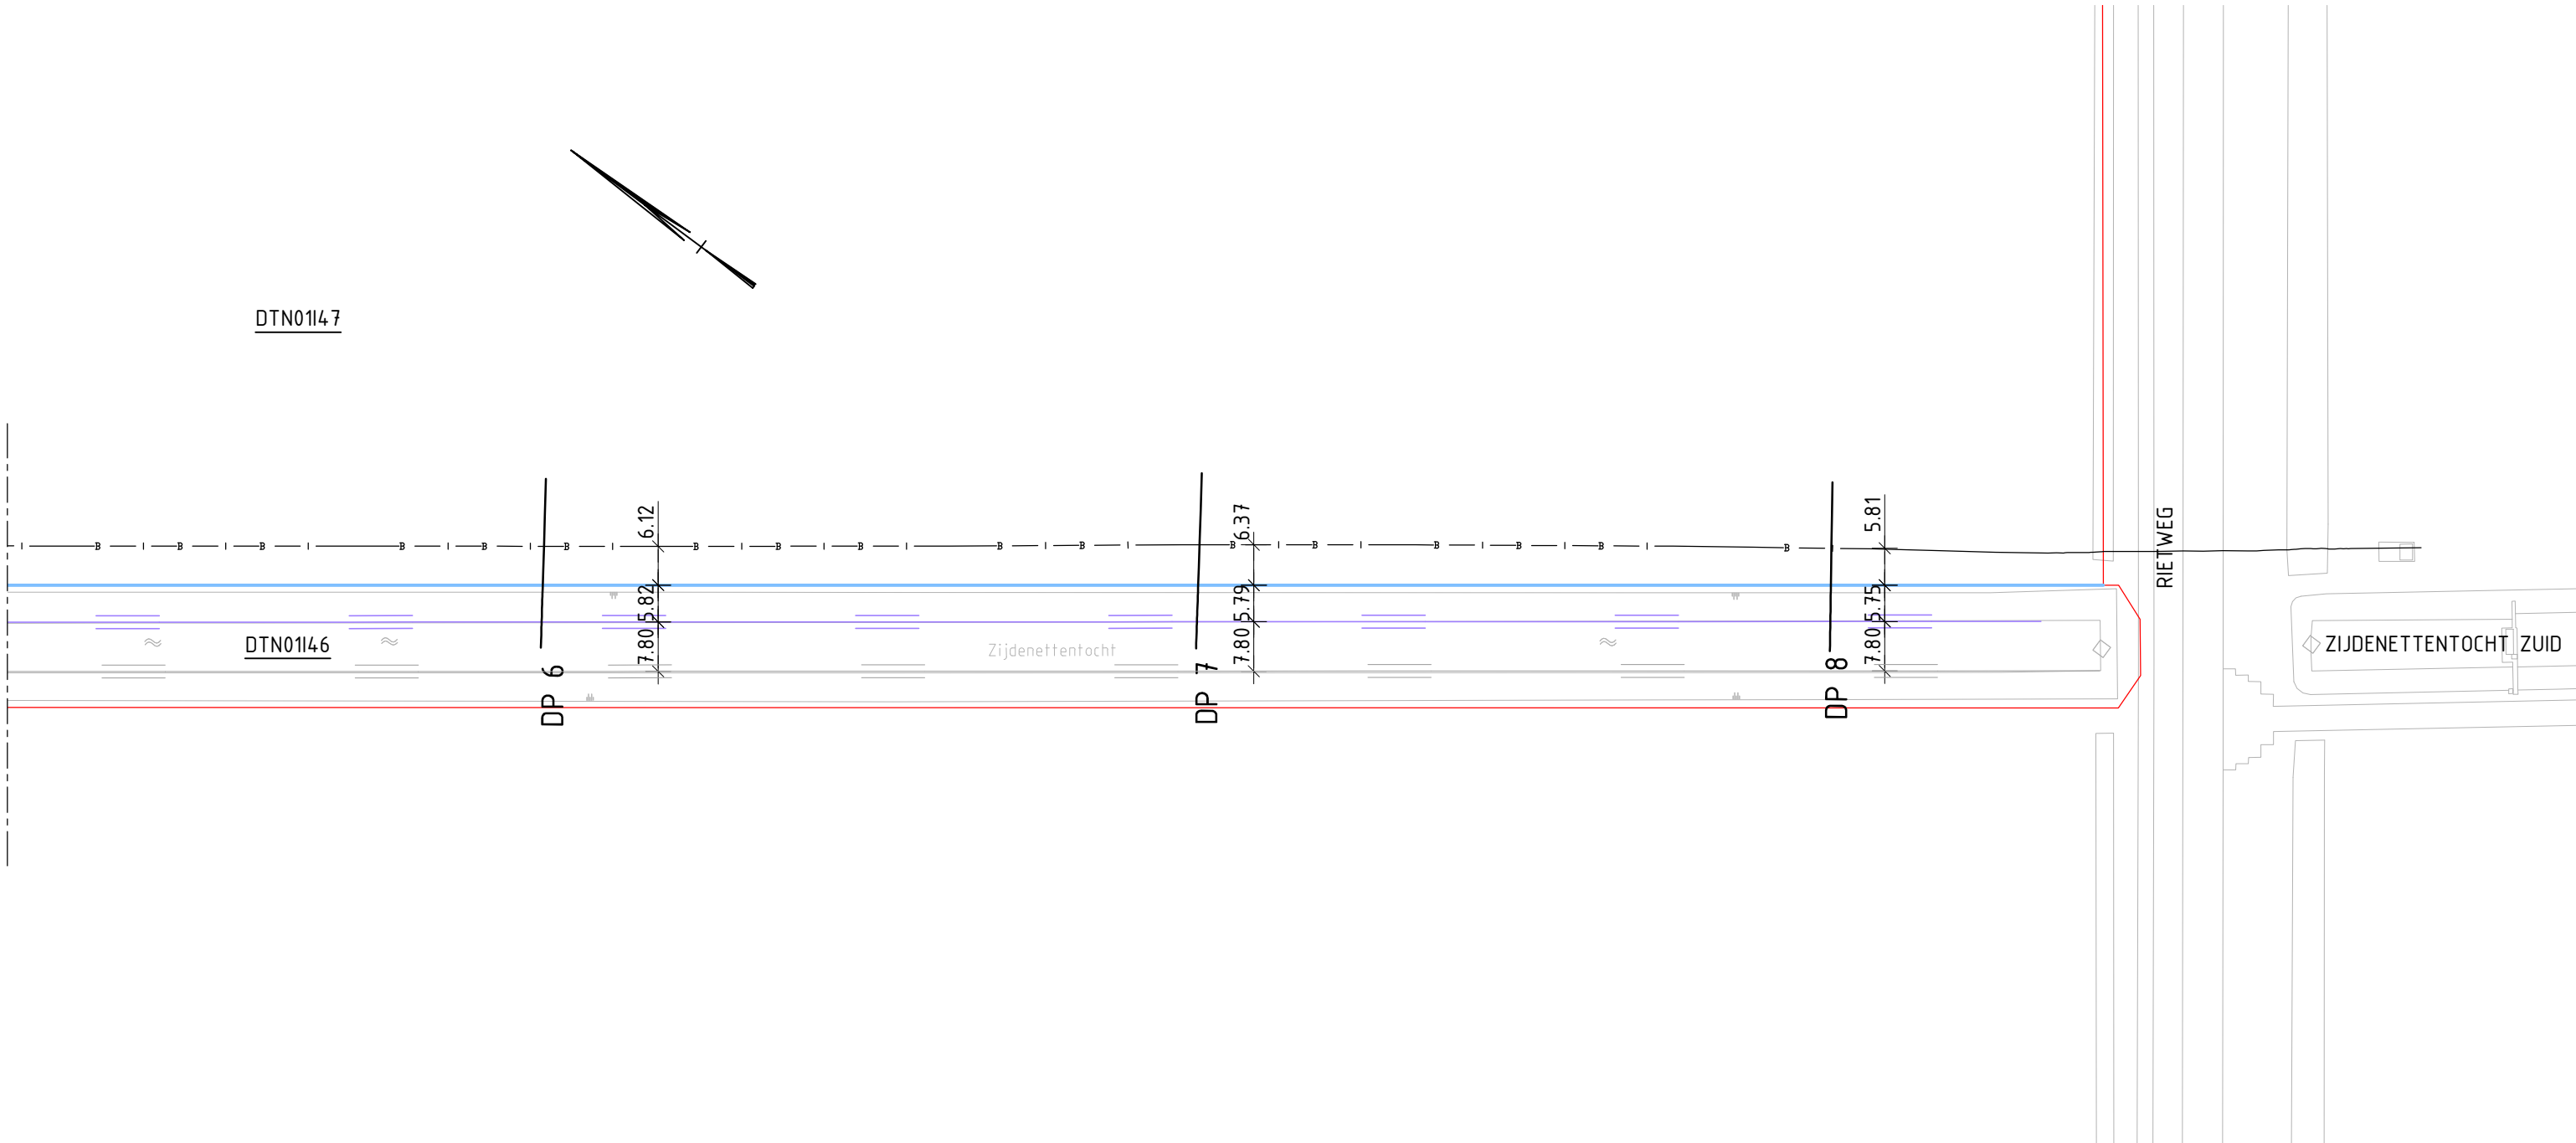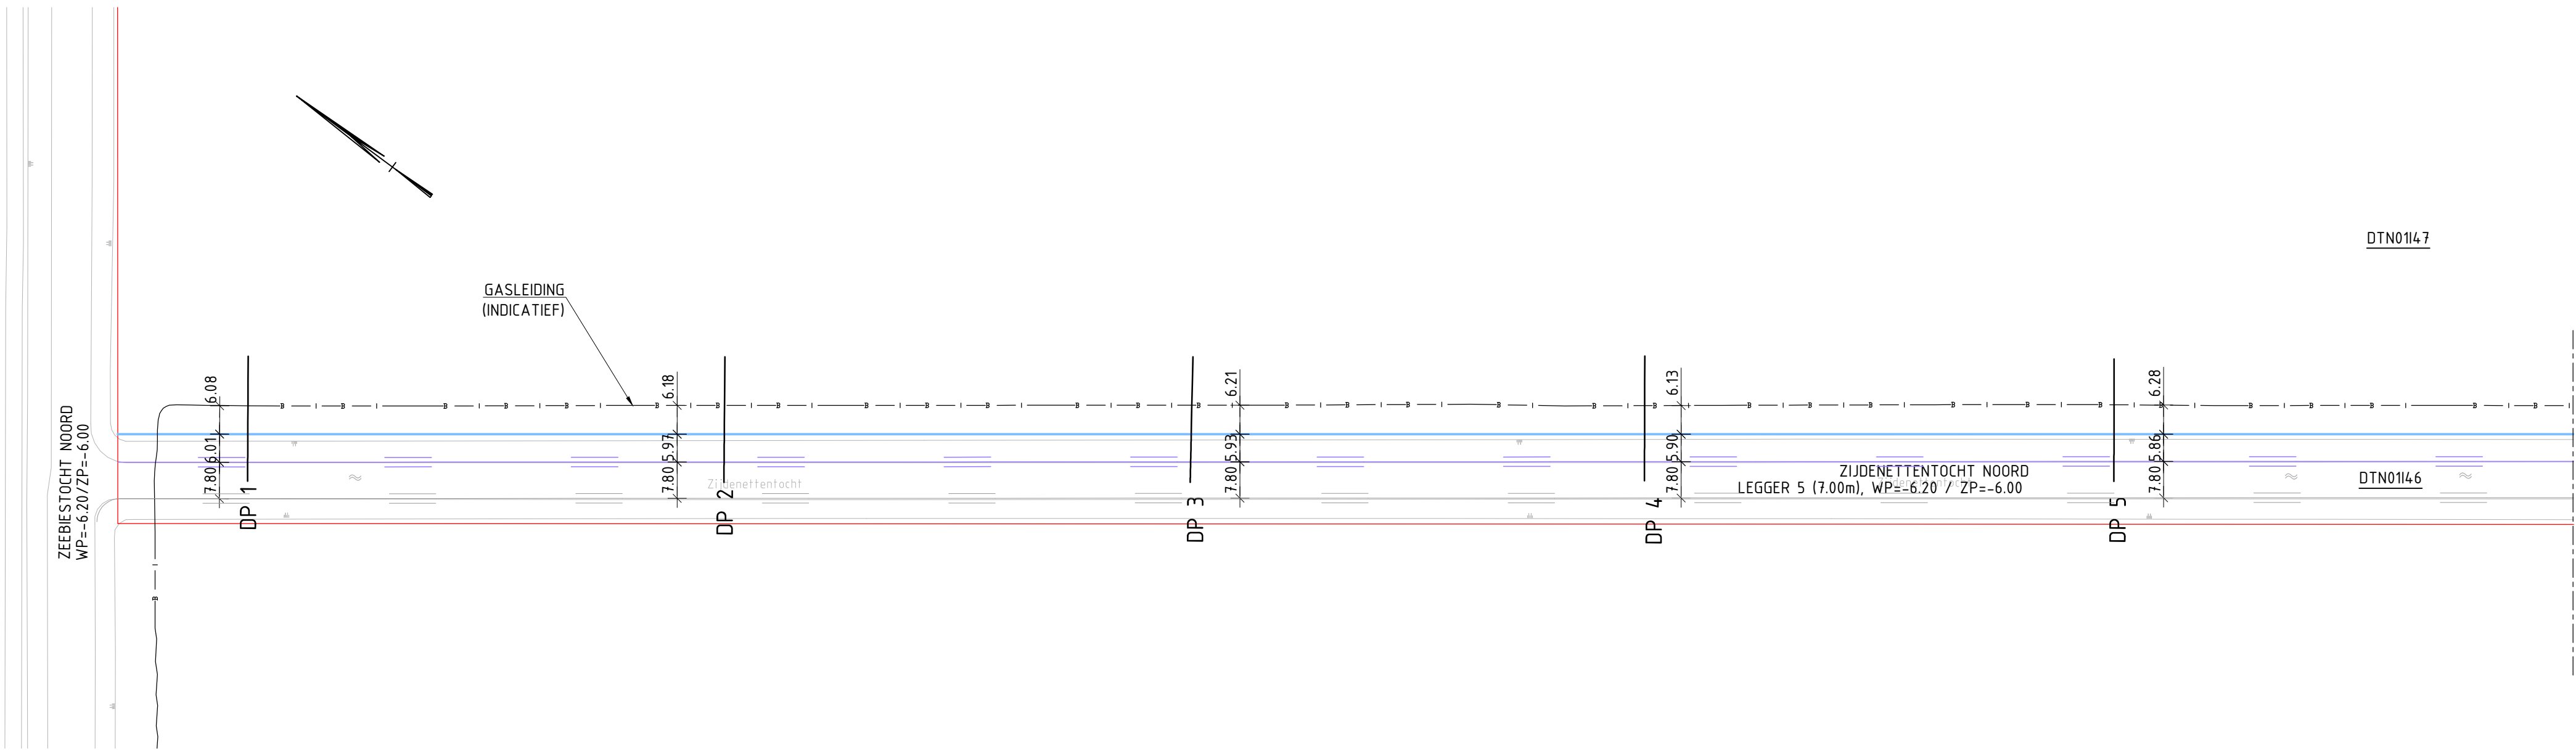

SITUATIE OVERZICHT
SCHAAL 1:5000

WERKZAAMHEDEN ZIJDENENTENTOCHT NOORD KAVEL T30				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSGRENS/BEOOGDE EIGENDOMSGRENS (GRONDAANKOOP)	KAVELBREEDTE (m')	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m')	ONTGRAVEN (m³)
DTN01147 - T30	---	774 (dp1 - dp8)	3,79 (dp1 - dp8)	2932 2932



VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS
- BESTAANDE BESCHOEIING
- BEOOGDE BESCHOEIING
- BEOOGDE INSTEEK, TEVENS BESTAANDE KADASTRALE GRENS
- GASLEIDING GASUNIE (LIGGING INDICATIEF)

041 KAVEL NUMMER
ZWD03A91 PERCEEL NUMMER

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

A	-	-	-	-	-
0	12-01-2021	qwe	-	-	-
Code:	Datum:	Geleekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving:
					LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL.: 0320 - 274911
Project: Duurzame oevers					Status: Definitief
Omschrijving: ZIJDENENTENTOCHT NOORD KAVEL T30 GRONDAANKOOP					Fase: Projectplan procedure
Besteknummer: -			Schaal: 1:1000	Formaat: A1	Wijz: 0
Tekeningnummer: P-WG206-CI-002				Blad: 1	Aantal: 2

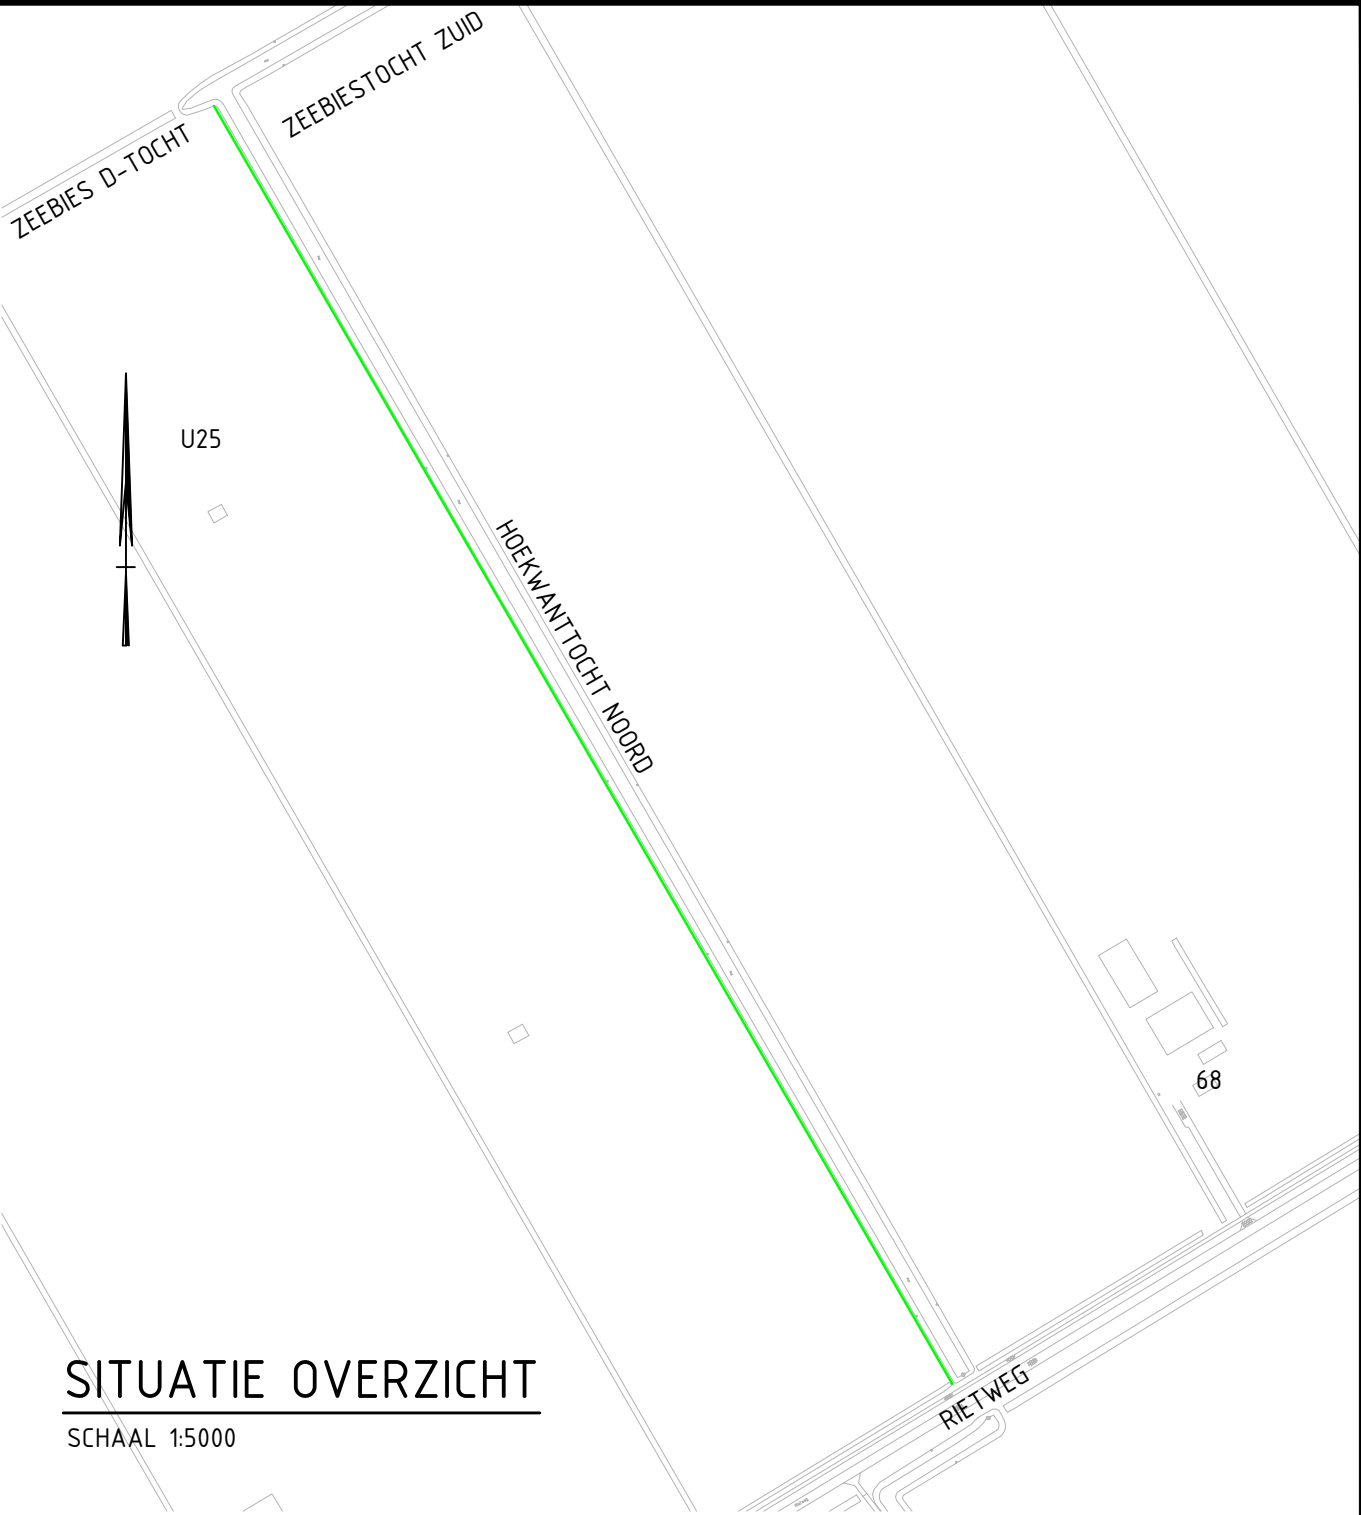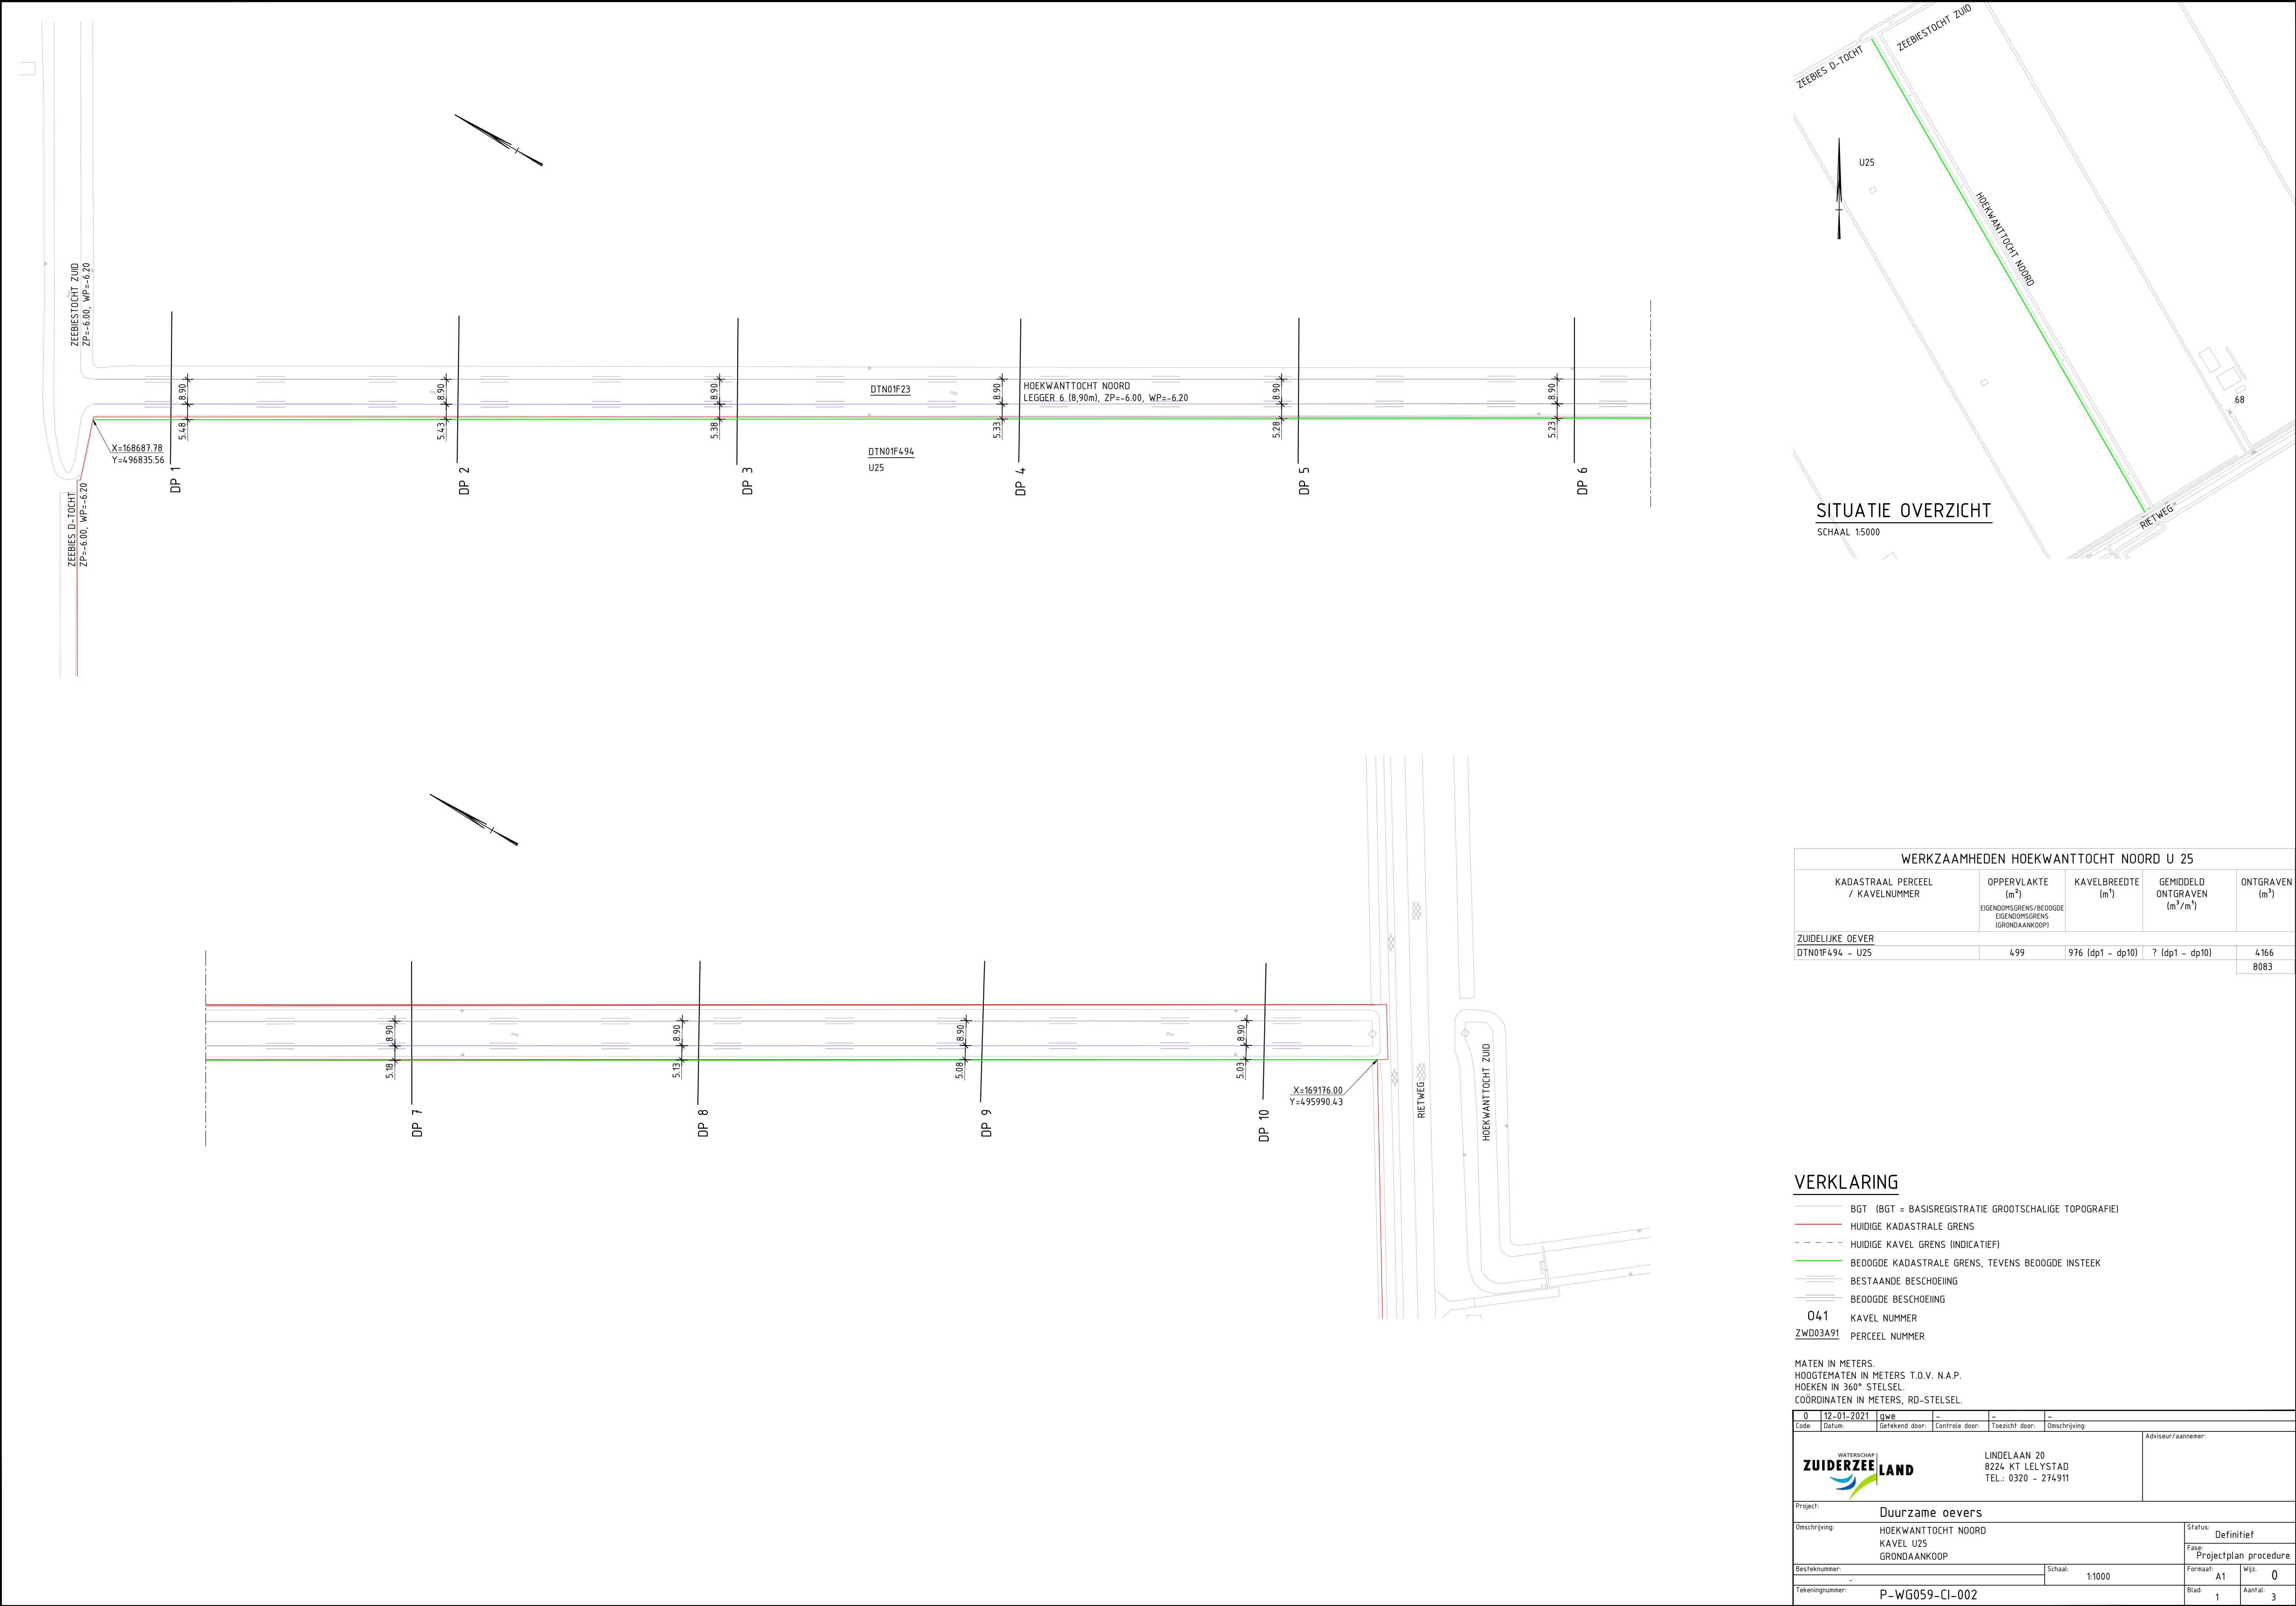

WERKZAAMHEDEN HOEKWANTTOCHT NOORD U 25				
KADAstraal PERCEEL / KAVELnummer	OPPERVLAKTE (m²)	KAVELBREEDTE (m')	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m')	ONTGRAVEN (m³)
	EIGENDOMSgrens/BEOOGDE EIGENDOMSGRENS (GRONDAANKOOP)			
ZUIDELIJKE OEVER				
DTN01F494 - U25	499	976 (dp1 - dp10)	? (dp1 - dp10)	4166
				8083

VERKLARING


- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADAstrALE GRENS
- - - HUIDIGE KAVEL GRENS (INDICATIEF)
- BEOOGDE KADAstrALE GRENS, TEVENS BEOOGDE INSTEEL
- BESTAANDE BESCHOEIING
- BEOOGDE BESCHOEIING

041 KAVEL nummer
ZW003A91 PERCEEL nummer


MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COORDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

0	12-01-2021	qwe	-	-	-	Adviseur/aannemer:
Code:	Datum	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving:	
WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL.: 0320 - 274911						Project: Duurzame oevers
Omschrijving: HOEKWANTTOCHT NOORD KAVEL U25 GRONDAANKOOP						
Besteknummer: -			Schaal: 1:1000		Status: Definitief Fase: Projectplan procedure	
Tekeningsnummer: P-WG059-CI-002					Formaat: A1	Wijz: 0
					Blad: 1	Aantal: 3


4. Bijlage: Profieltekeningen

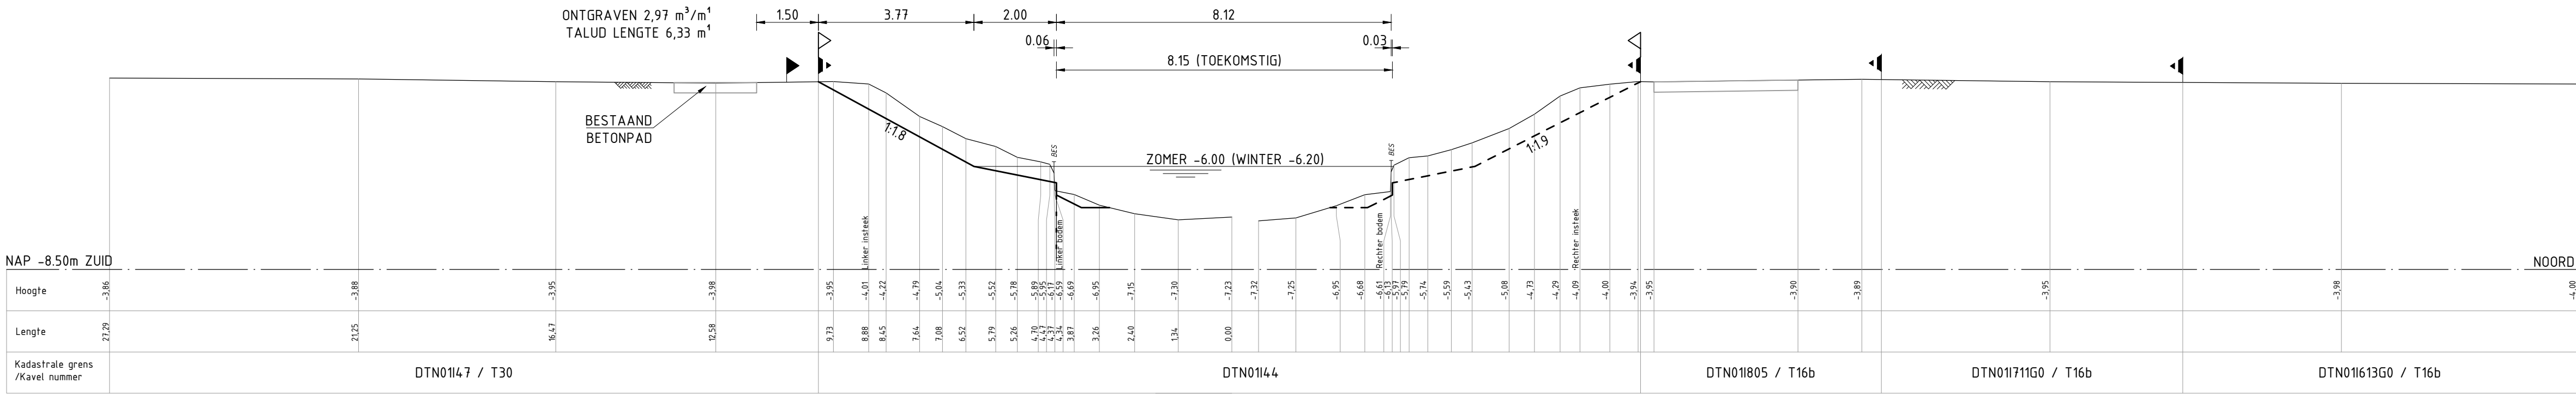


DWARSPROFIEL 1

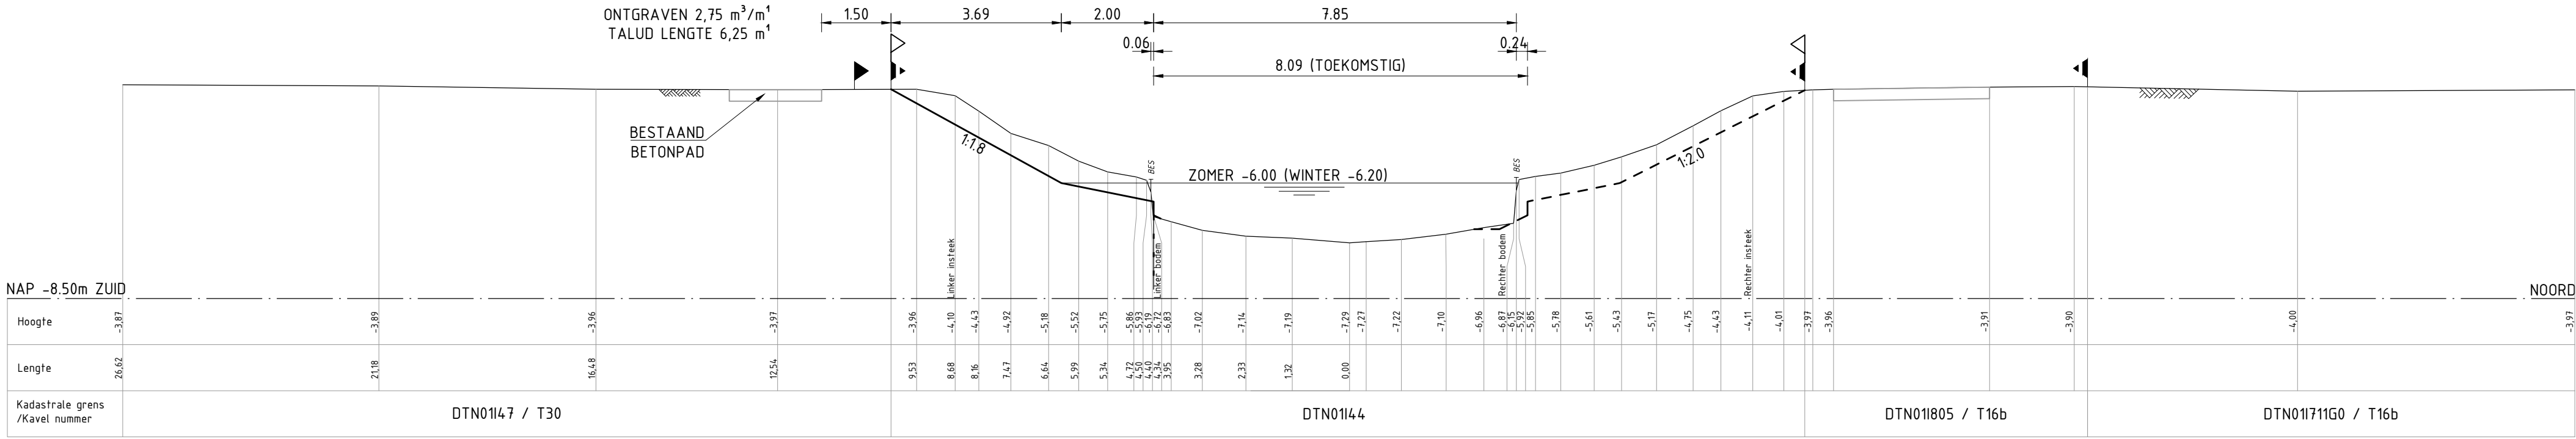


DWARSPROFIEL 2

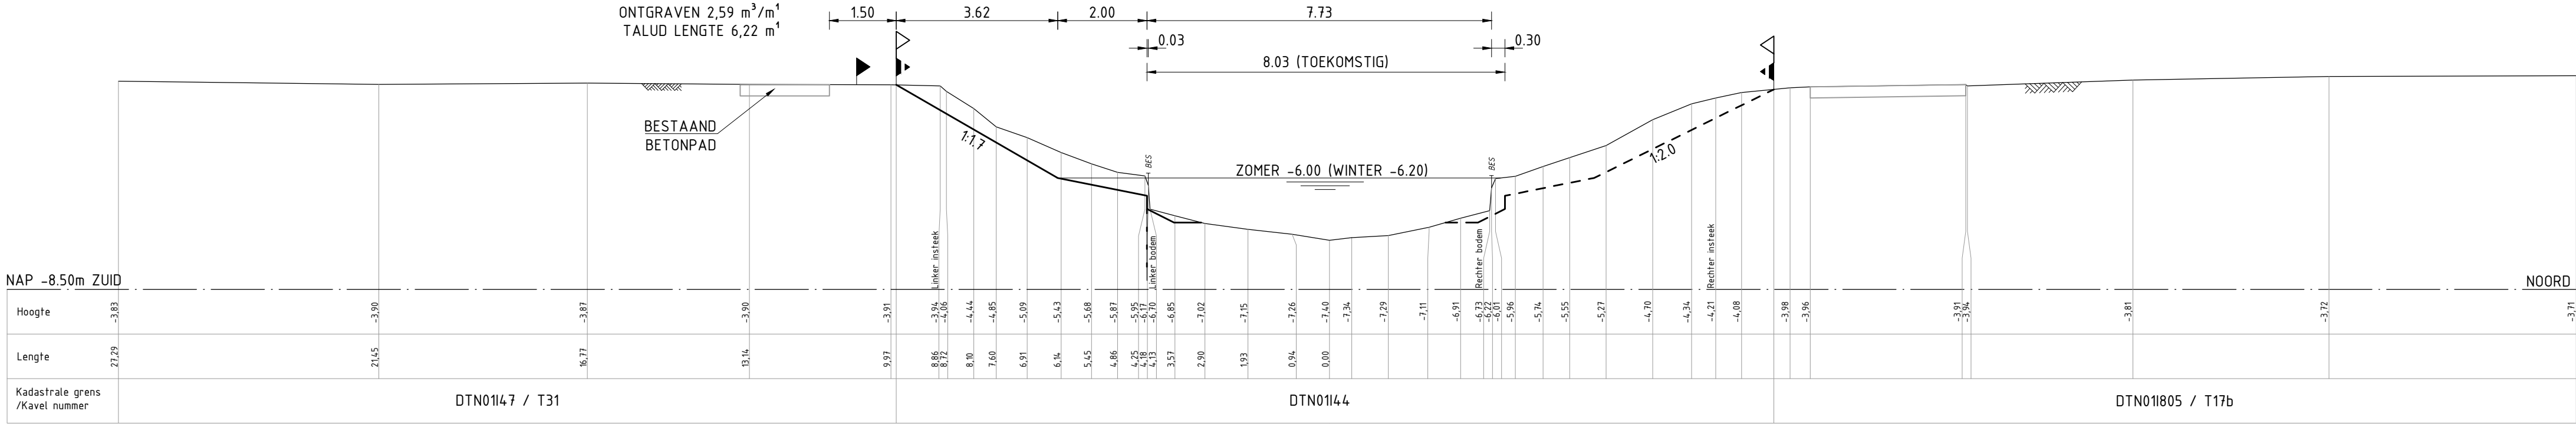



DWARSPROFIEL 3

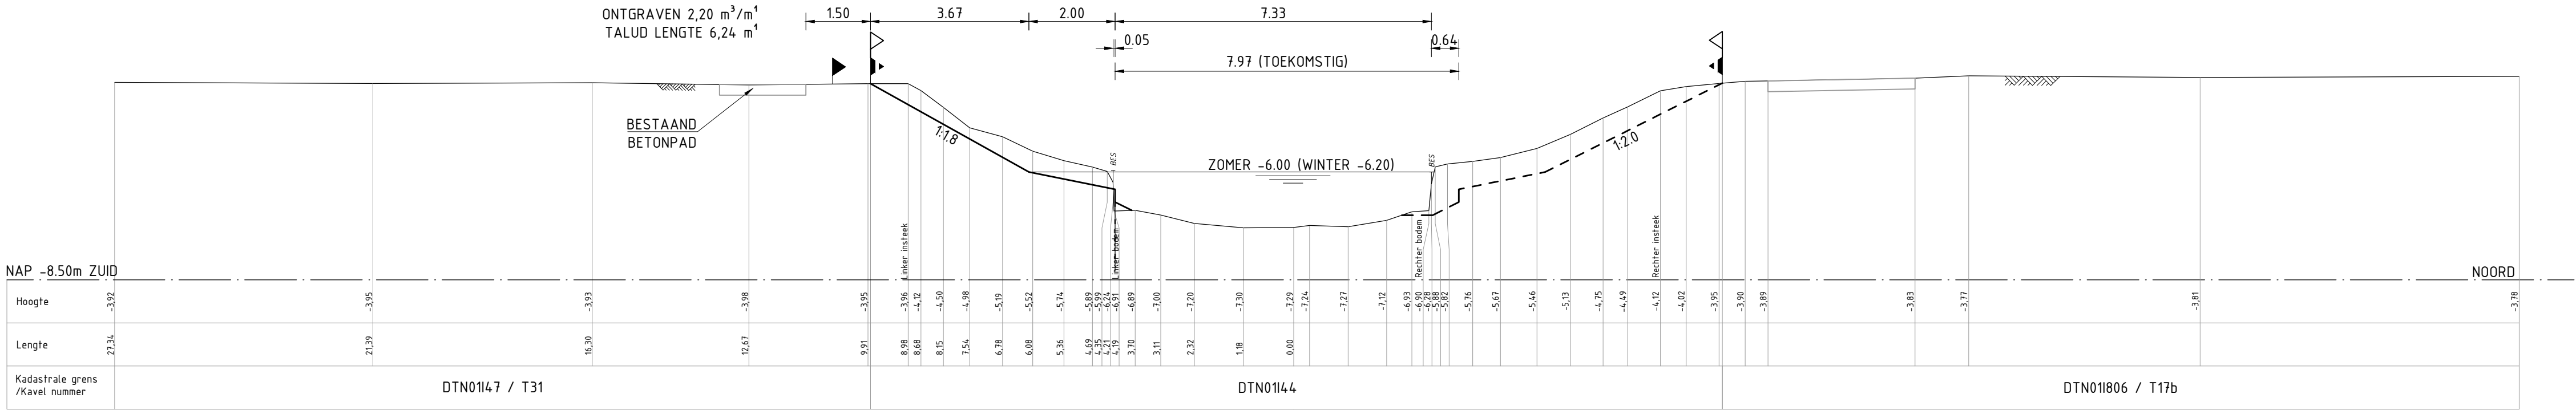

DWARSPROFIEL 4

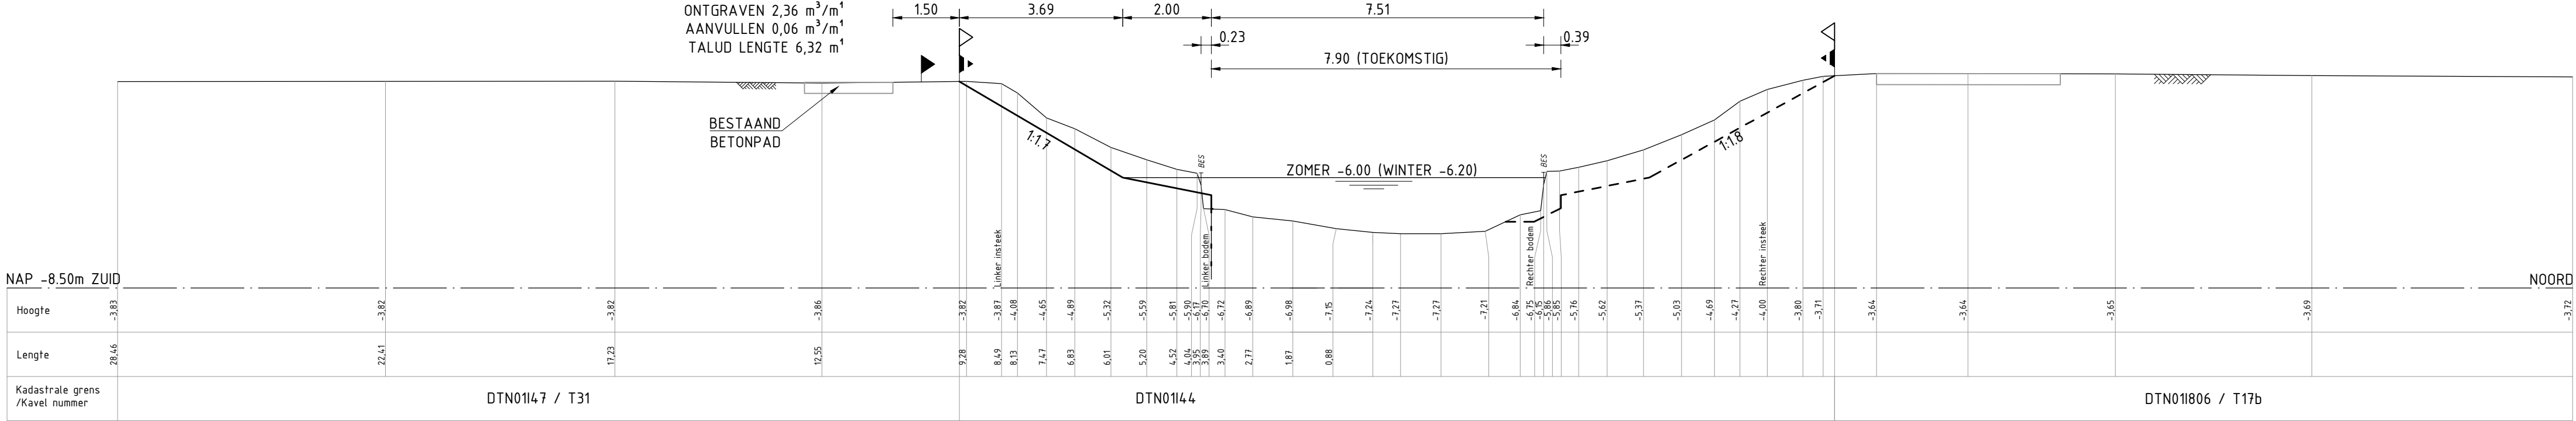

DWARSPROFIEL 5

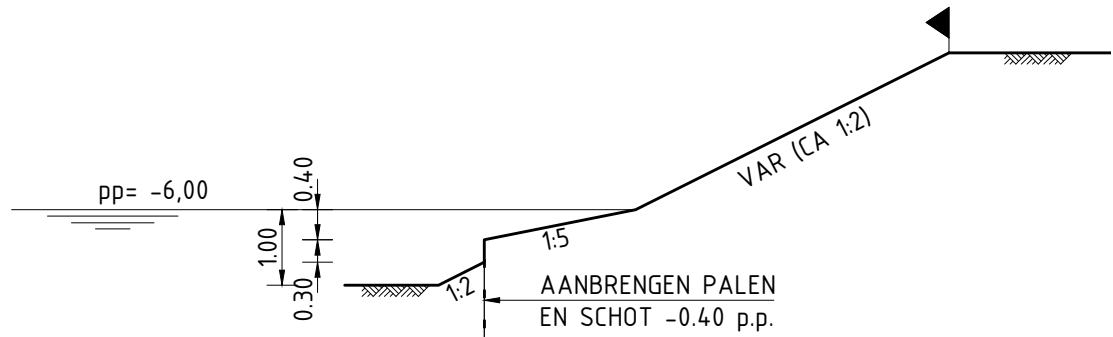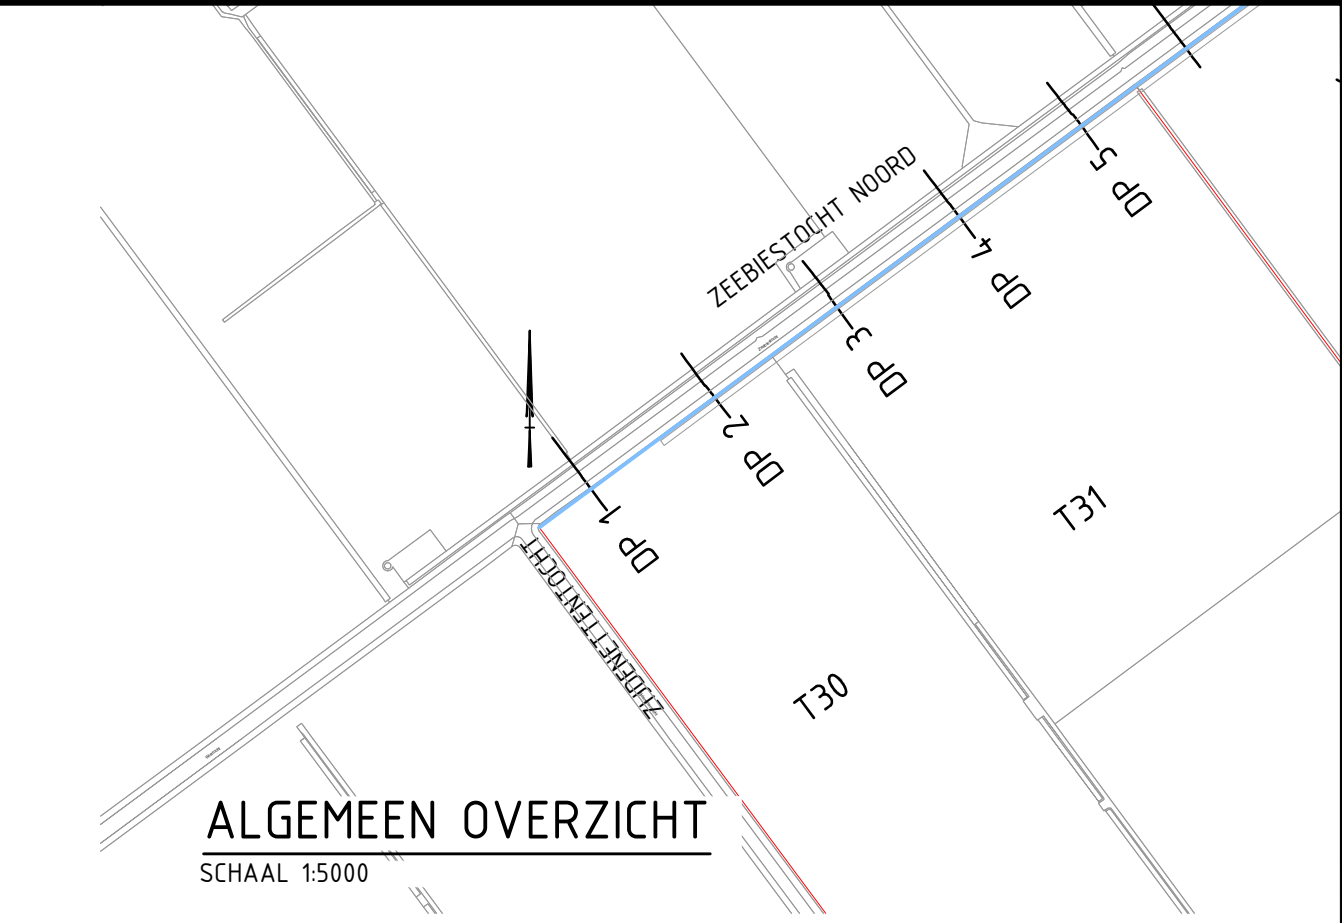

PRINCIPE DUURZAME OEVER


WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT NOORD KAVELS T30 EN T31				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSGRENS/BEDOOGDE EIGENDOMSGRENS (GRONDAANGIFTE)	KAVELBREEDTE (m)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m¹)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01147 - T30 (DEEL)	---	190 (dp1 - dp2)	2,86 (dp1 - dp2)	543
DTN01147 - T31 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	2,38 (dp3 - dp5)	715
				1258

VERKLARING


- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- BEDOOGDE INSTEET (SITUATIE)
- 041 KAVEL NUMMER (SITUATIE)
- ONTGRAVEN (PROFIELEN)
- p.p. POLDER PEIL (PROFIELEN)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BEDOOGDE INSTEET (PROFIELEN)
- BESTAANDE BESCHOEIING (PROFIELEN)
- NIUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.


A	-	-	-	-	
0	12-01-2021	gwe	-	-	
Code:	Datum:	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving:
 ZUIDERZEE LAND					LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911
Project: Duurzame oevers					
Omschrijving:	ZEEBIESTOCHT NOORD KAVELS T30, T31 PROFIELEN 1 t/m 5				Status: Definitief
Besteknummer:				Schaal: 1:100	Formaat: A1
Tekeningsnummer:	P-WG205-CI-002				Wijz: 0
					Blad: 2
					Aantal: 2

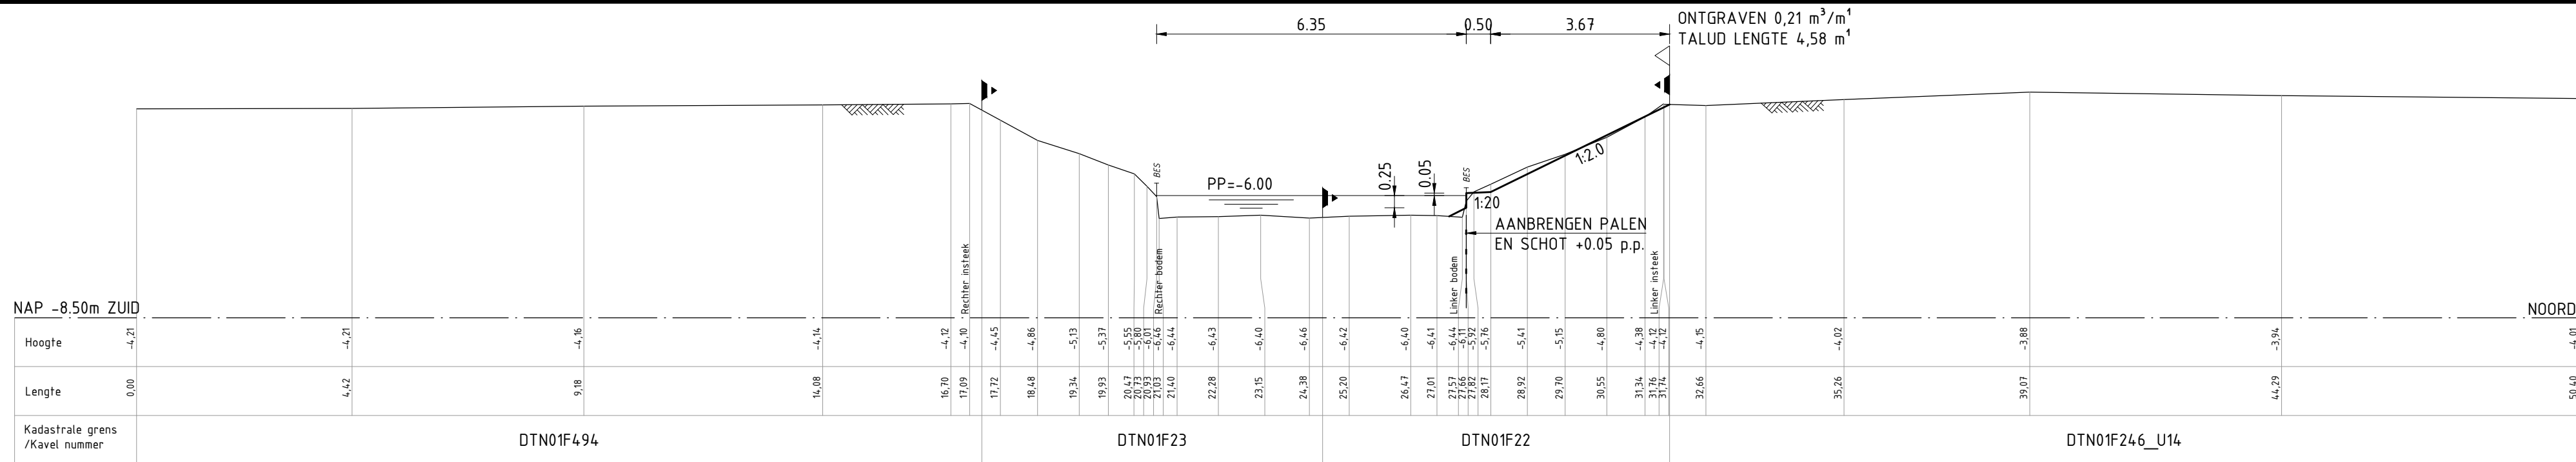


DWARSPROFIEL 1

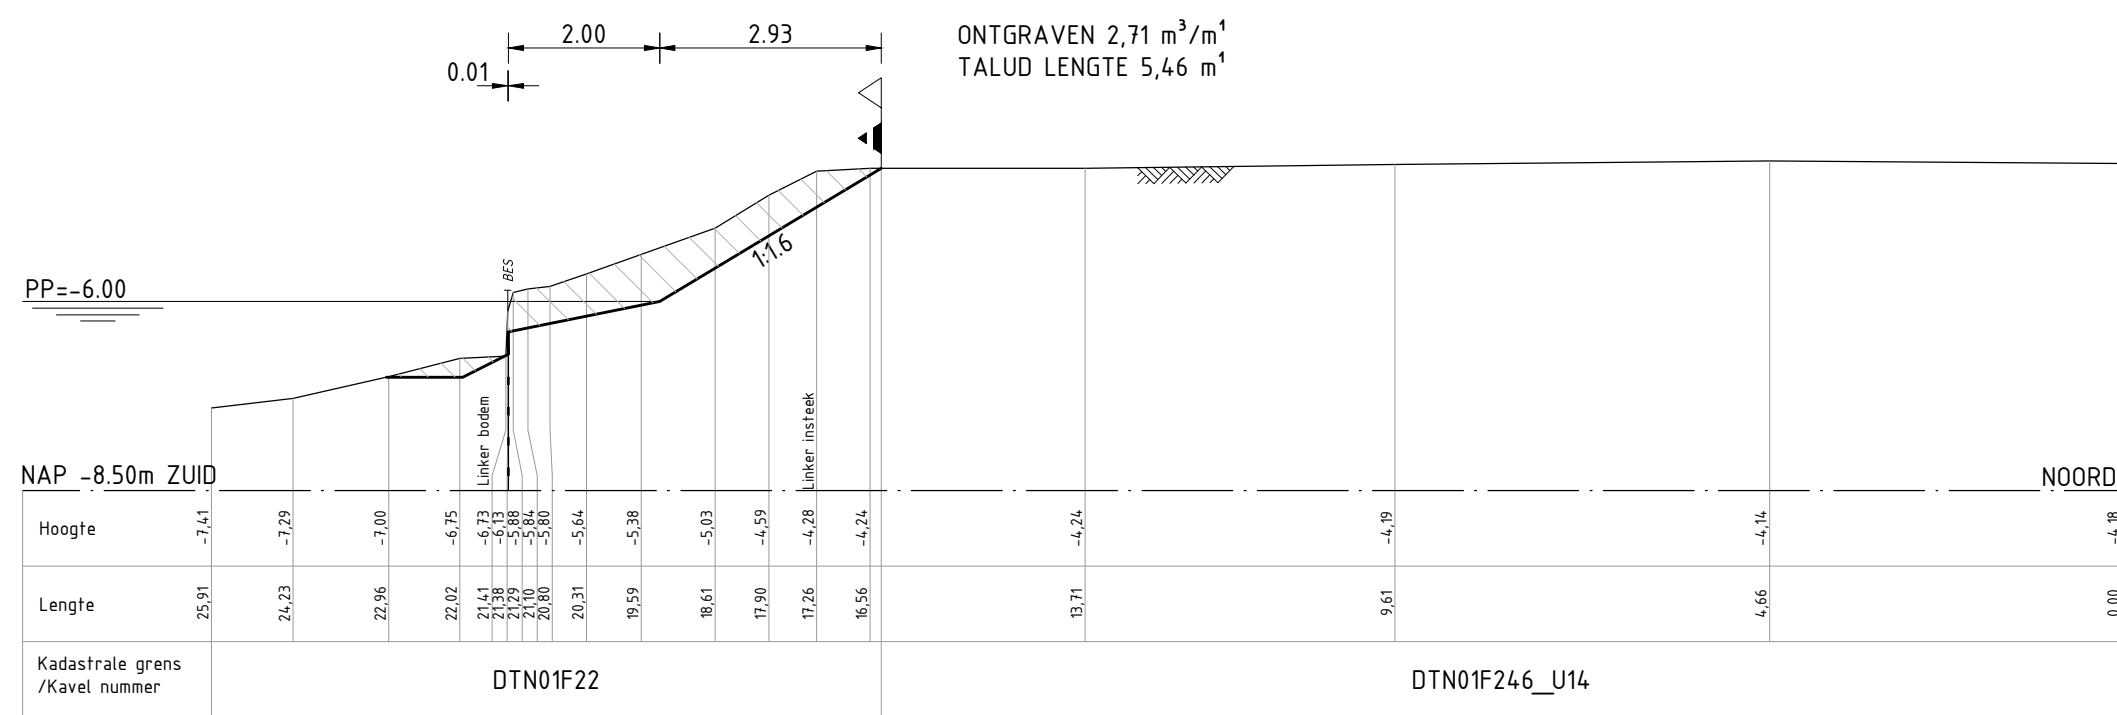


DWARSPROFIEL 2

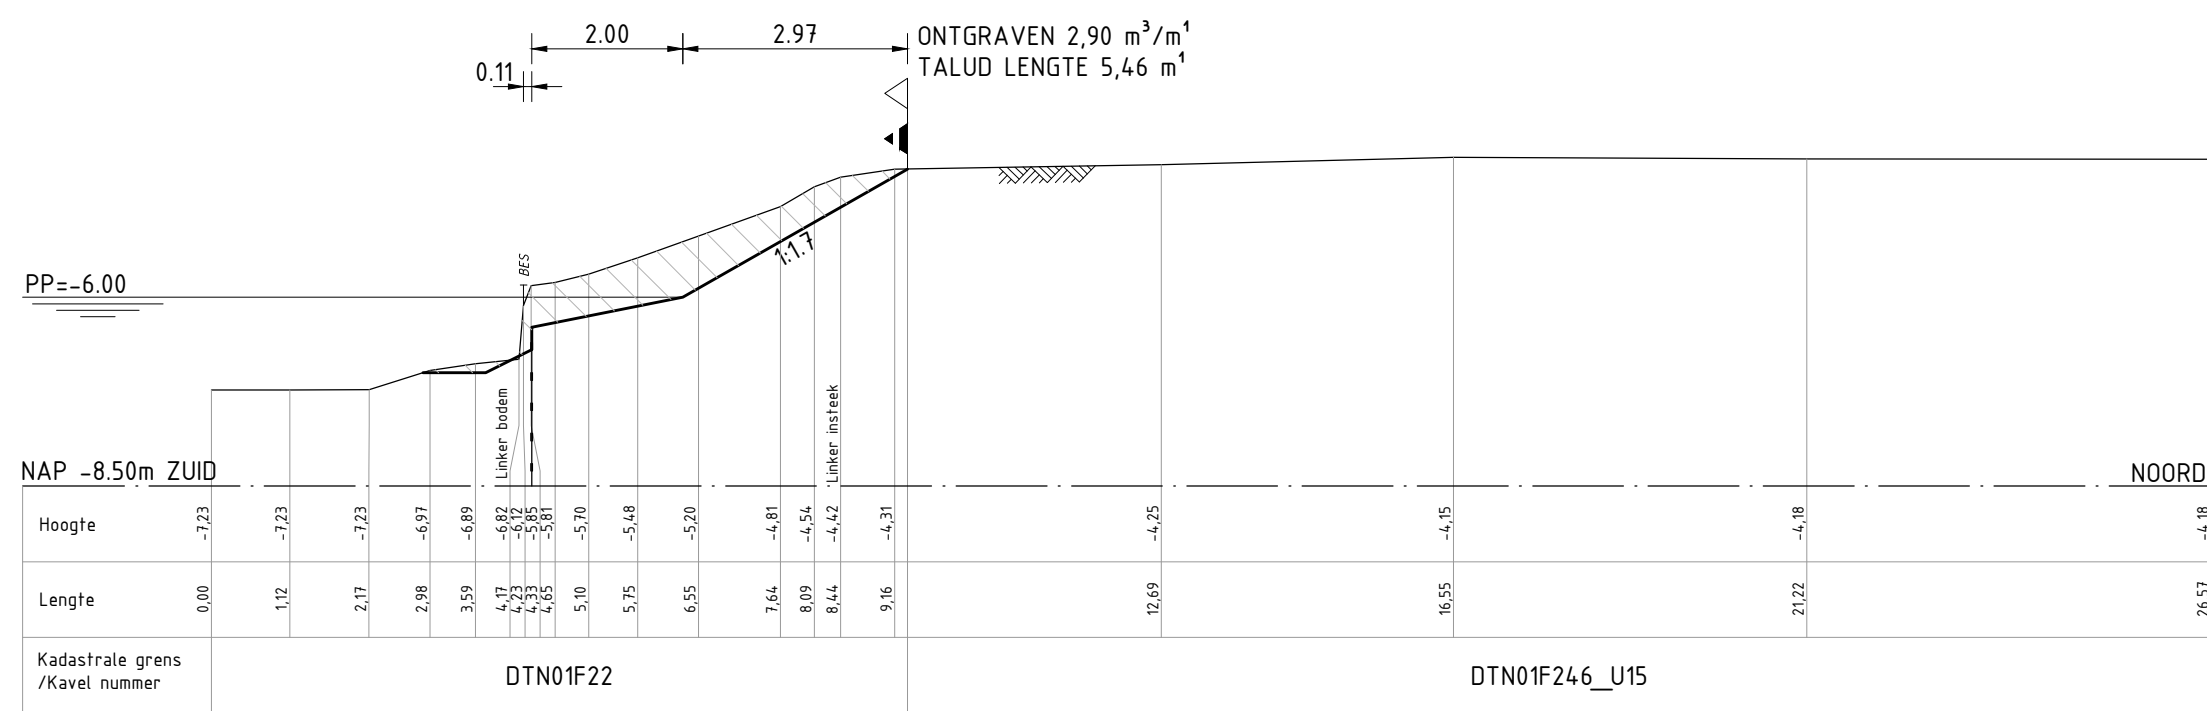


DWARSPROFIEL 3

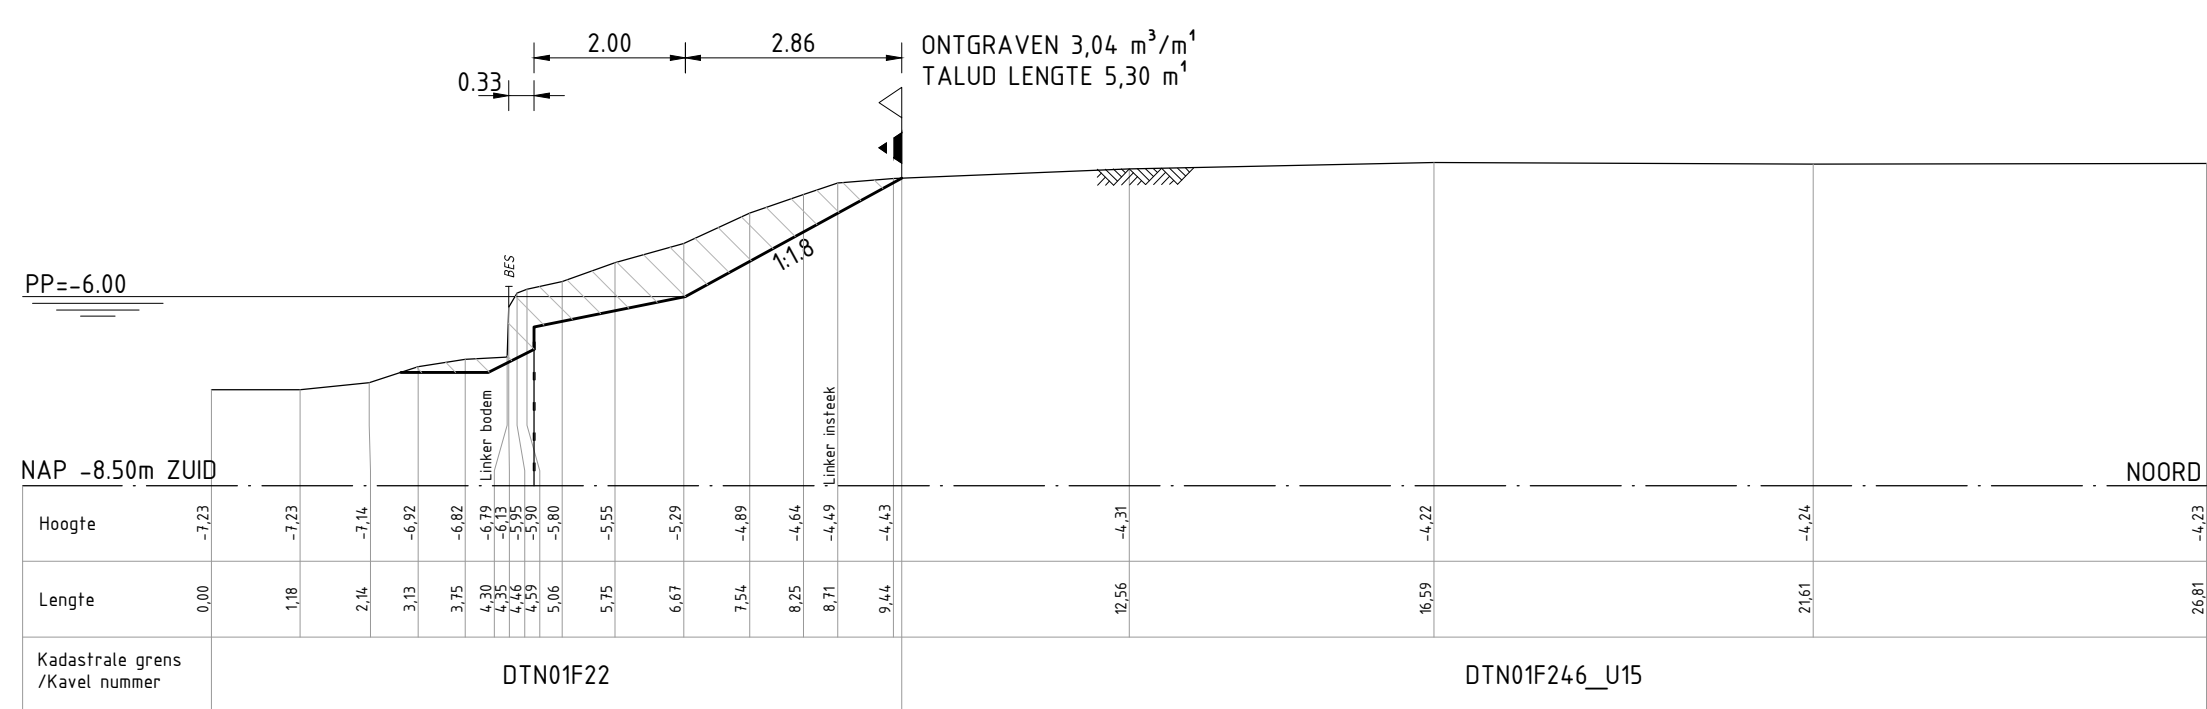


DWARSPROFIEL 4

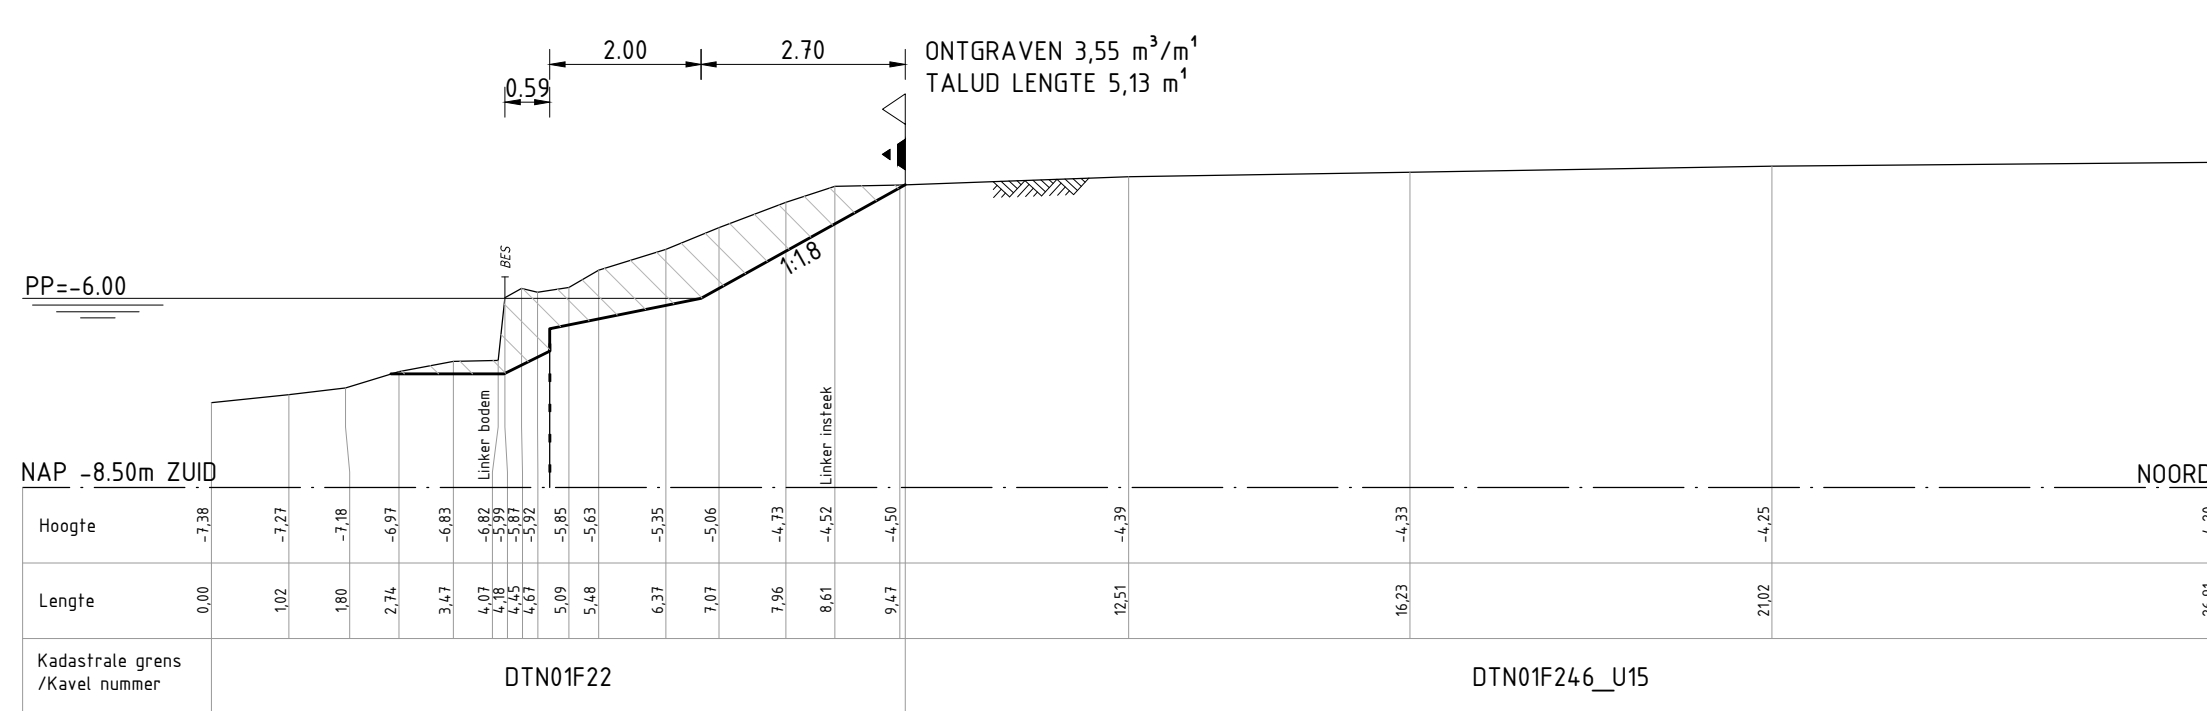


DWARSPROFIEL 5

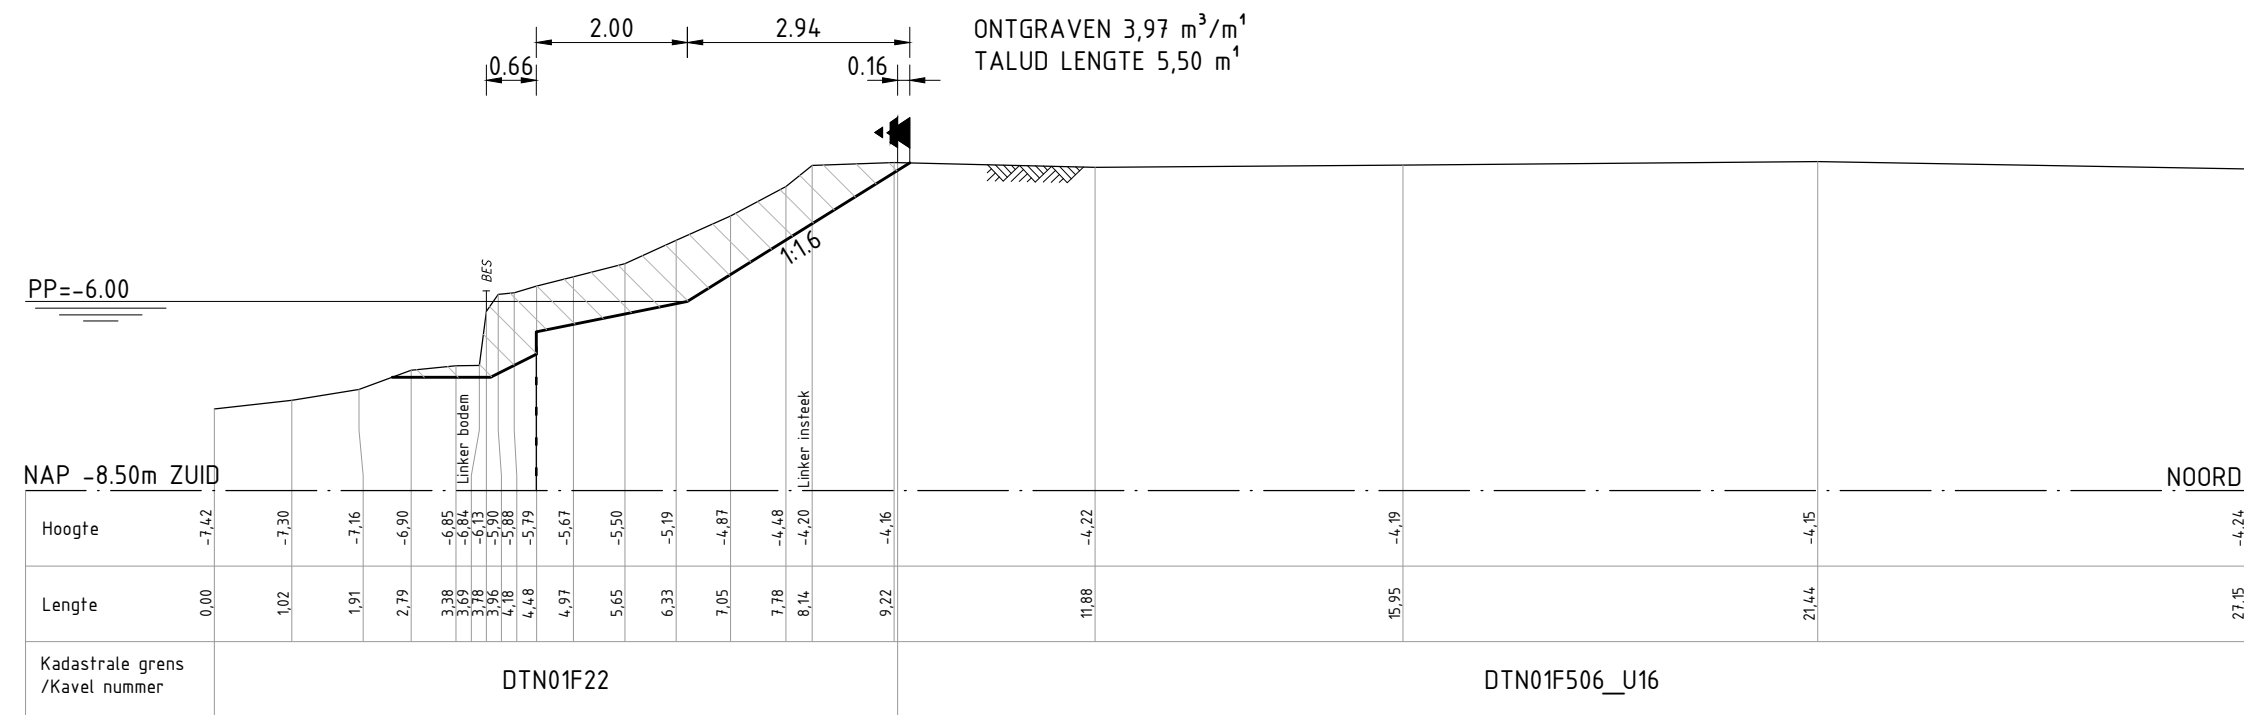


DWARSPROFIEL 6

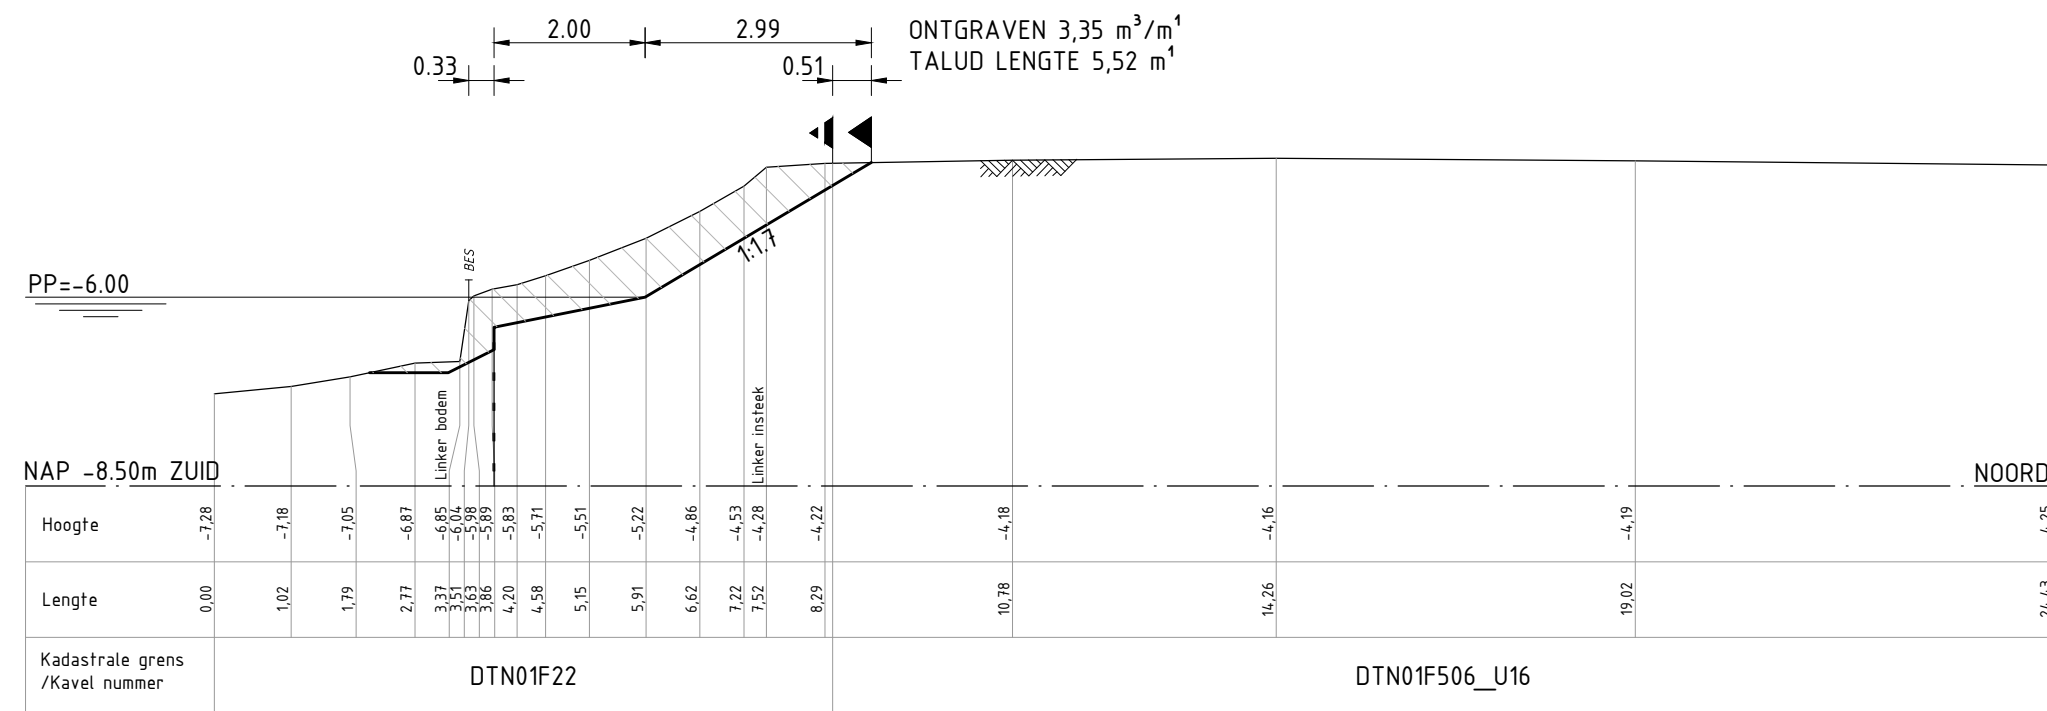


DWARSPROFIEL 7

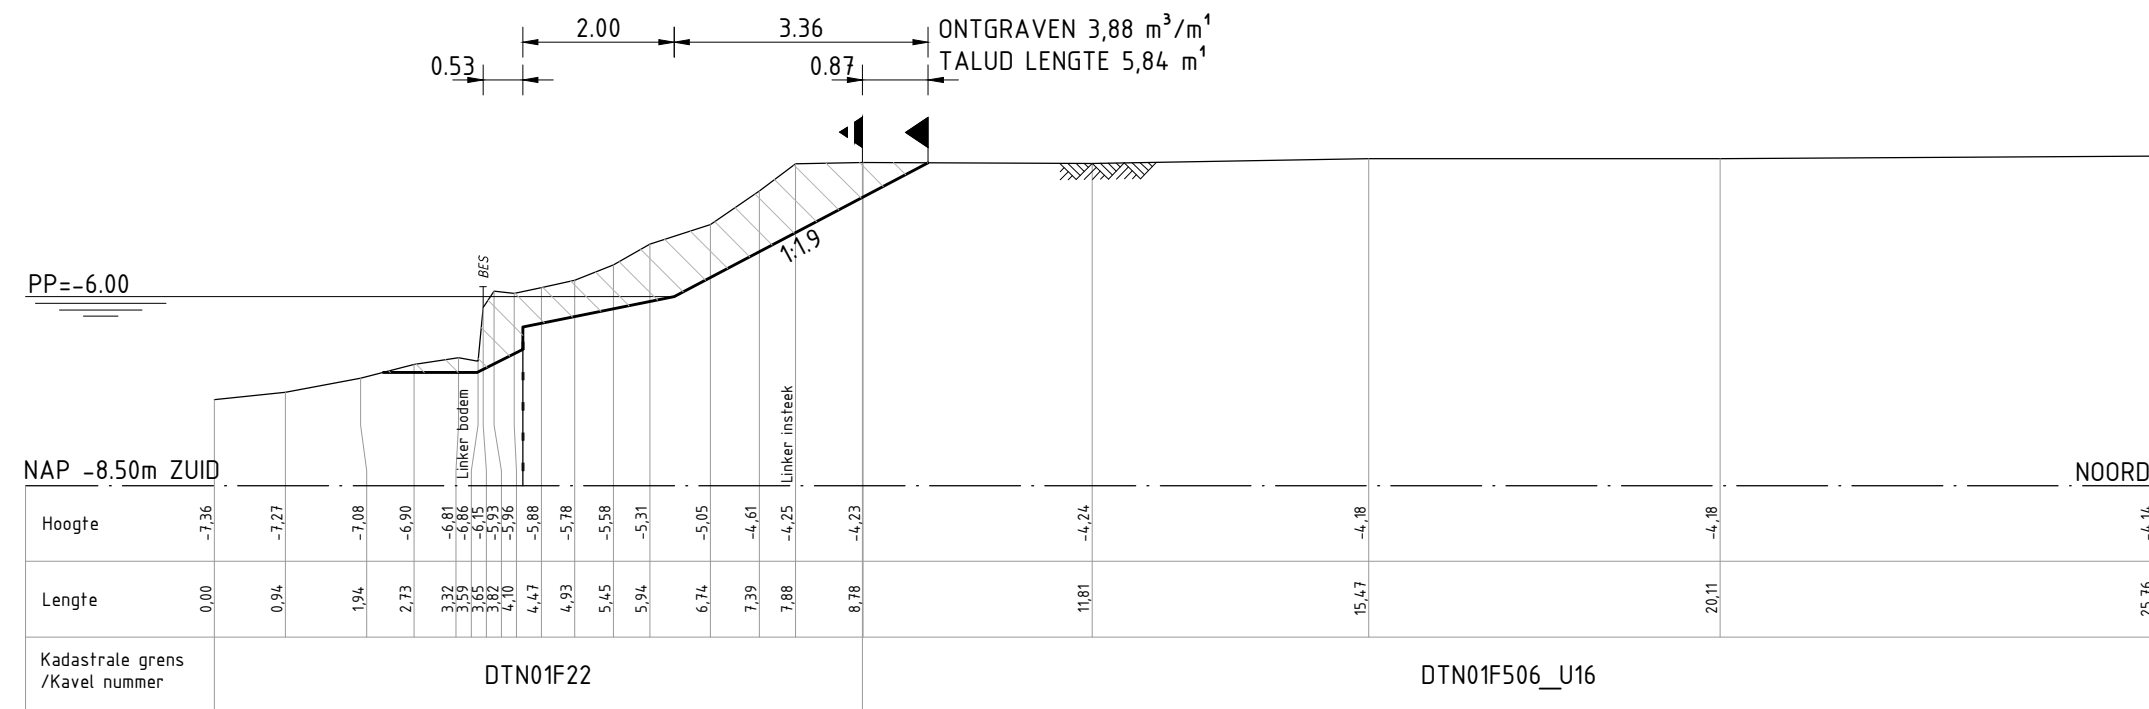

DWARSPROFIEL 8

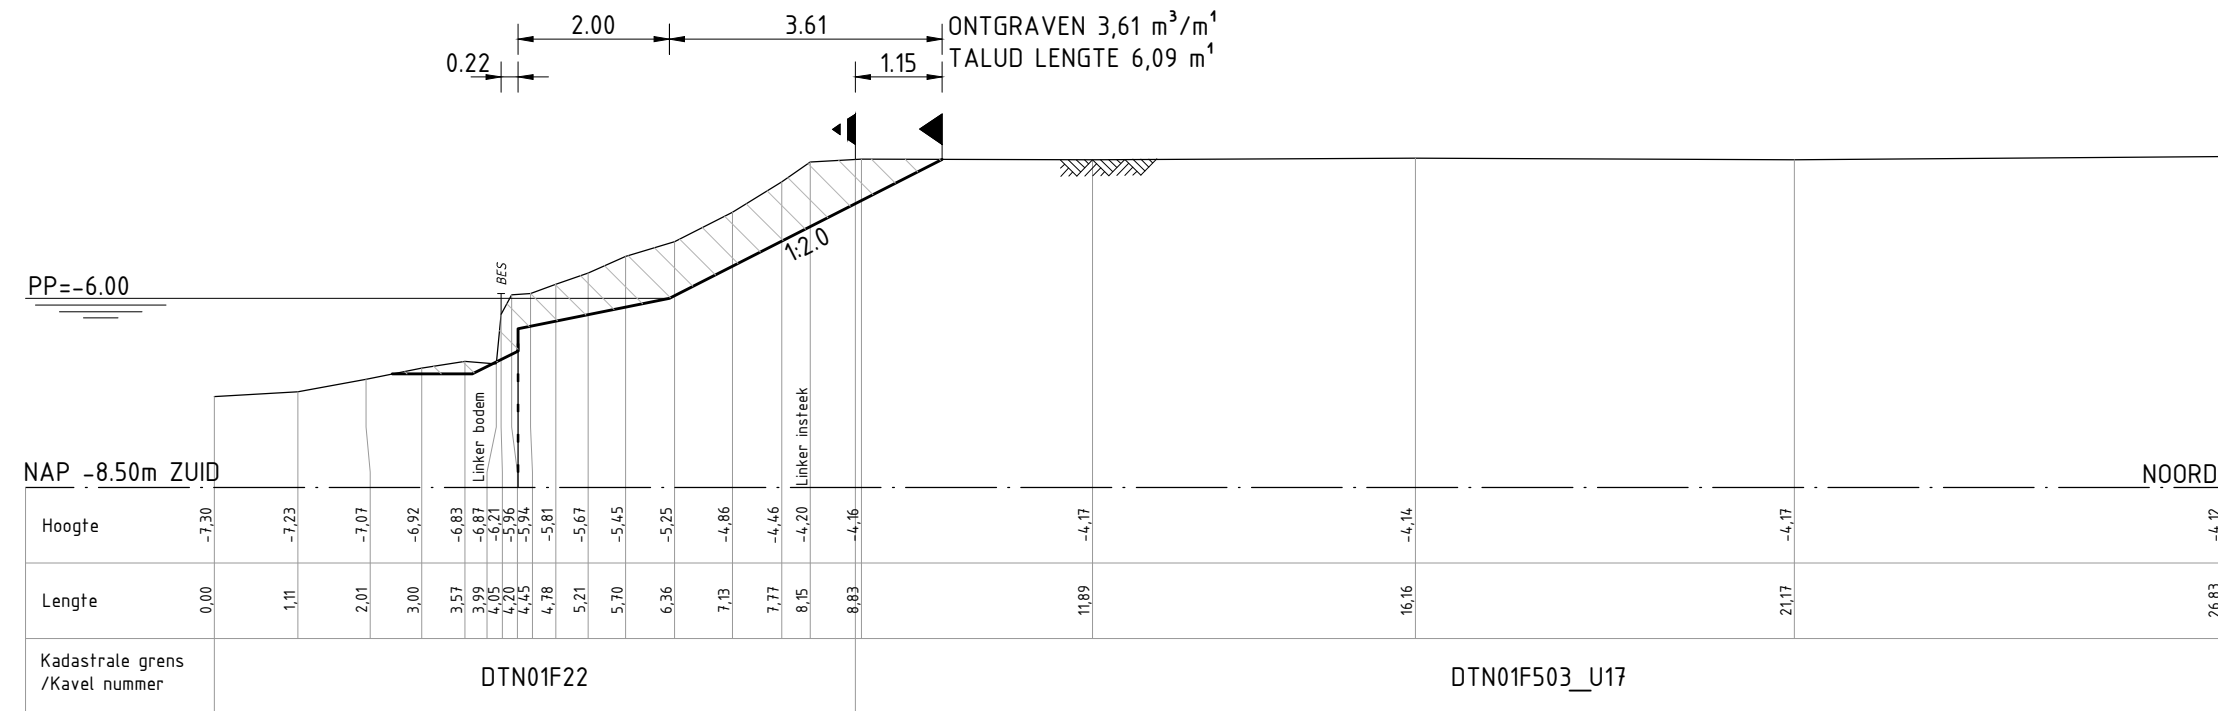


DWARSPROFIEL 9

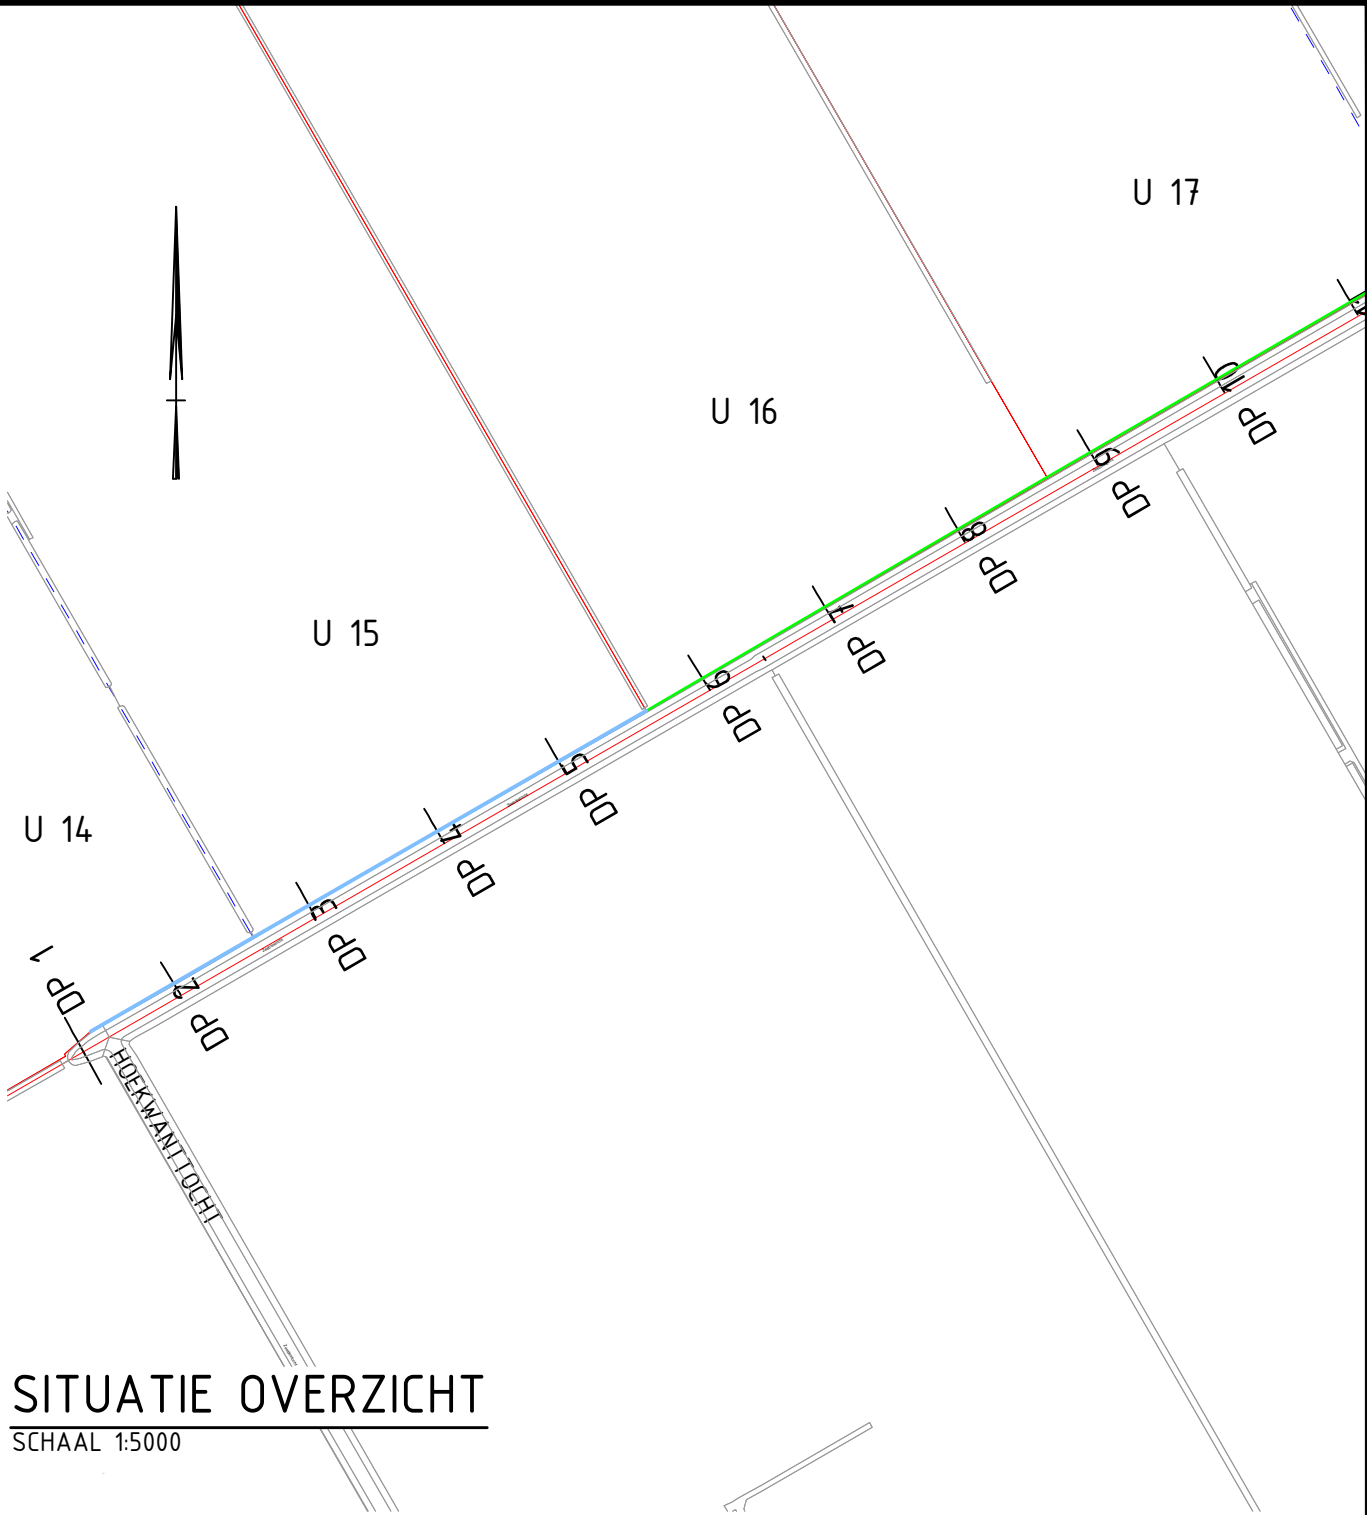

SITUATIE OVERZICHT

SCHAAL 1:5000

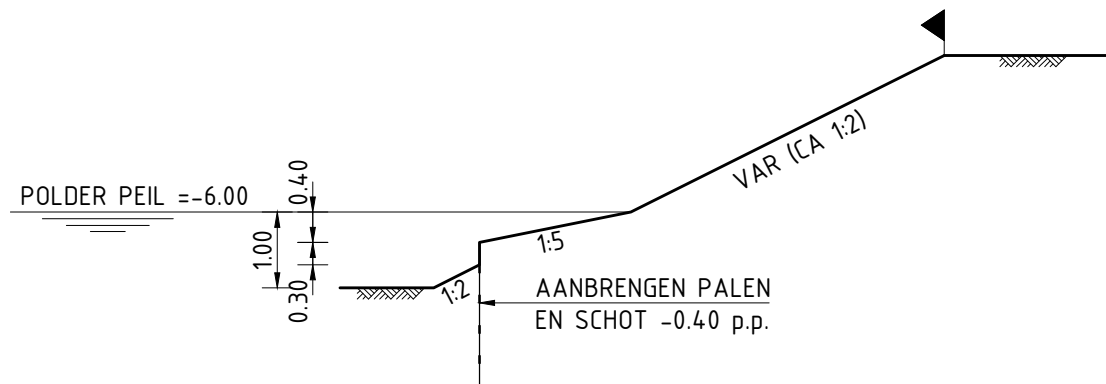


PRINCIPE DUURZAME OEVER

WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT ZUID				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSRENS/BEOOGDE EIGENDOMSRENS (GRONDAANKOUP)	KAVELBREEDTE (m)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01F246 - U14 (DEEL)	---	14.7 (dp1 - dp2)	1.46 (dp1 - dp2)	215
DTN01F246 - U15 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	3.28 (dp3 - dp5)	985
DTN01F506 - U16	175	306 (dp6 - dp8)	3.73 (dp6 - dp8)	1142
DTN01F503 - U17 (DEEL)	343	294 (dp9 - dp11)	3.73 (dp9 - dp11)	1096
DTN01F503 - U18 (DEEL)	305	298 (dp12 - dp14)	3.66 (dp12 - dp14)	1091
DTN01F350 - U19	260	300 (dp15 - dp17)	3.92 (dp15 - dp17)	1175
DTN01F427 - U20	415	301 (dp18 - dp20)	4.08 (dp18 - dp20)	1229
DTN01F16 - U21 (DEEL)	531	302 (dp21 - dp23)	3.96 (dp21 - dp23)	1196
DTN01F16 - U22 (DEEL)	472	277 (dp24 - dp26)	4.19 (dp24 - dp26)	1160
		2525		9289


VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- BEOOGDE INSTEK (SITUATIE)
- BEOOGDE NIEUWE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- 041 KAVEL NUMMER (SITUATIE)
- ONTGRAVEN (PROFIELEN)
- p.p. POLDER PEIL (PROFIELEN)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BEOOGDE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BEOOGDE INSTEK (PROFIELEN)
- BESTAADE BESCHOEIING (PROFIELEN)
- NIEUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)


MATEN IN METERS. HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P. HOEKEN IN 360° STELSEL. COORDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.				
A	-	-	-	-
0	12-01-2021	qwe	-	-
Code:	Datum	Geleend door:	Controle door:	Toezicht door:
WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND			LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911	
Project:			Adviseur/aannemer:	
Omschrijving:			Duurzame oevers	
Besteknummer:			ZEEBIESTOCHT ZUID KAVELS U14, U15, U16, U17 PROFIELEN 1 t/m 9	
Tekeningsnummer:			P-WG205-CI-003	
Status:			Definitief	
Fase:			Projectplan procedure	
Schaal:			1:100	
Formaat:			A1	
Wijz:			0	
Blad:			2	
Aantal:			4	

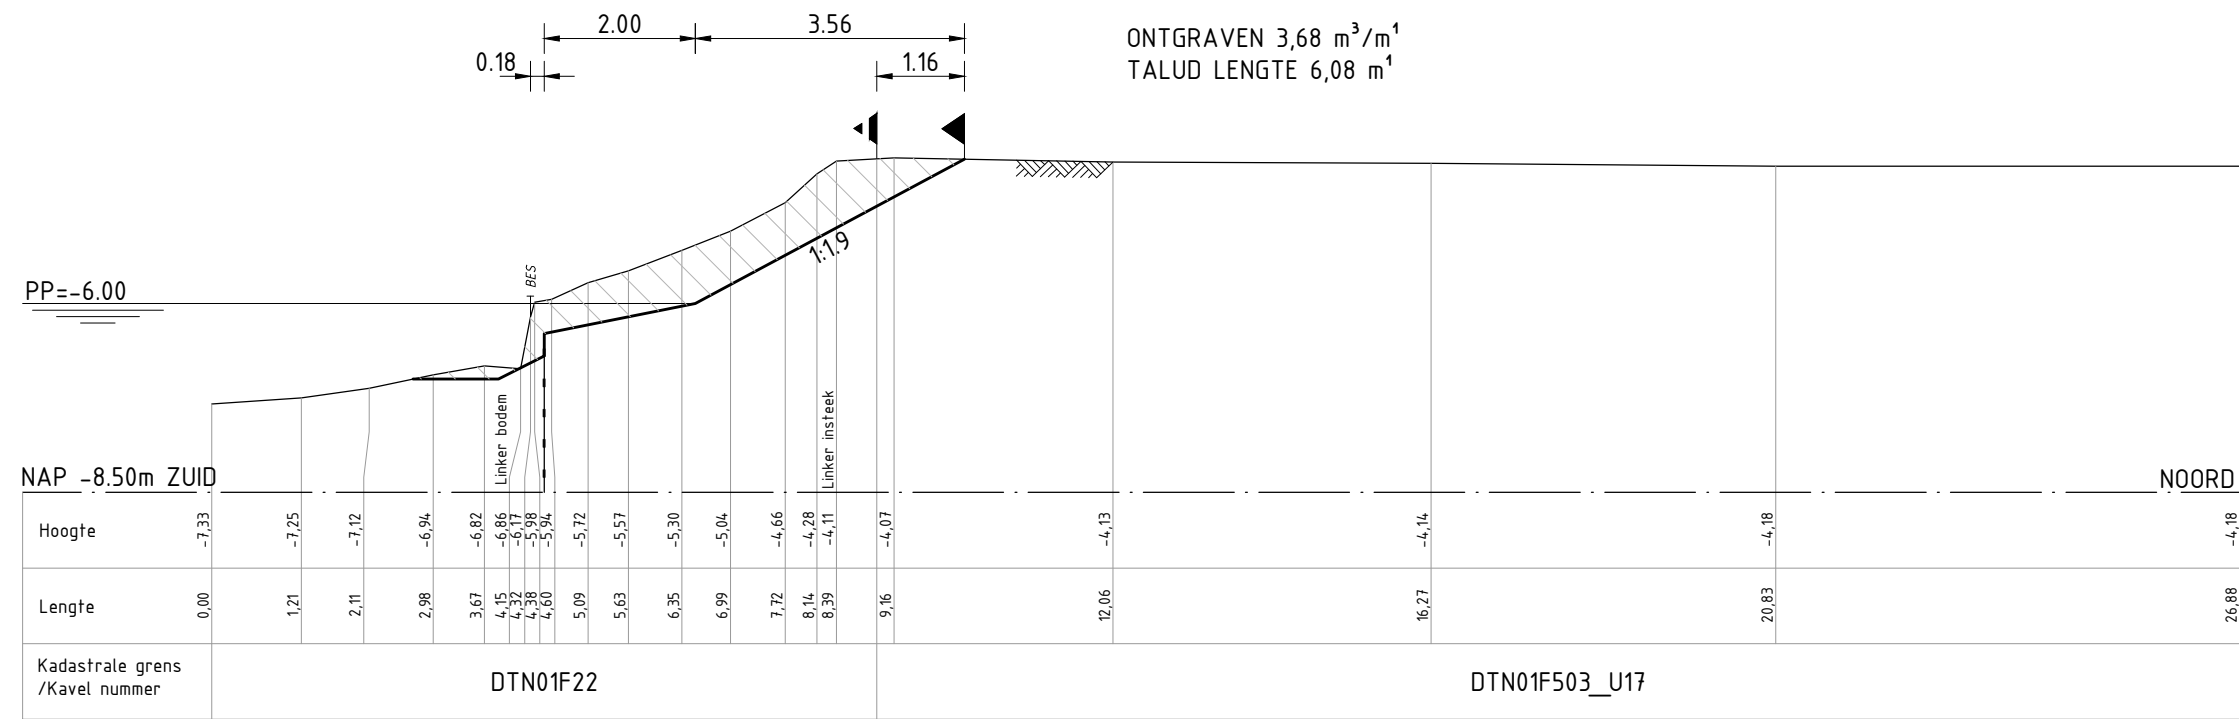


DWARSPROFIEL 10

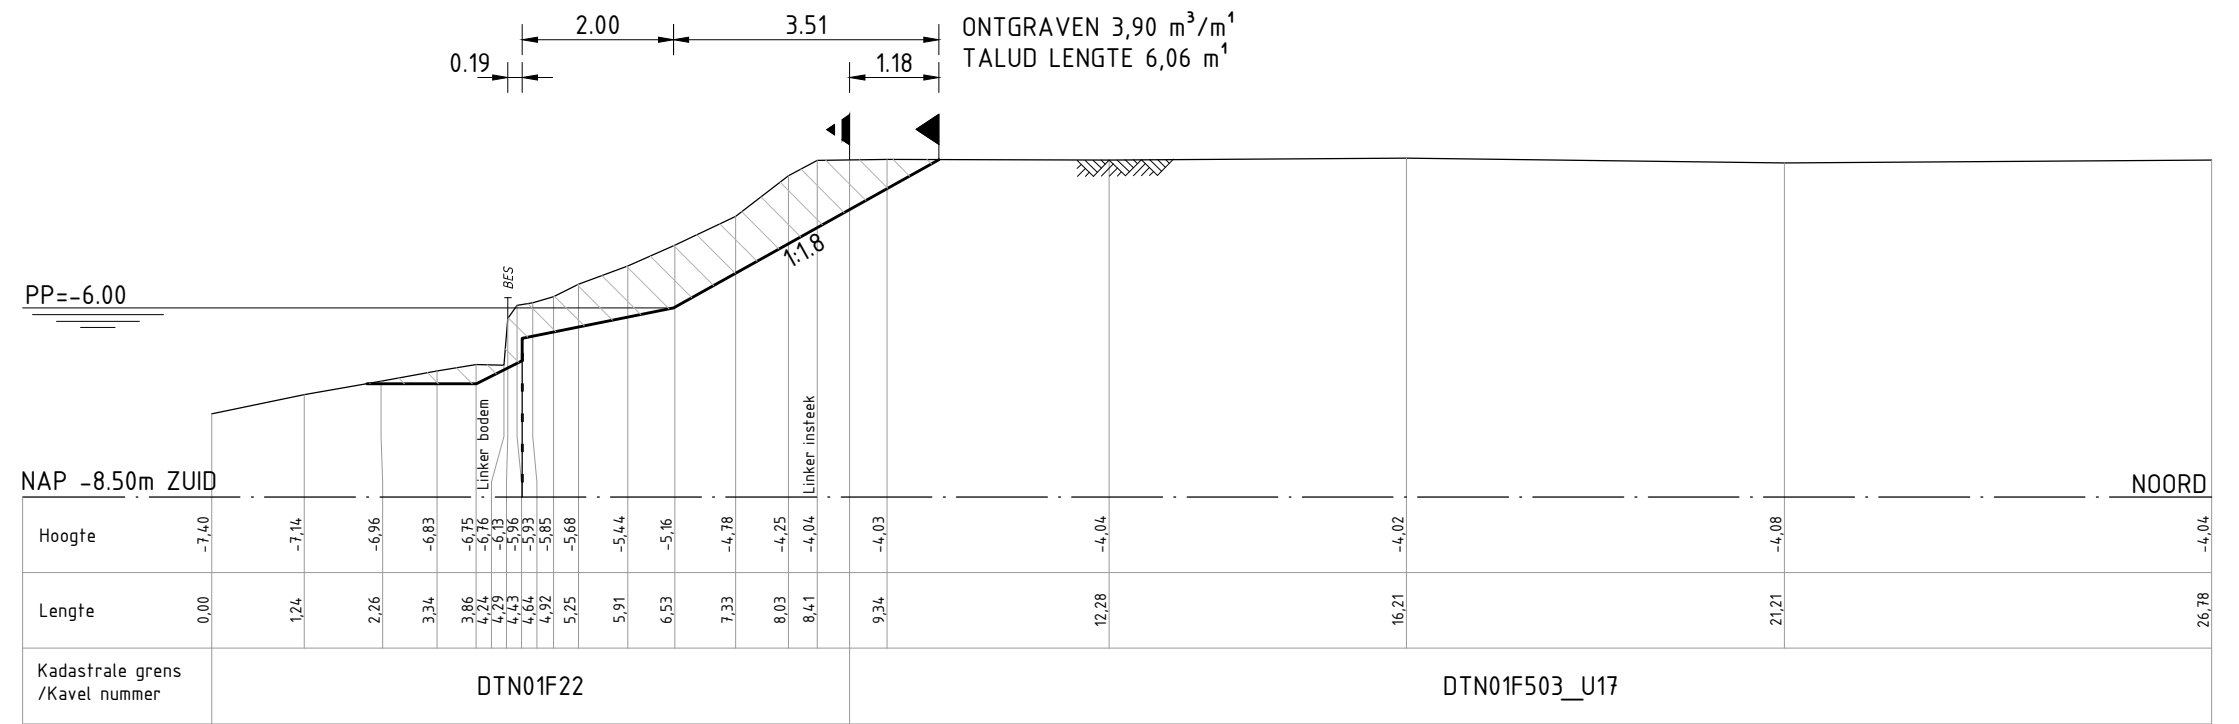


DWARSPROFIEL 11

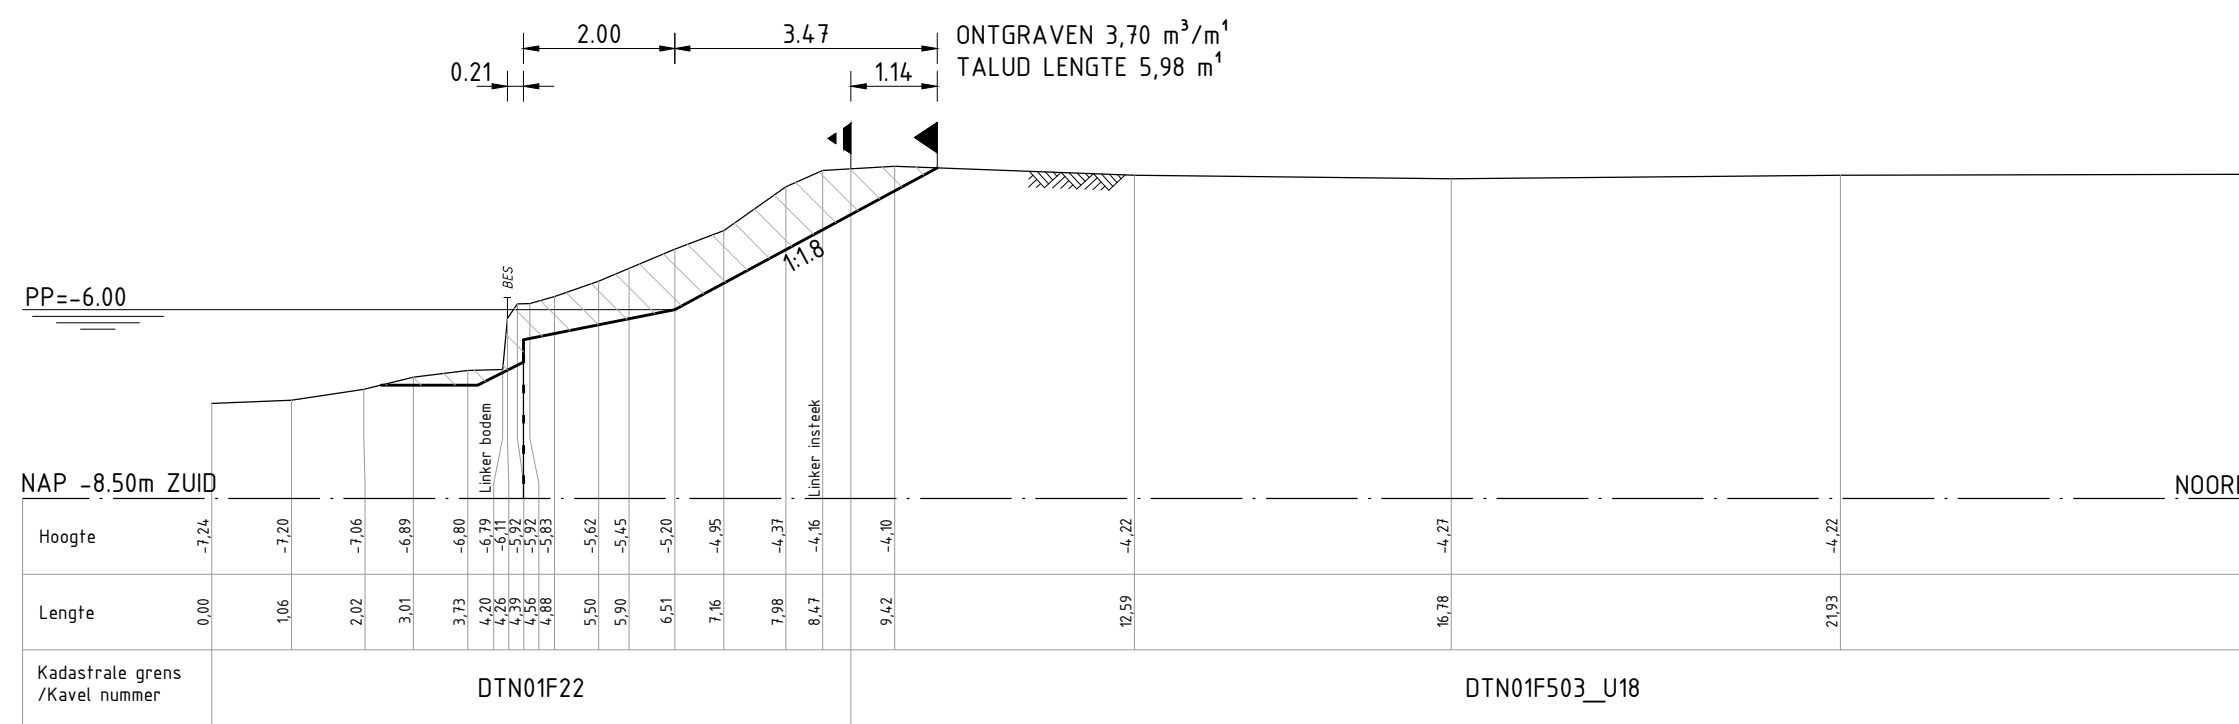


DWARSPROFIEL 12

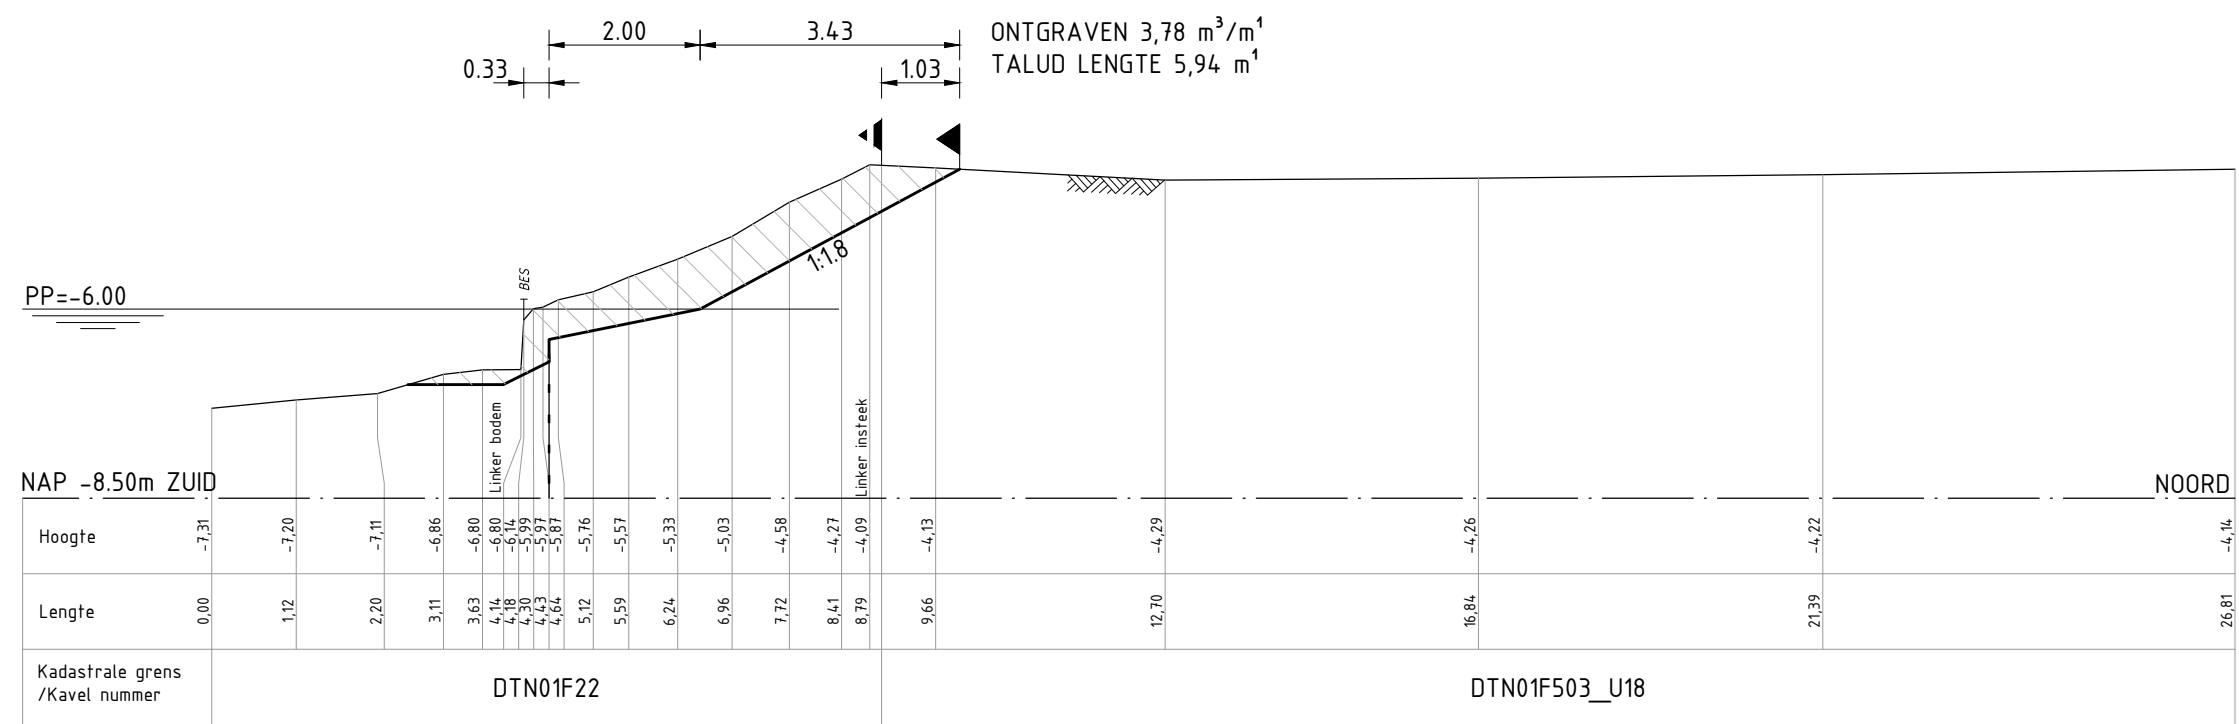


DWARSPROFIEL 13

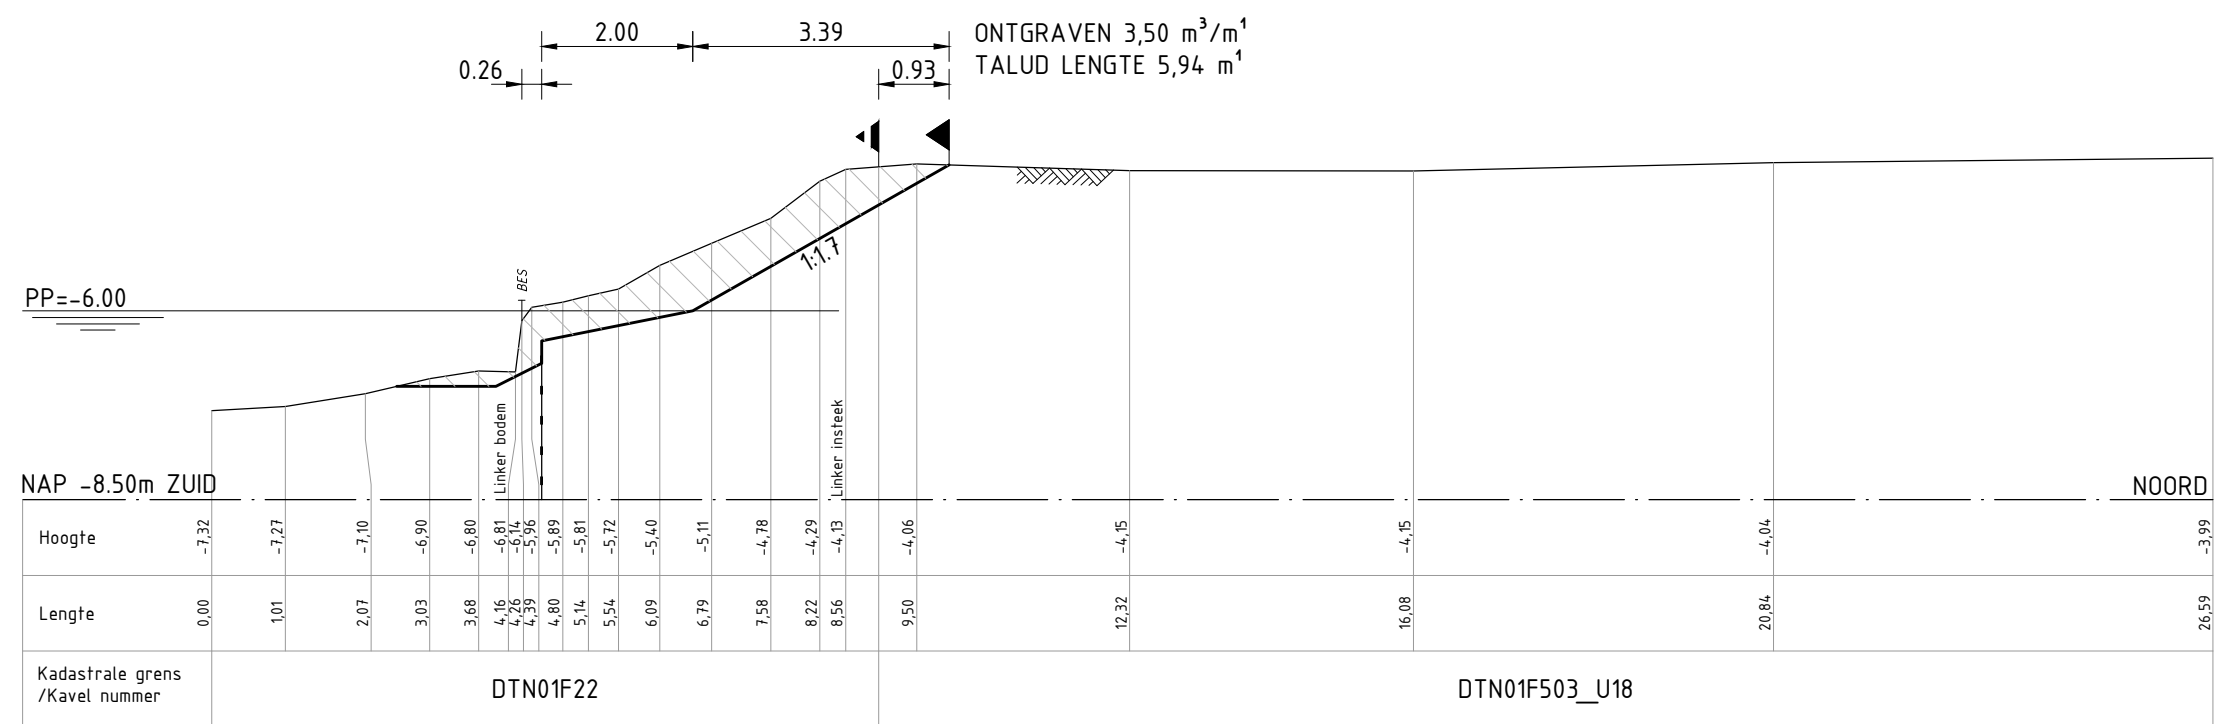


DWARSPROFIEL 14

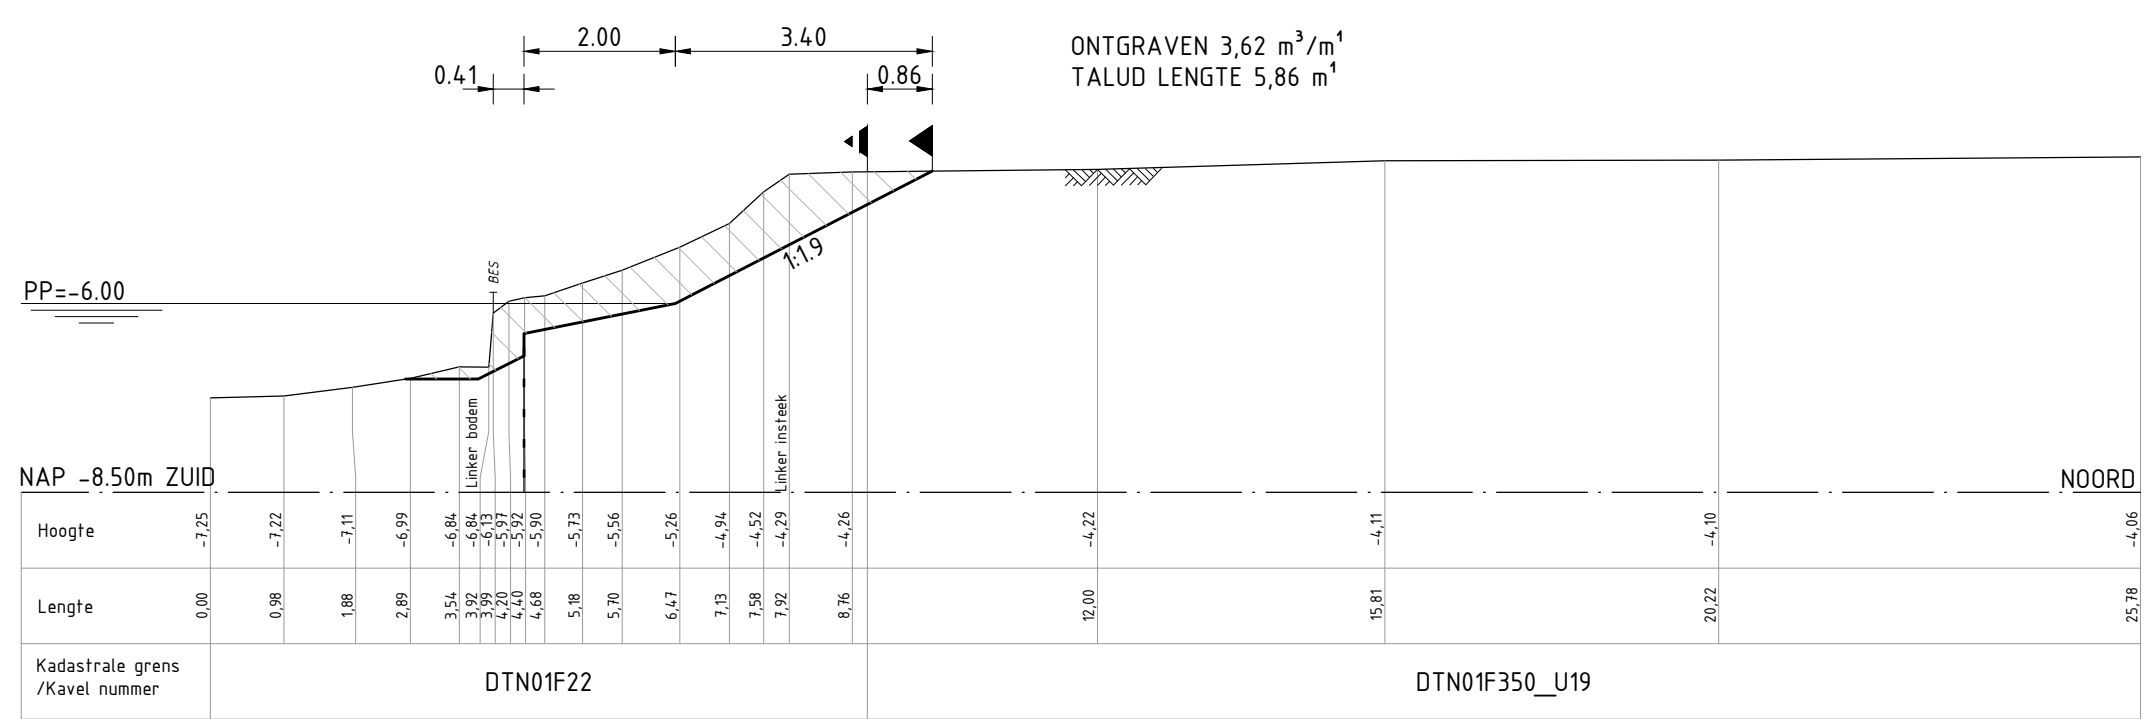


DWARSPROFIEL 15

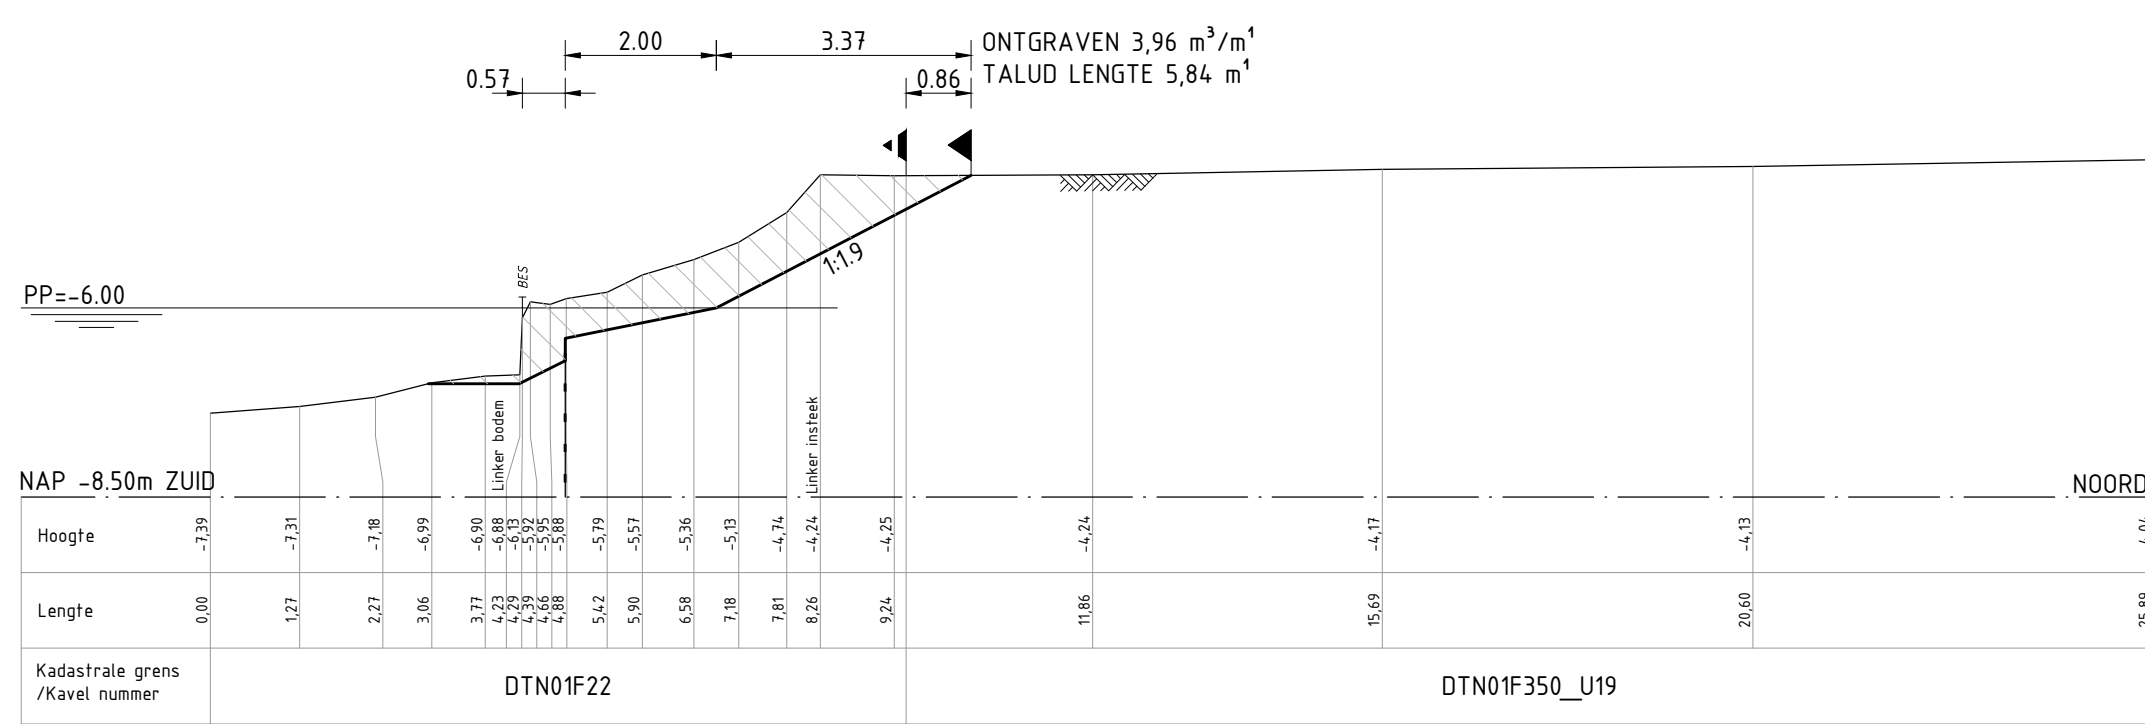


DWARSPROFIEL 16

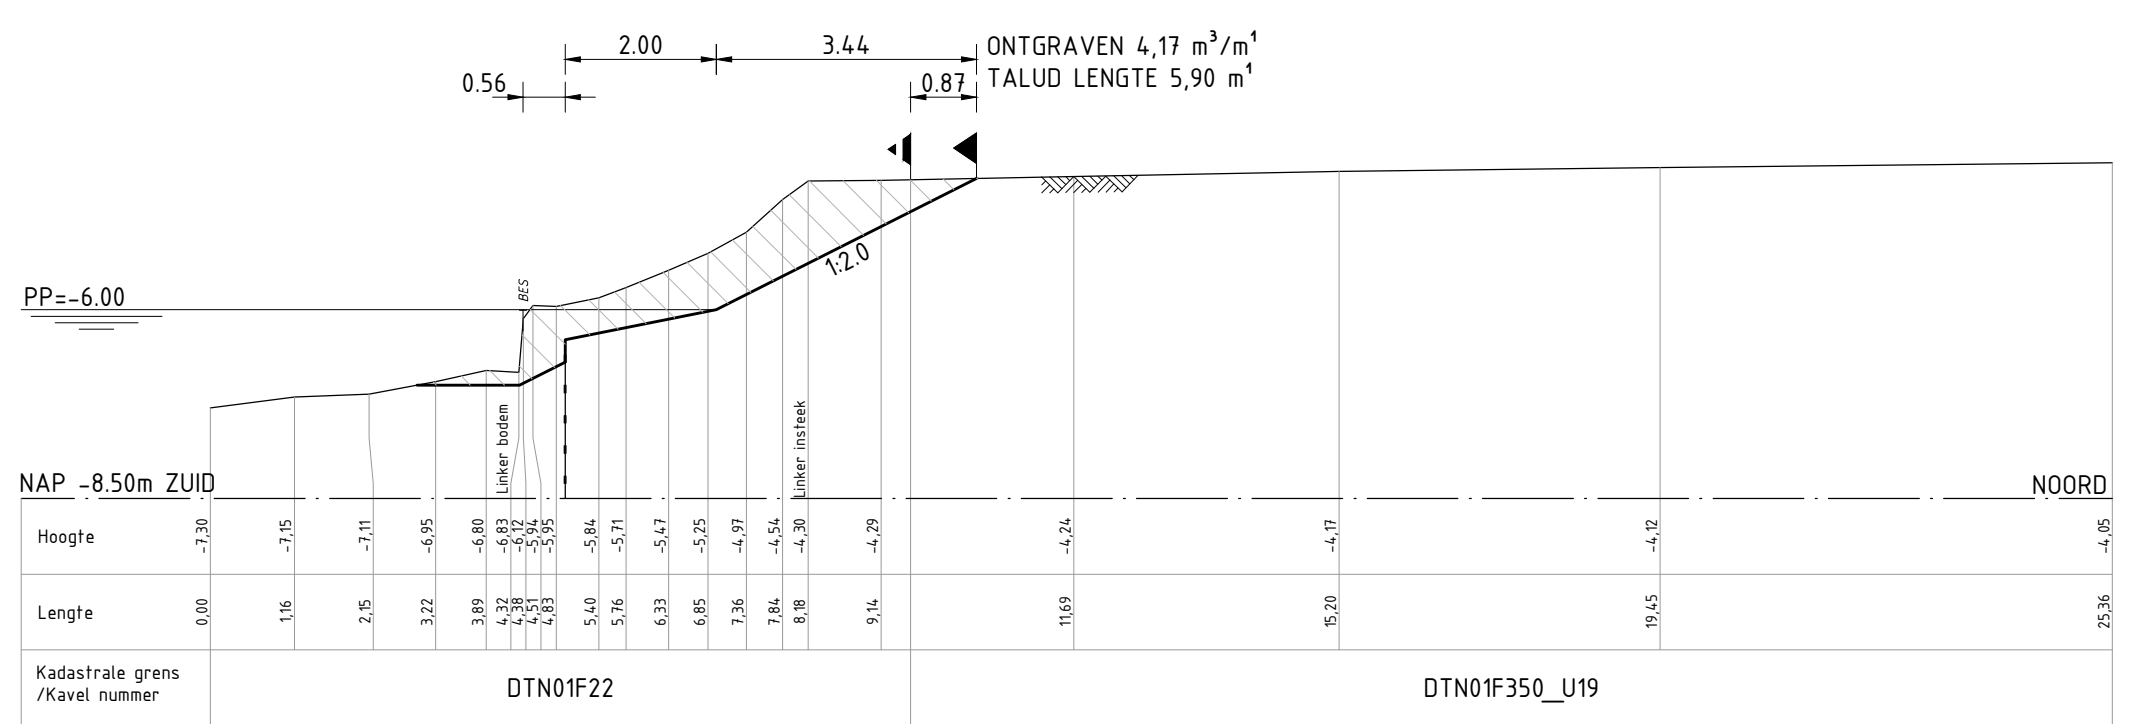



DWARSPROFIEL 17

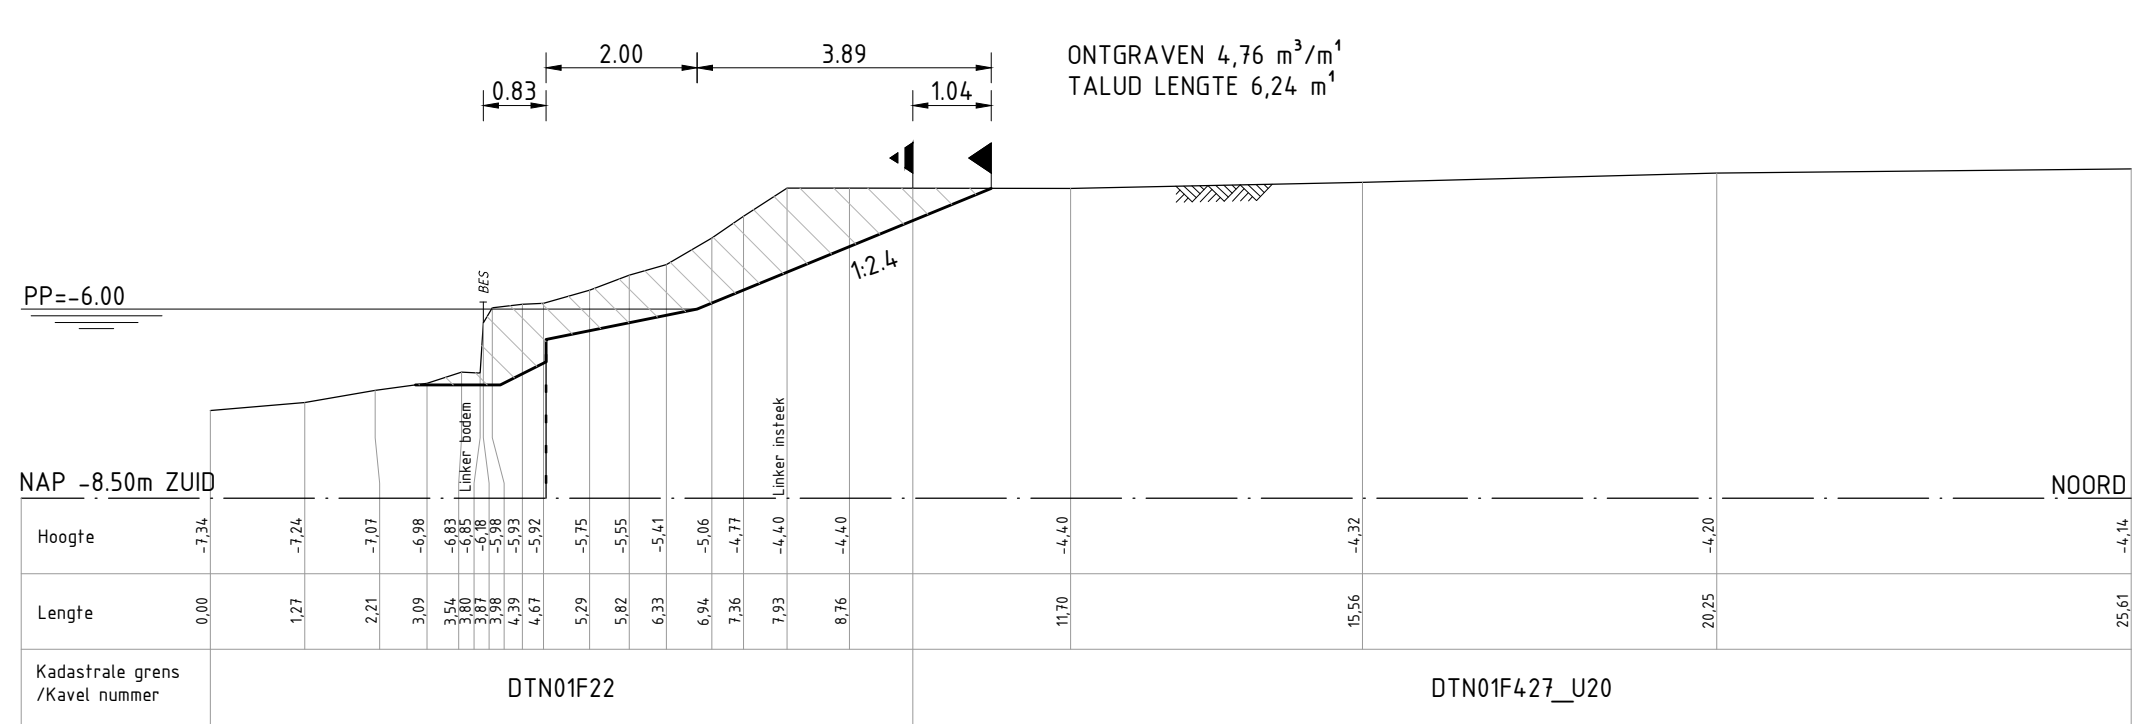

DWARSPROFIEL 18

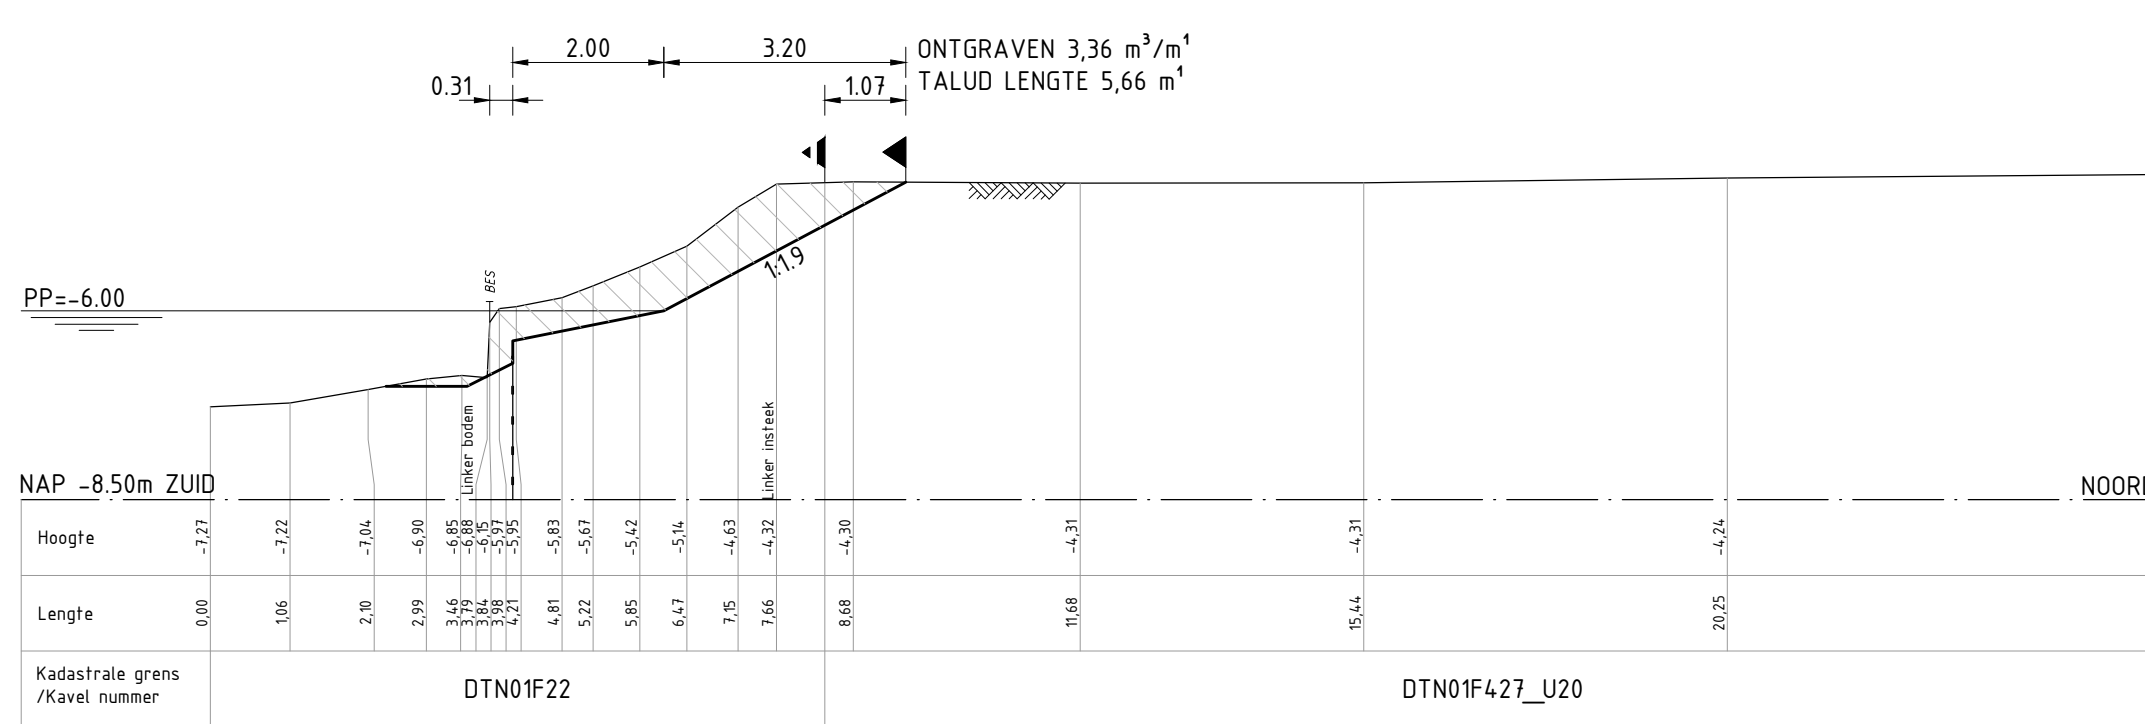

DWARSPROFIEL 19

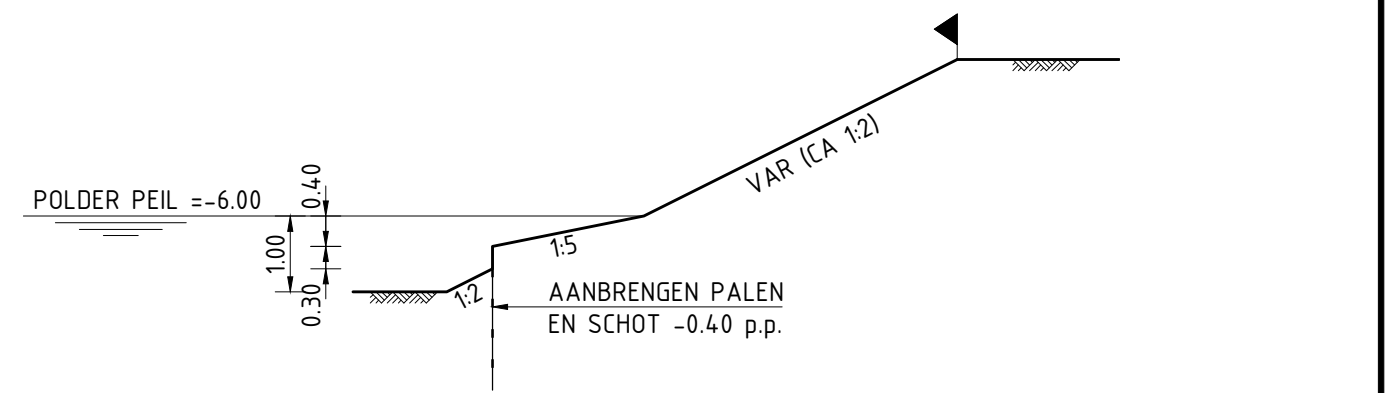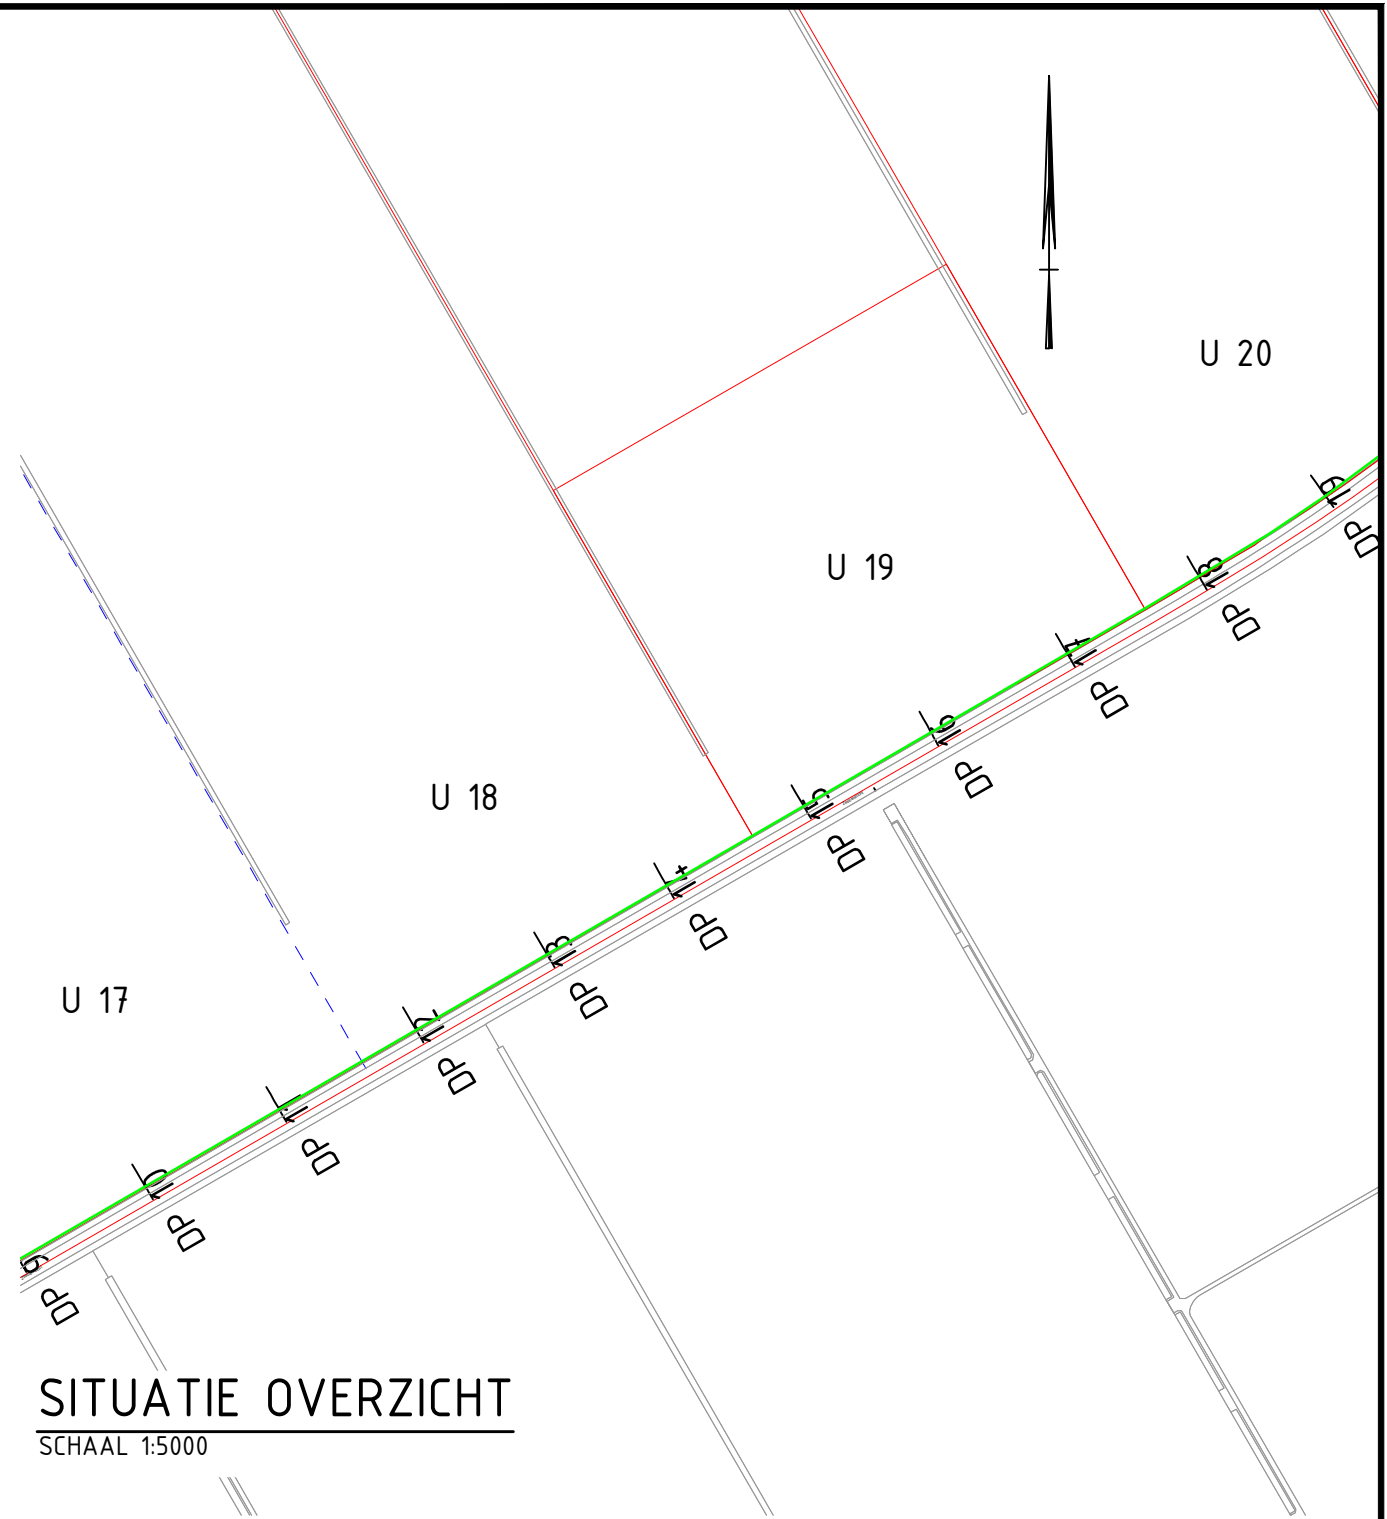


PRINCIPE DUURZAME OEVER

WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT ZUID				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSGRENS/BEOOGDE EIGENDOMSGRENS (GRONDAANKOOP)	KAVELBREEDTE (m¹)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m¹)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01F246 - U14 (DEEL)	---	14,7 (dp1 - dp2)	1,46 (dp1 - dp2)	215
DTN01F246 - U15 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	3,28 (dp3 - dp5)	985
DTN01F506 - U16	175	306 (dp6 - dp8)	3,73 (dp6 - dp8)	1142
DTN01F503 - U17 (DEEL)	343	294 (dp9 - dp11)	3,73 (dp9 - dp11)	1096
DTN01F503 - U18 (DEEL)	305	298 (dp12 - dp14)	3,66 (dp12 - dp14)	1091
DTN01F350 - U19	260	300 (dp15 - dp17)	3,92 (dp15 - dp17)	1175
DTN01F427 - U20	415	301 (dp18 - dp20)	4,08 (dp18 - dp20)	1229
DTN01F16 - U21 (DEEL)	531	302 (dp21 - dp23)	3,96 (dp21 - dp23)	1196
DTN01F16 - U22 (DEEL)	472	277 (dp24 - dp26)	4,19 (dp24 - dp26)	1160
		2525		9289


VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- BEOOGDE INSTEK (SITUATIE)
- BEOOGDE NIEUWE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- 041 KAVEL NUMMER (SITUATIE)
- ONTGRAVEN (PROFIELEN)
- p.p. POLDER PEIL (PROFIELEN)
- ▶ HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- ▶ BEOOGDE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- ▶ BEOOGDE INSTEK (PROFIELEN)
- ▶ BESTAANDE BESCHOEIING (PROFIELEN)
- ▶ NIEUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)


MATEN IN METERS. HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P. HOEKEN IN 360° STELSEL. COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.				
A	-	-	-	-
0	12-01-2021	qwe	-	-
Code:	Datum:	Geleend door:	Controle door:	Toezicht door:
Omschrijving:			Omschrijving:	
 WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND			LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911	
Adviseur/aannemer:				
Project: Duurzame oevers				
Omschrijving: ZEEBIESTOCHT ZUID KAVELS U17, U18, U19, U20 PROFIELEN 10 t/m 19			Status: Definitief	
Besteknummer: -			Fase: Projectplan procedure	
Tekeningsnummer: P-WG205-CI-003			Schaal: 1:100	Formaat: A1 Wjz: 0
			Blad: 3	Aantal: 4

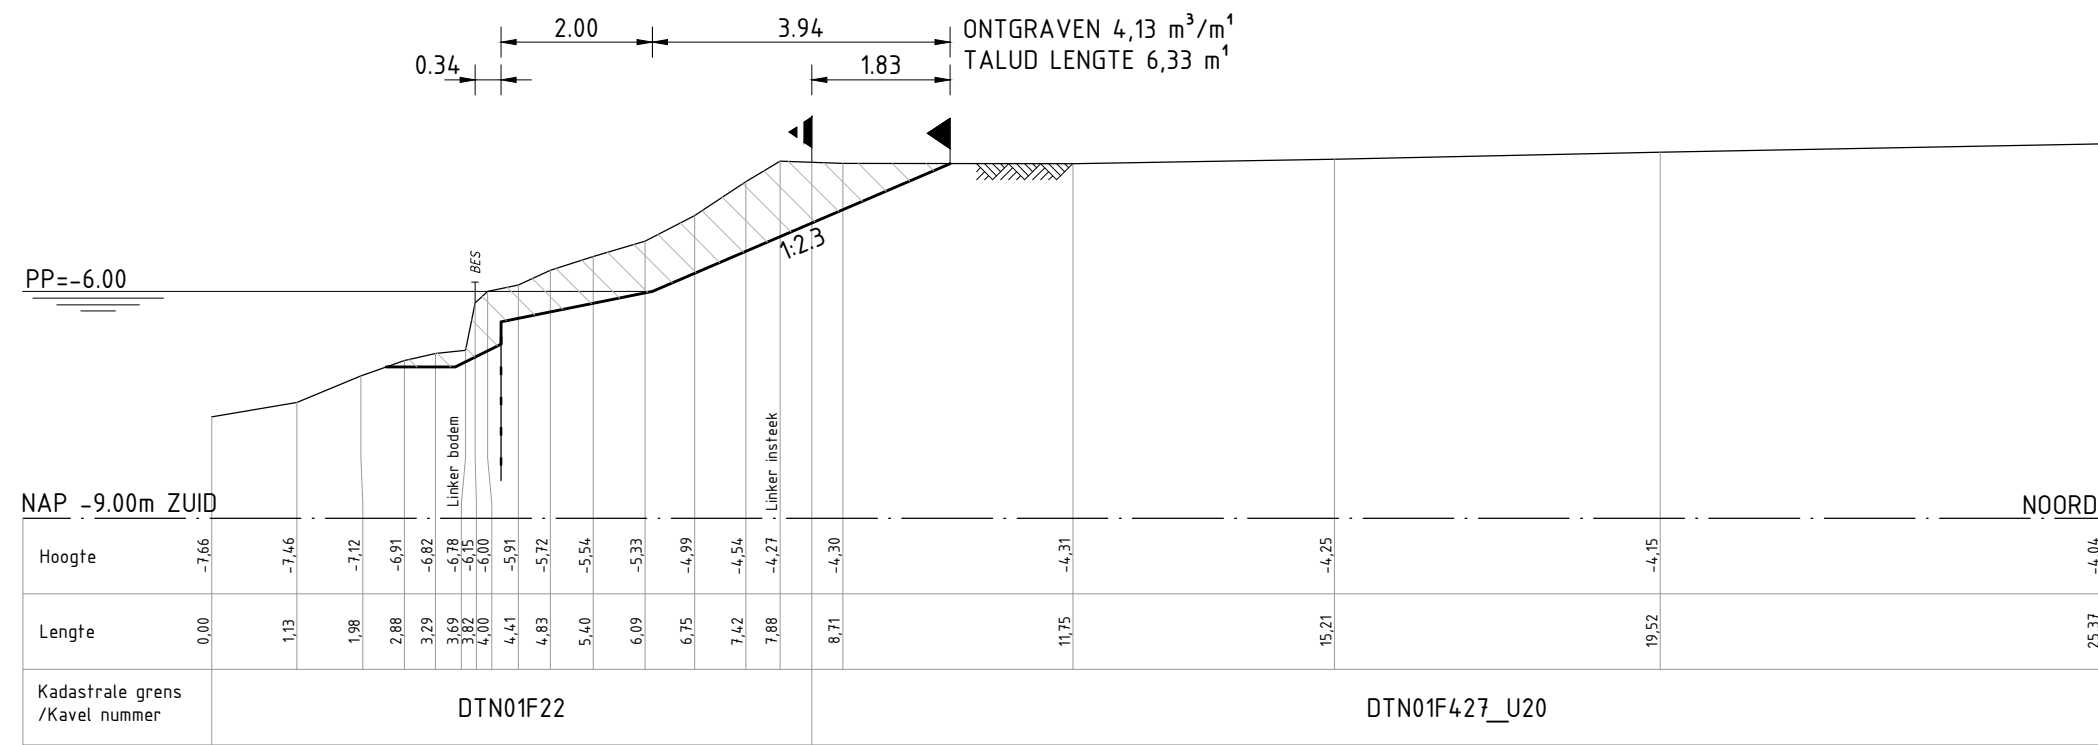


DWARSPROFIEL 20

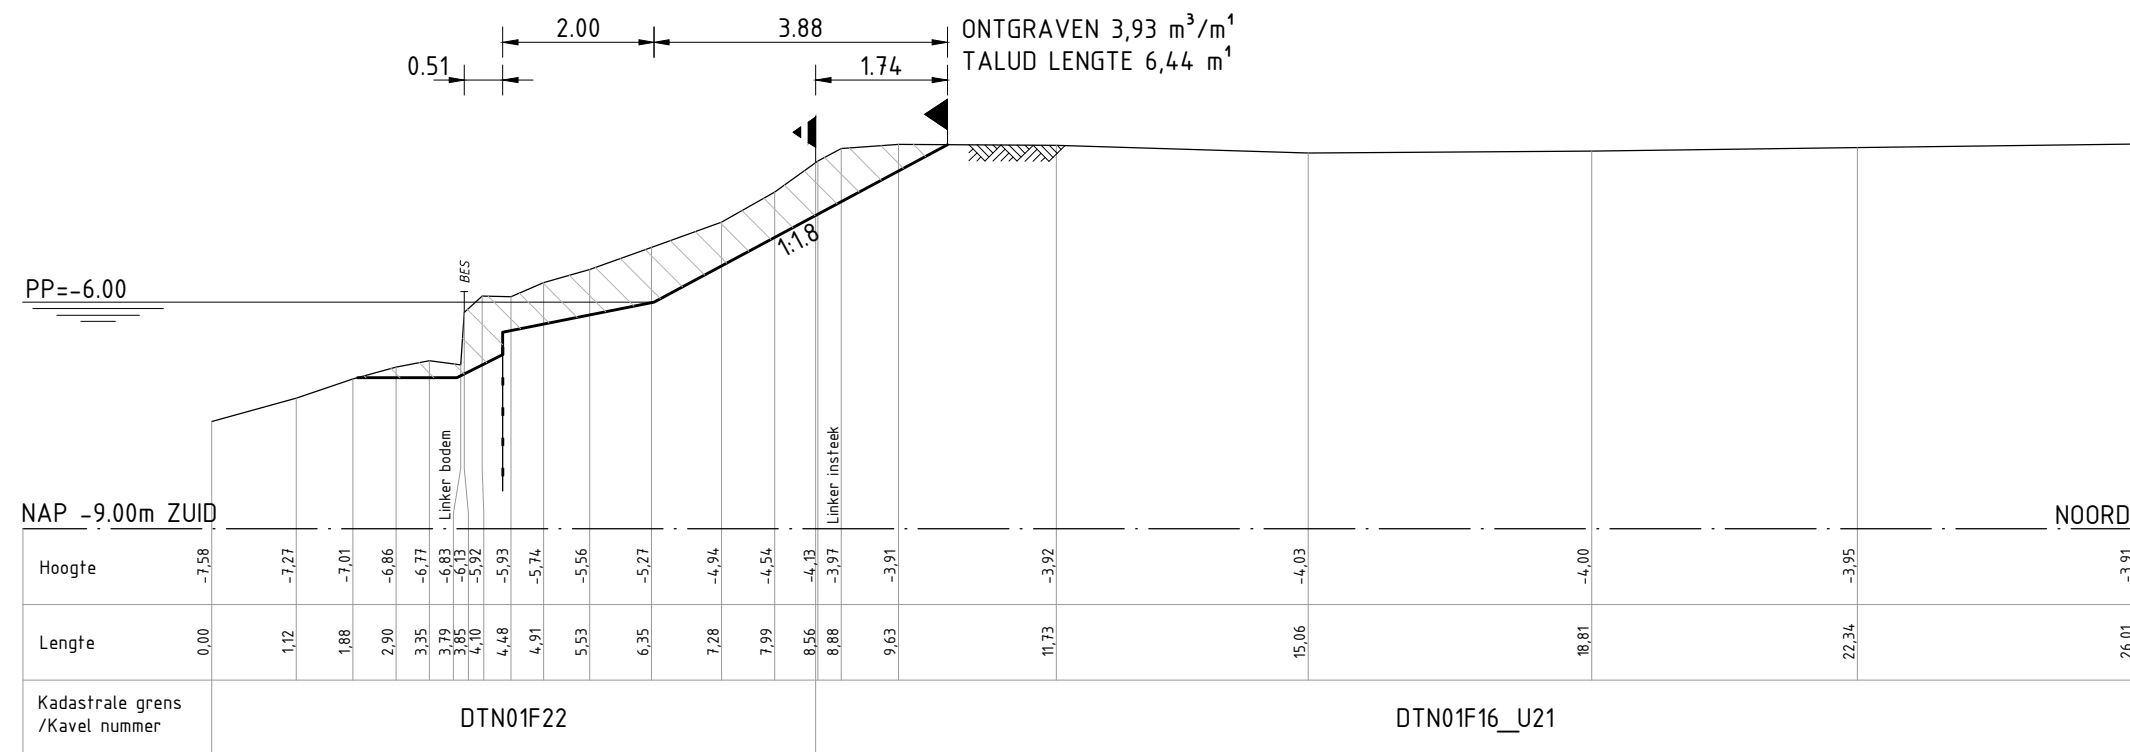


DWARSPROFIEL 21

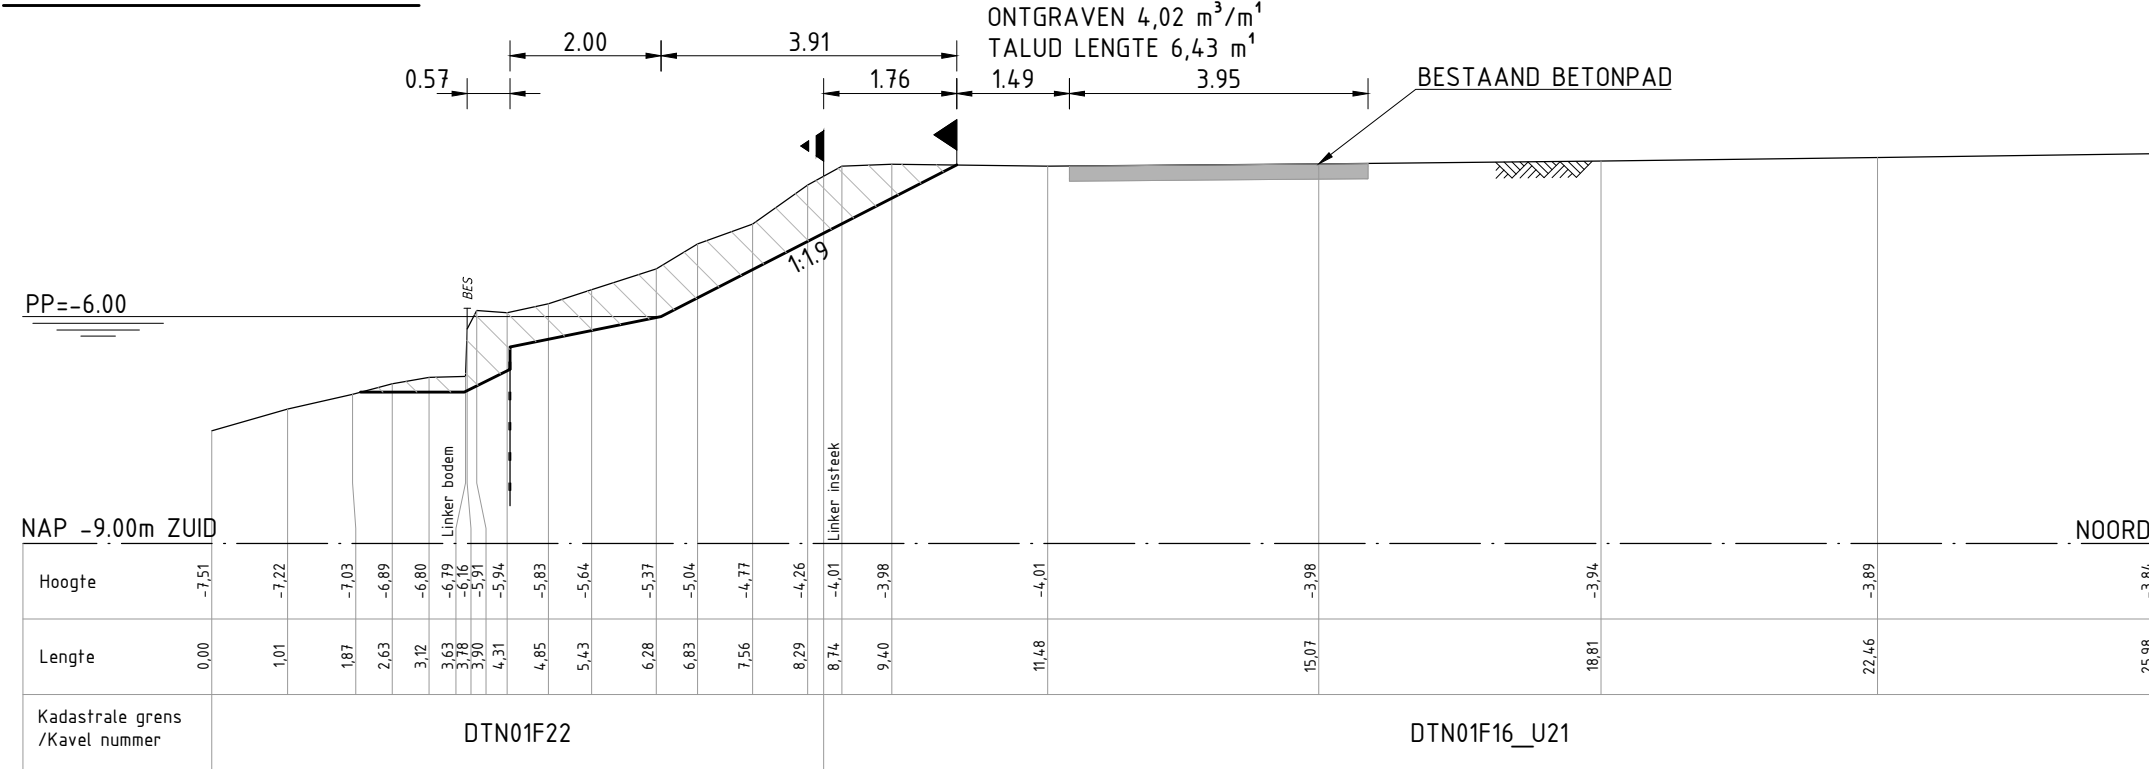


DWARSPROFIEL 22

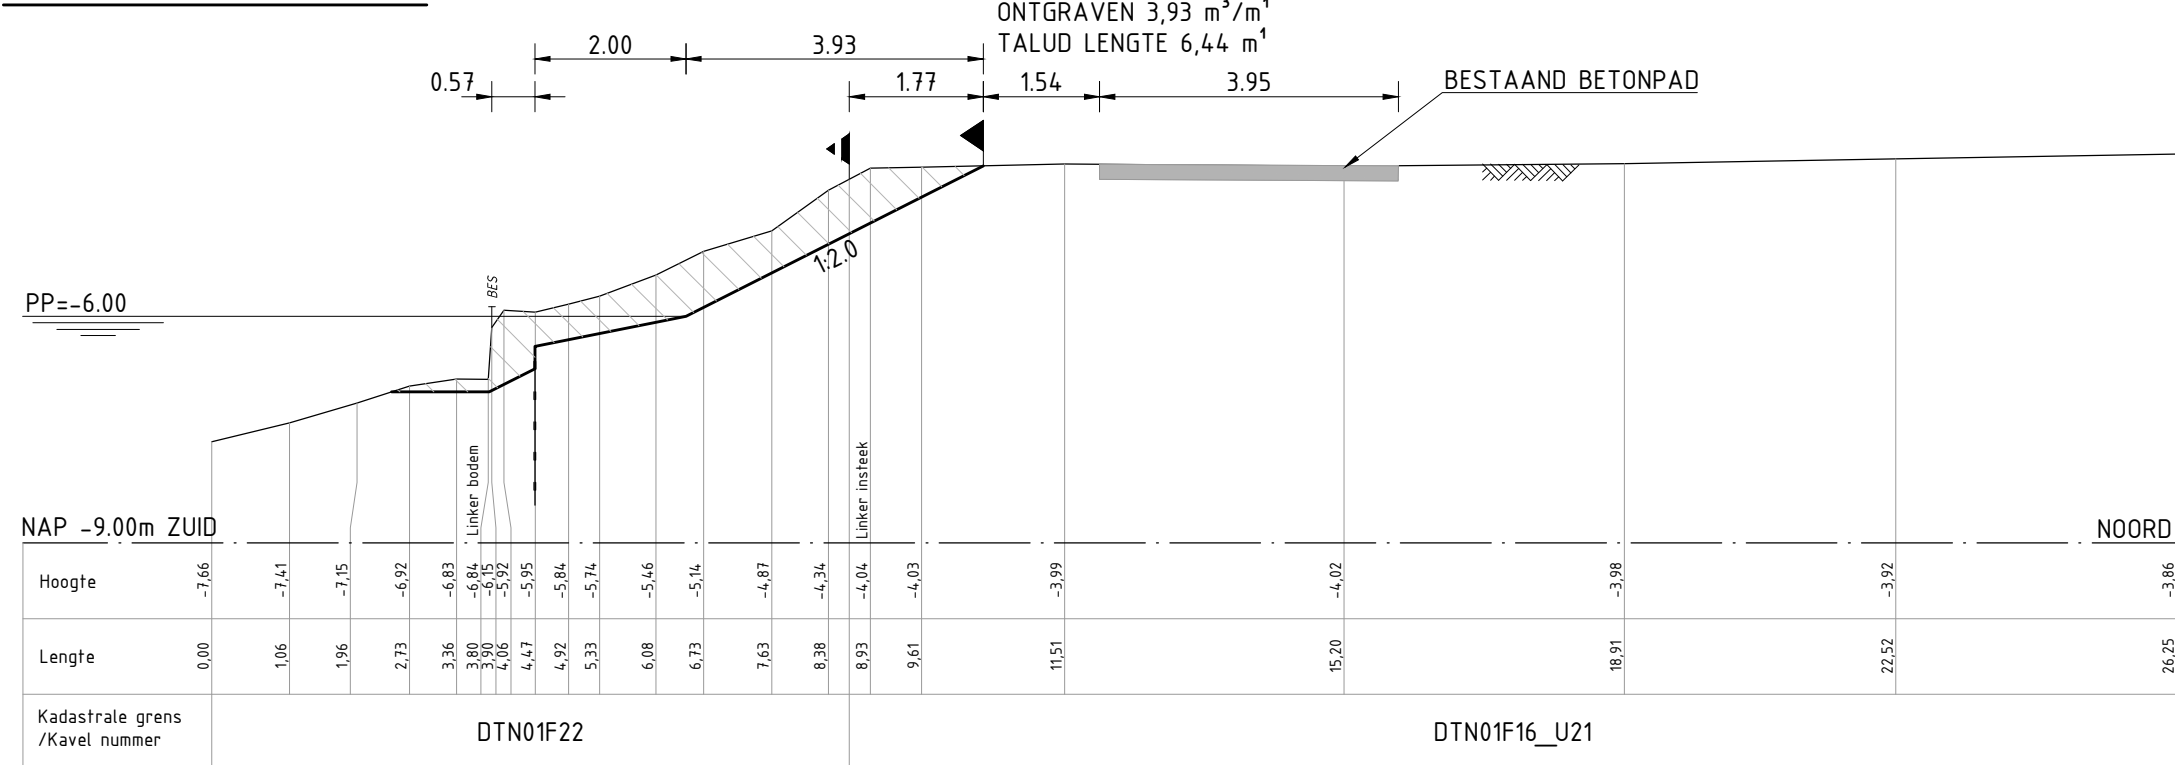


DWARSPROFIEL 23

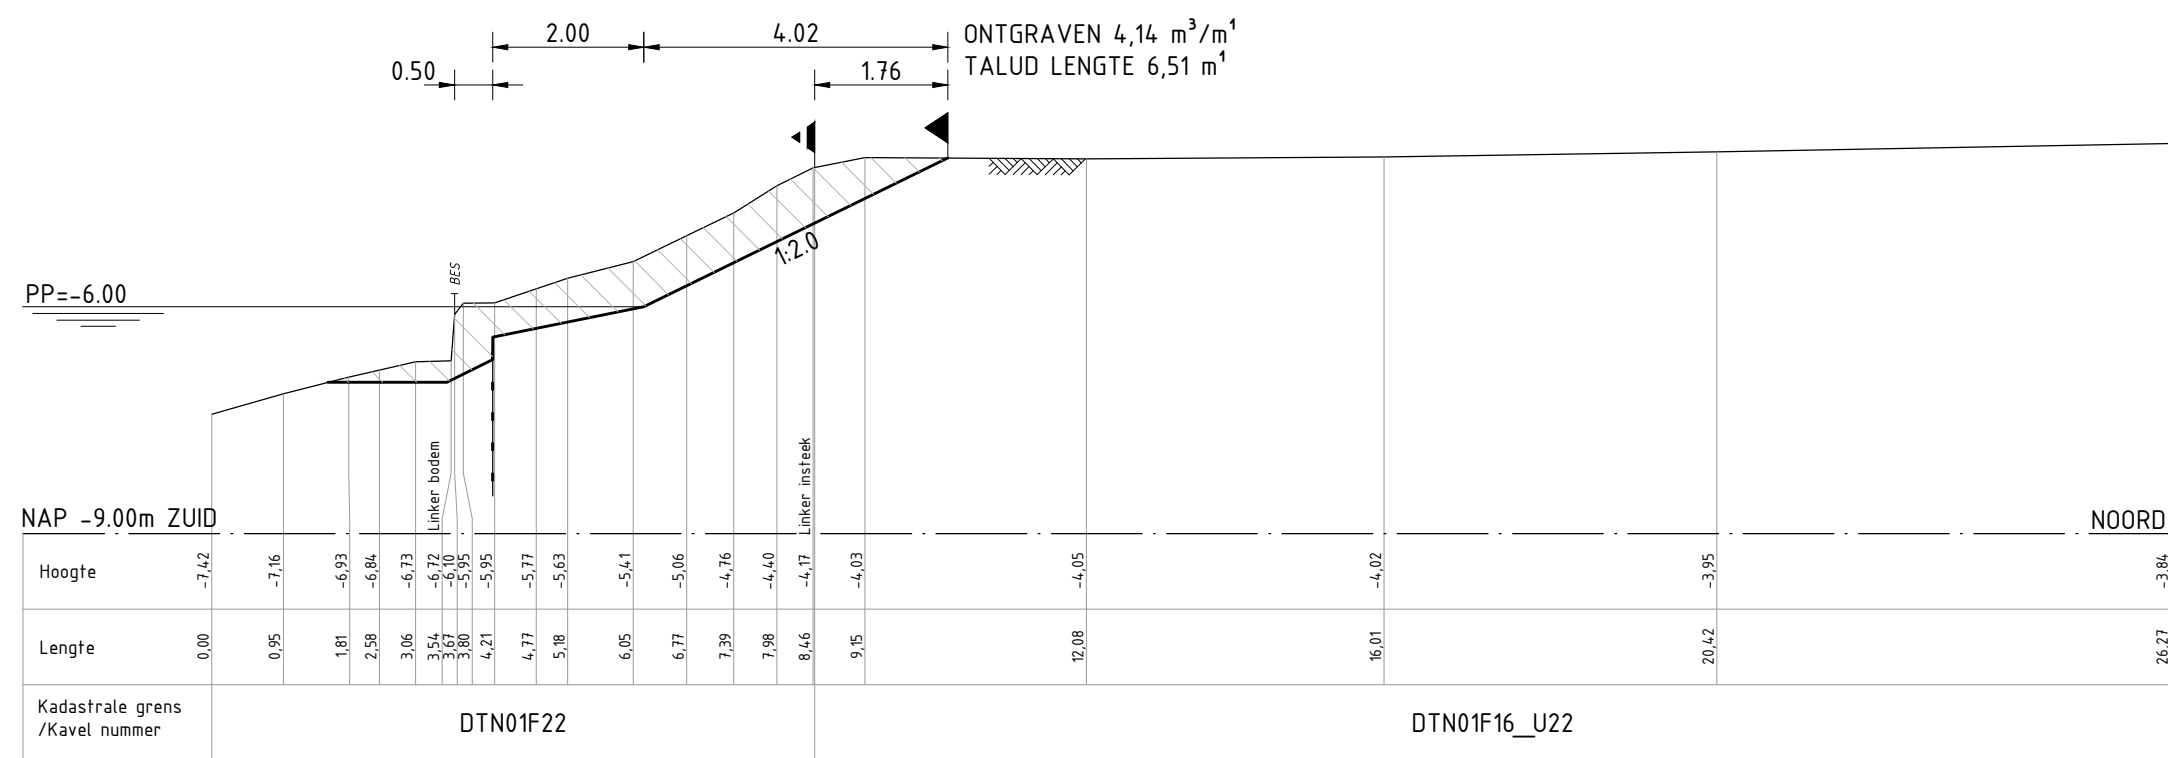



DWARSPROFIEL 24

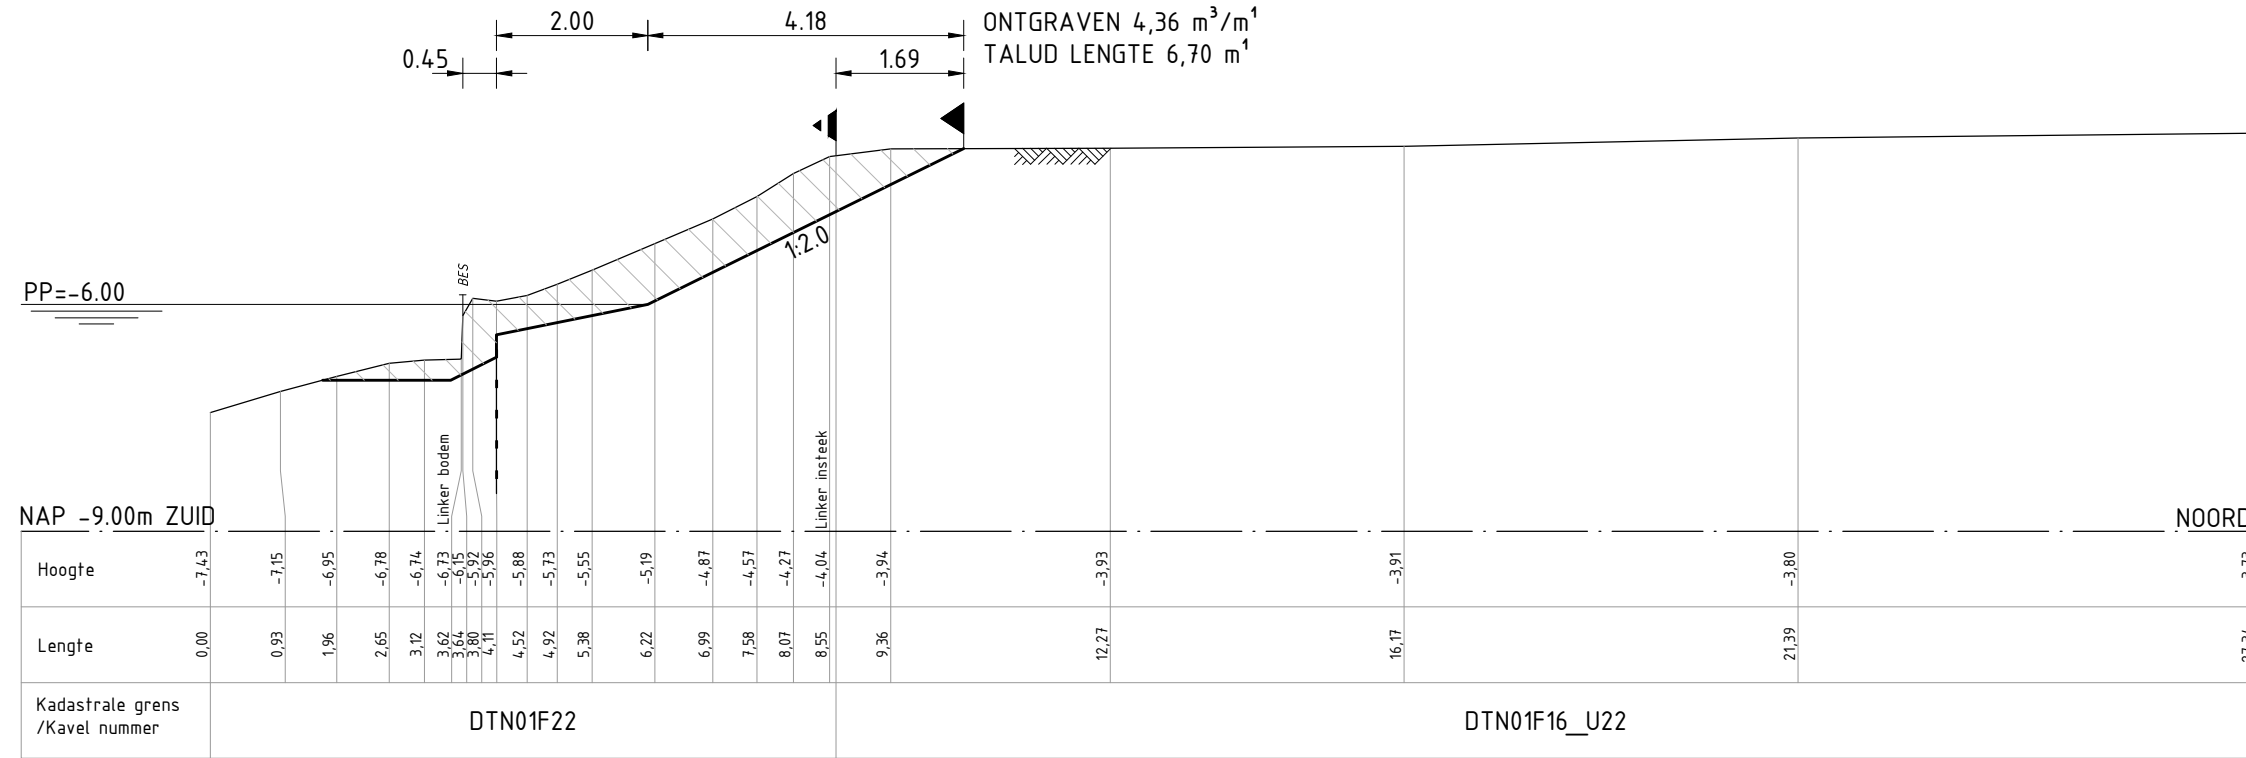

DWARSPROFIEL 25

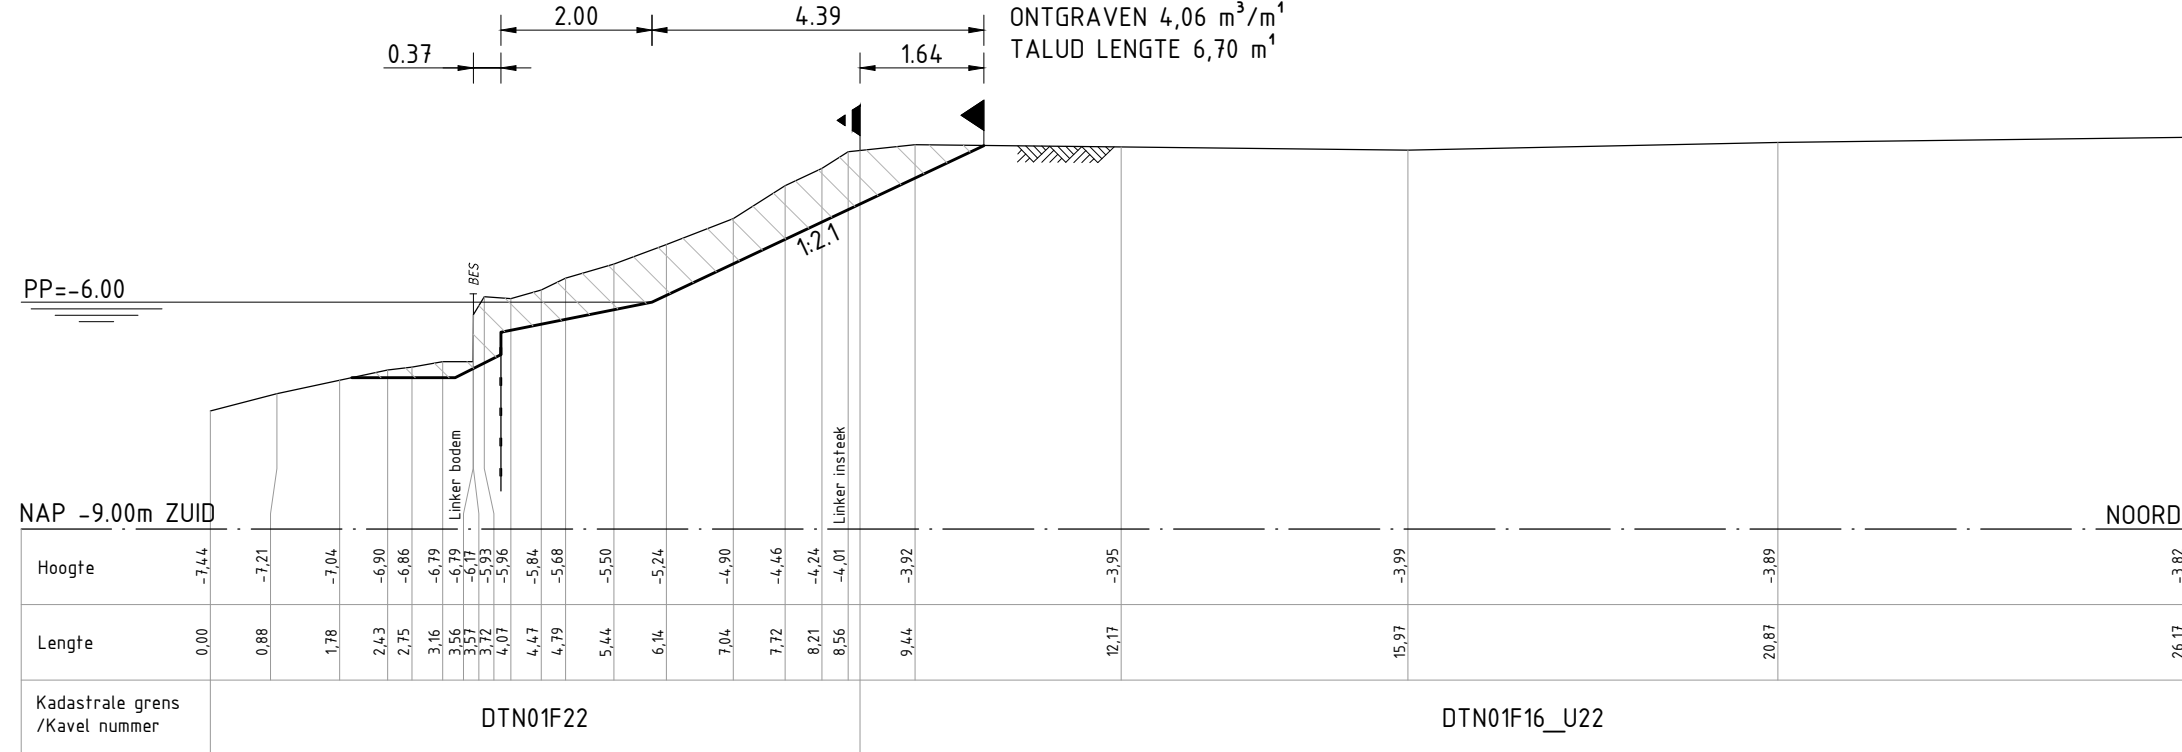

DWARSPROFIEL 26

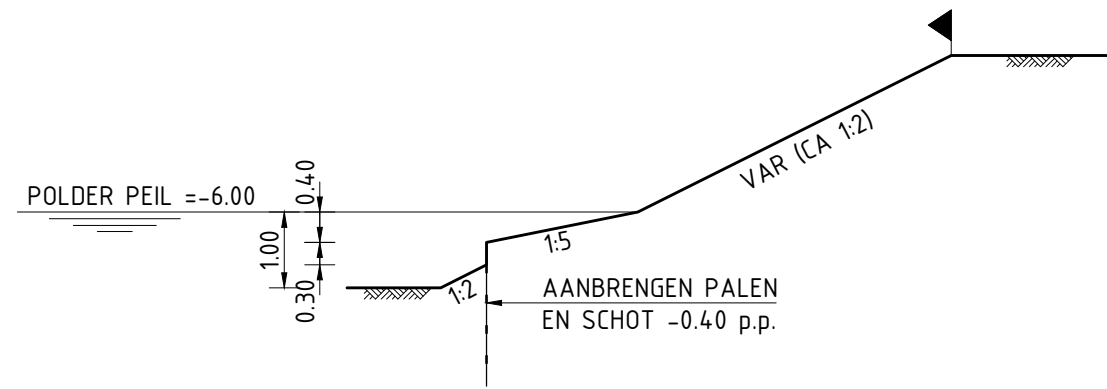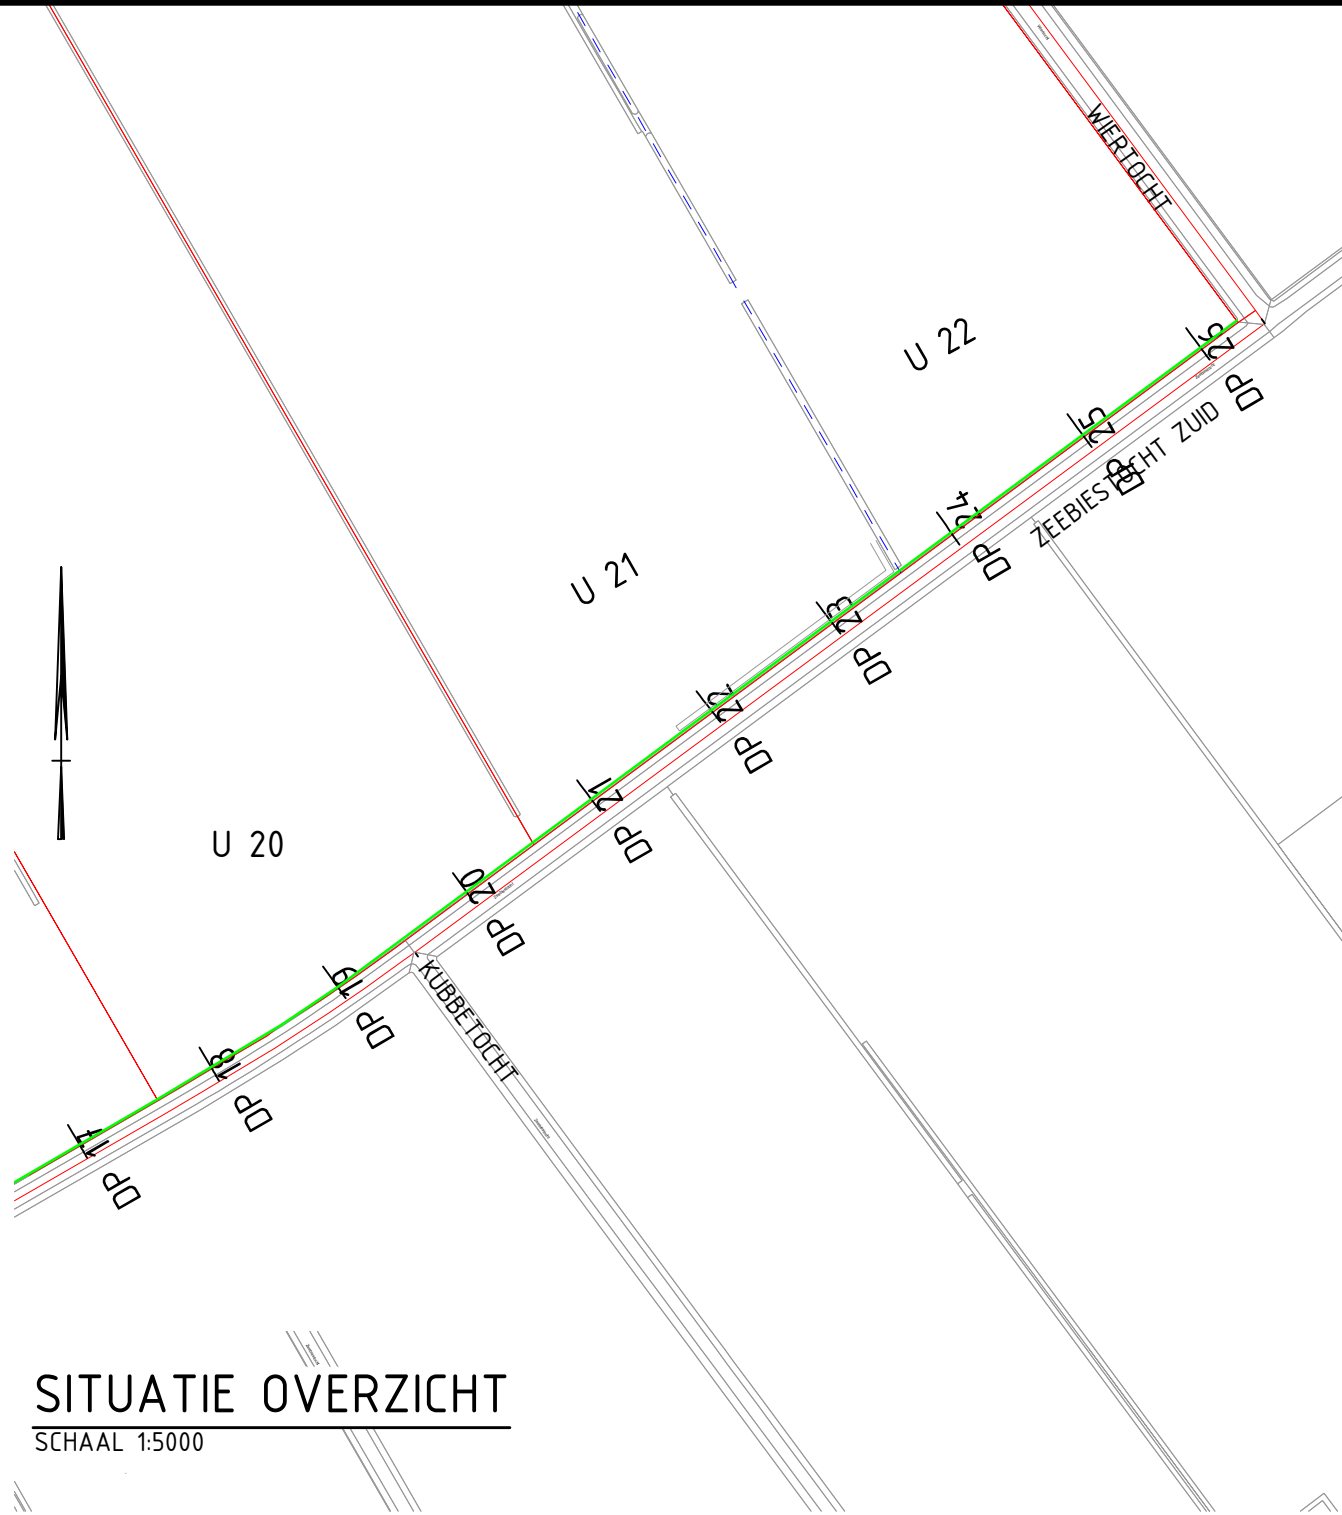

PRINCIPE DUURZAME OEVER











WERKZAAMHEDEN ZEEBIESTOCHT ZUID				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m ²) EIGENDOMSRENS/BEOOGDE EIGENDOMSRENS (GRONZAANKNOP)	KAVELBREEDTE (m ¹)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m ³ /m ¹)	ONTGRAVEN (m ³)
DTN01F246 - U14 (DEEL)	---	14.7 (dp1 - dp2)	1,46 (dp1 - dp2)	215
DTN01F246 - U15 (DEEL)	---	300 (dp3 - dp5)	3,28 (dp3 - dp5)	985
DTN01F506 - U16	175	306 (dp6 - dp8)	3,73 (dp6 - dp8)	1142
DTN01F503 - U17 (DEEL)	343	294 (dp9 - dp11)	3,73 (dp9 - dp11)	1096
DTN01F503 - U18 (DEEL)	305	298 (dp12 - dp14)	3,66 (dp12 - dp14)	1091
DTN01F350 - U19	260	300 (dp15 - dp17)	3,92 (dp15 - dp17)	1175
DTN01F427 - U20	415	301 (dp18 - dp20)	4,08 (dp18 - dp20)	1229
DTN01F16 - U21 (DEEL)	531	302 (dp21 - dp23)	3,96 (dp21 - dp23)	1196
DTN01F16 - U22 (DEEL)	472	277 (dp24 - dp26)	4,19 (dp24 - dp26)	1160
		2525		9289

VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- BEOOGDE INSTEK (SITUATIE)
- BEOOGDE NIEUWE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- 041 KAVEL NUMMER (SITUATIE)
- ONTGRAVEN (PROFIELEN)
- p.p. POLDER PEIL (PROFIELEN)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BEOOGDE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BEOOGDE INSTEK (PROFIELEN)
- BESTAANDE BESCHOEIING (PROFIELEN)
- NIEUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.


A	-	-	-	-	-
0	12-01-2021	gwe	-	-	-
Code	Datum	Getekend door	Controle door	Toezicht door	Omschrijving
					Adviseur/aannemer:
		LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL: 0320 - 274911			
Project: Duurzame oevers					
Omschrijving		ZEEBIESTOCHT ZUID KAVELS U20, U21, U22 PROFIELEN 20 t/m 26			Status: Definitief
Besteknummer:		Schaal: 1:100			Fase: Projectplan procedure
Tekeningnummer: P-WG205-CI-003					Fermaat: A1 Wijz: 0
					Blad: 4 Aantal: 4

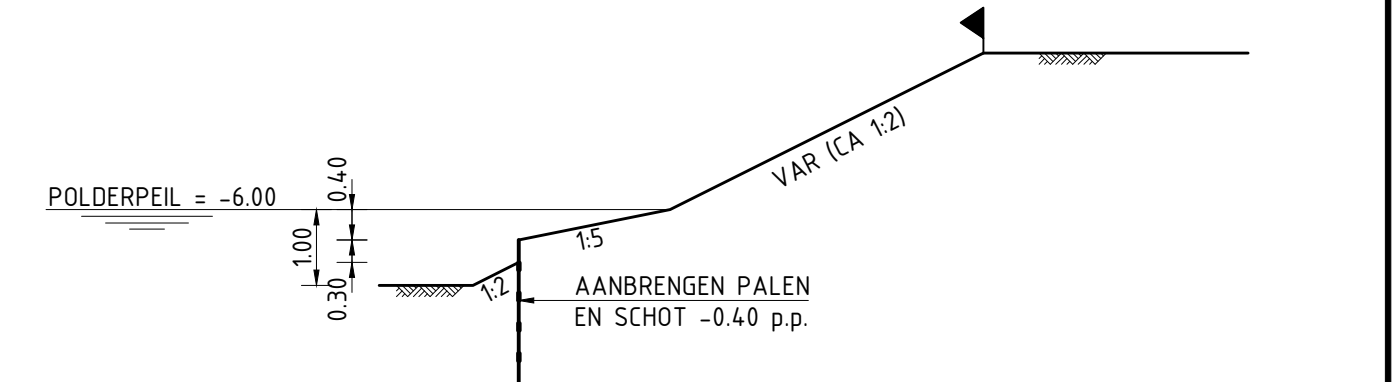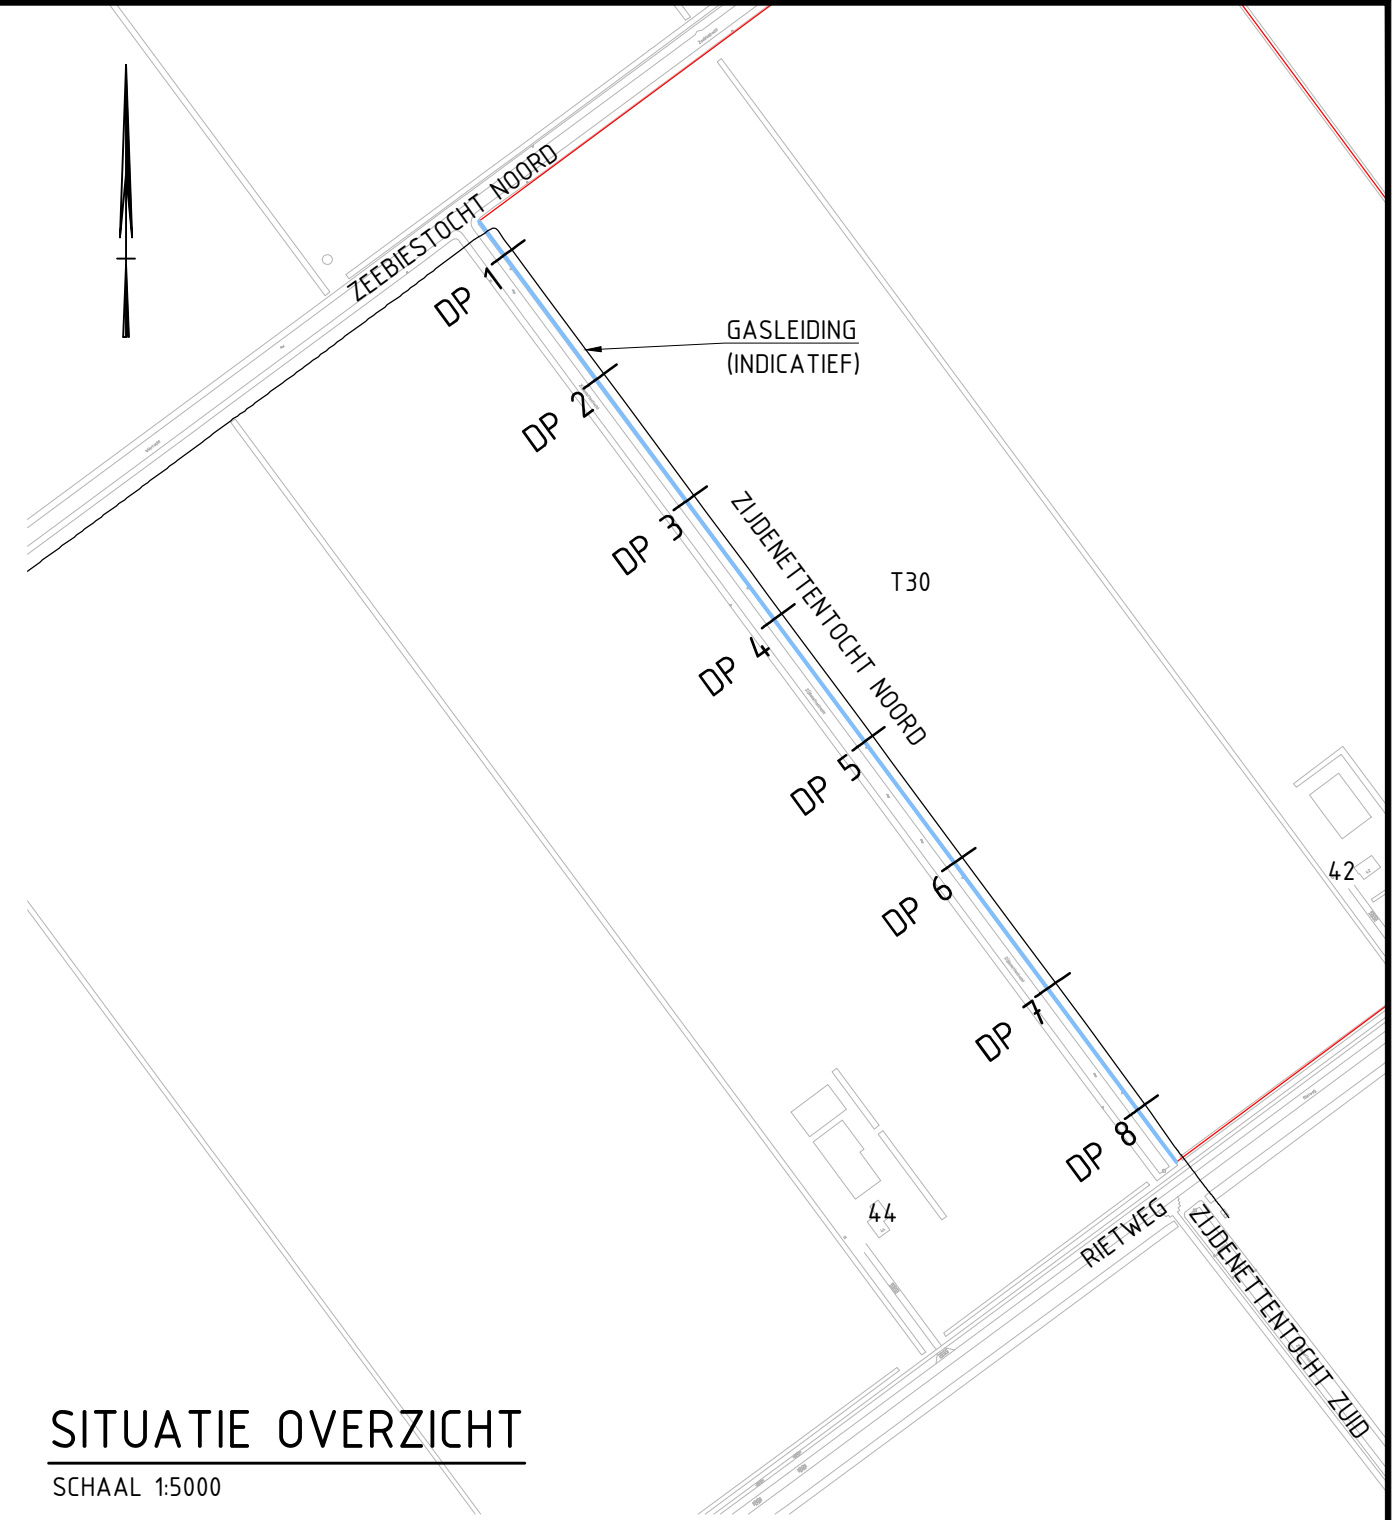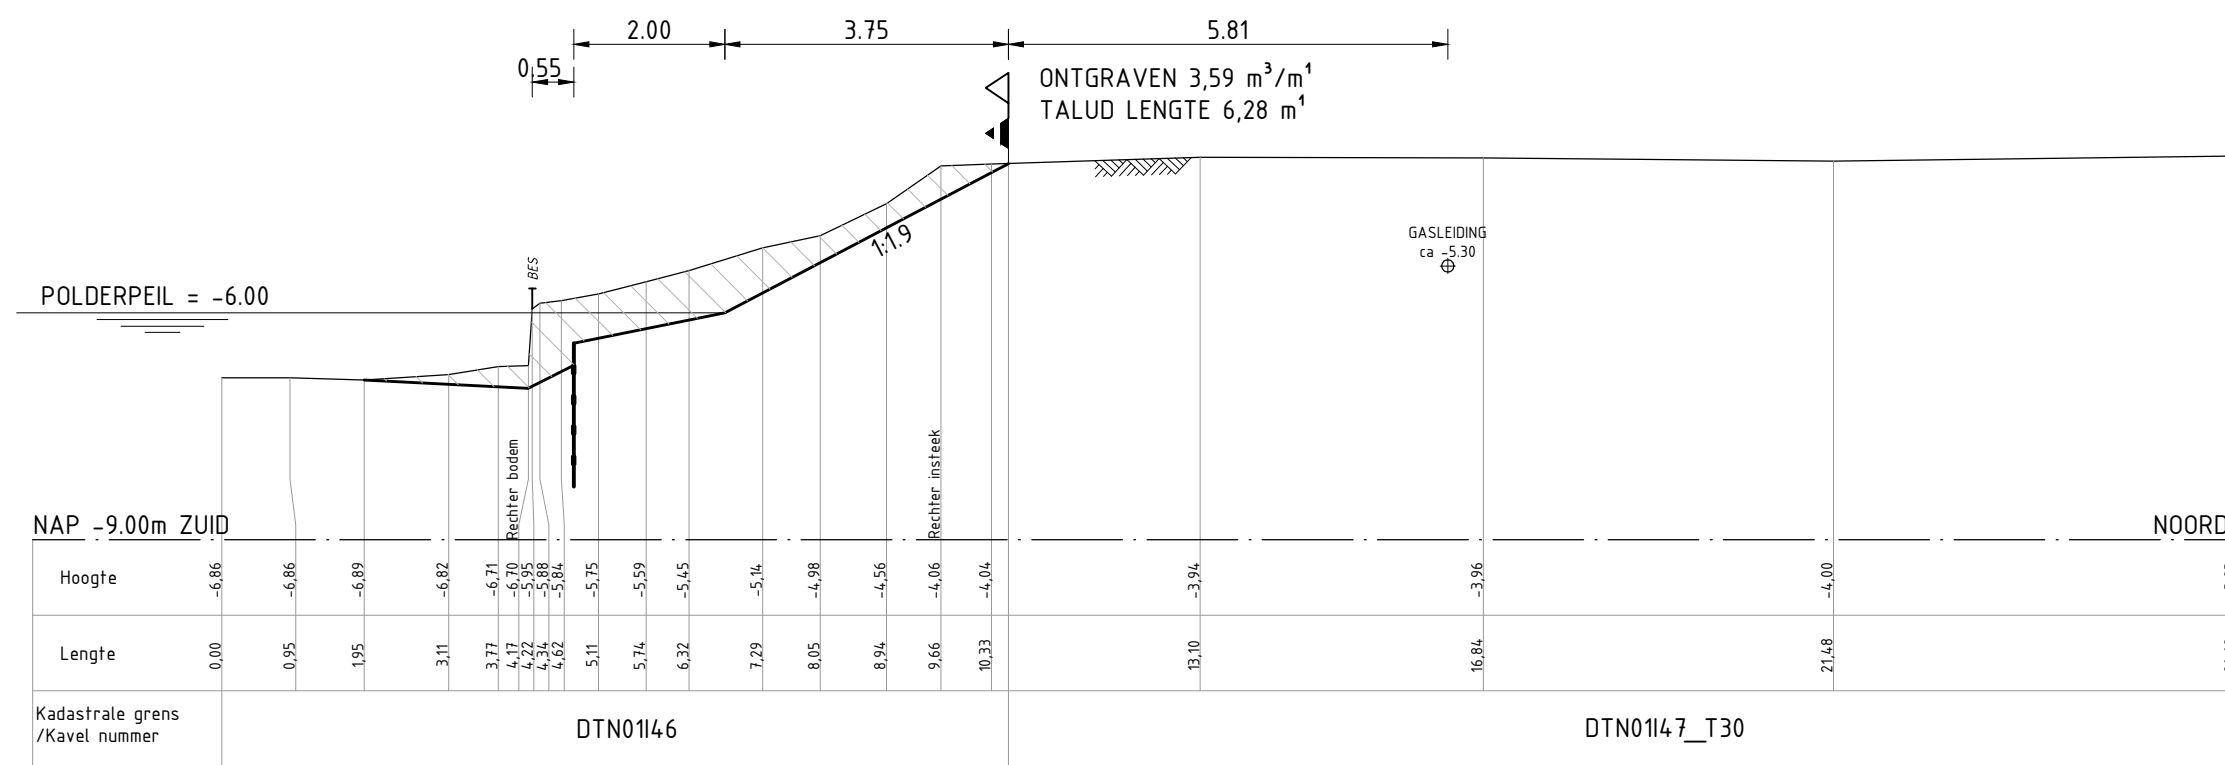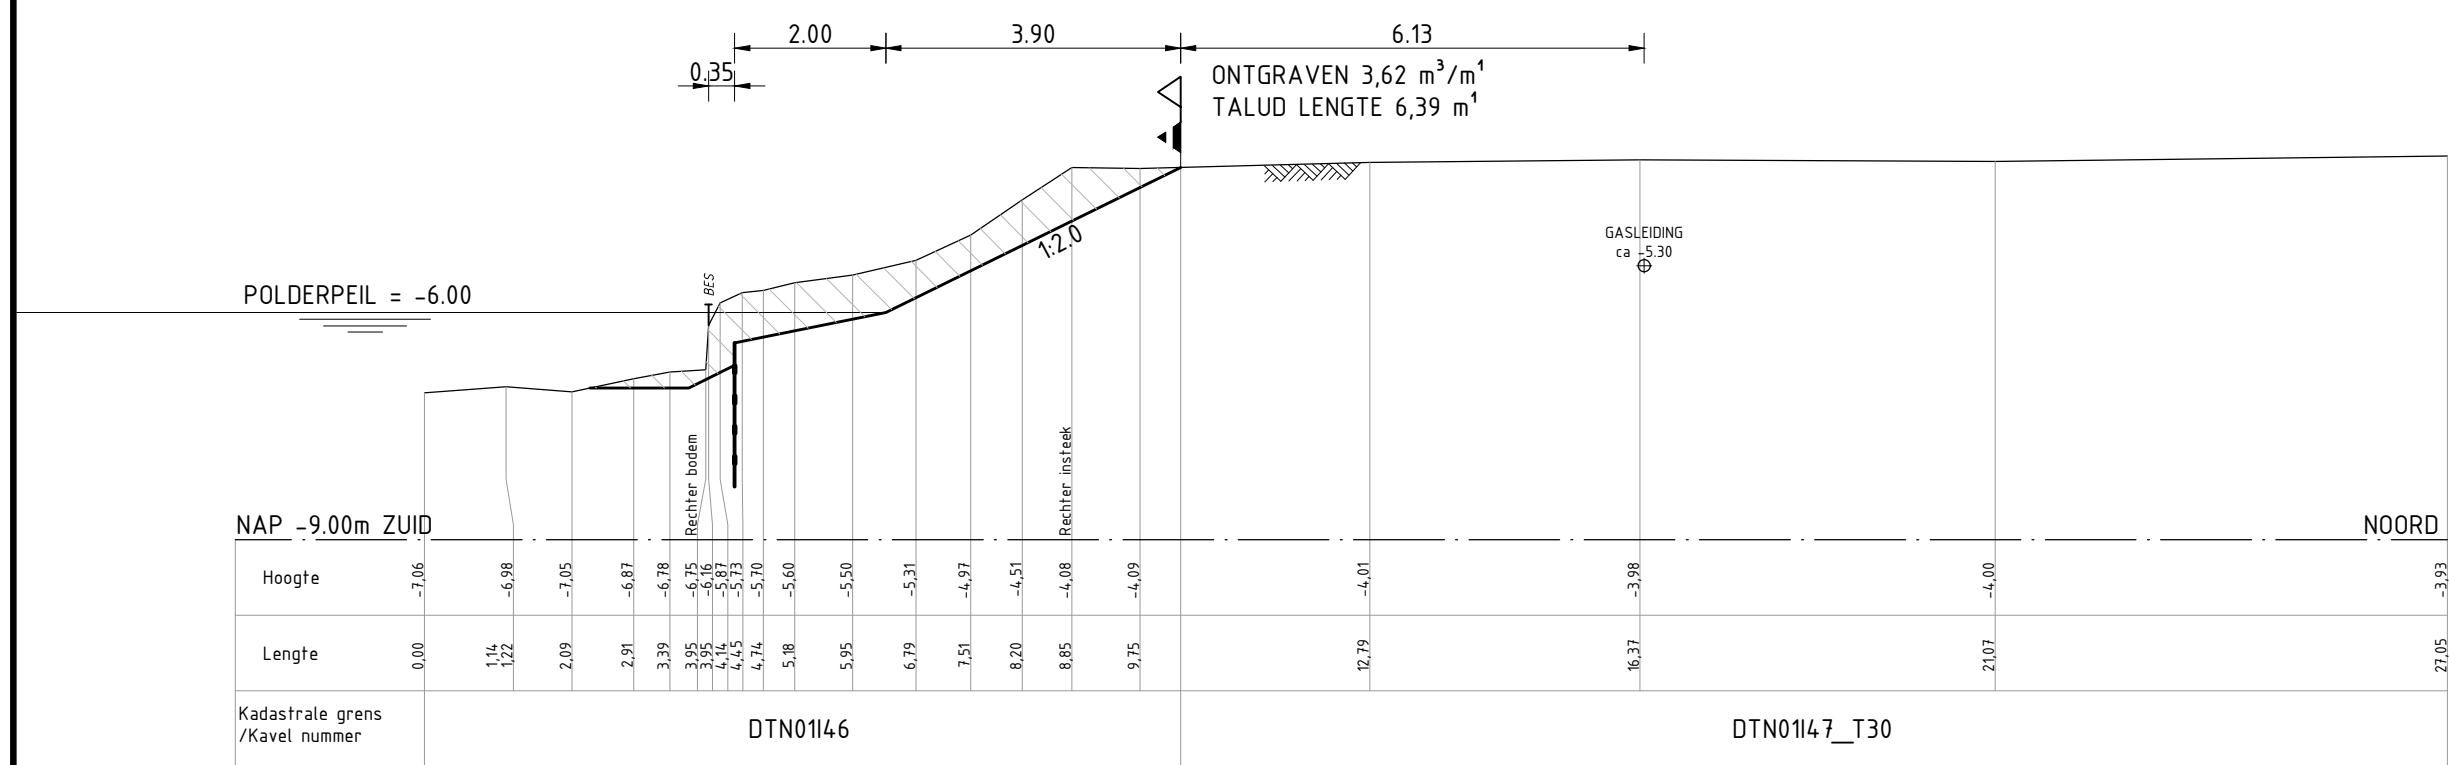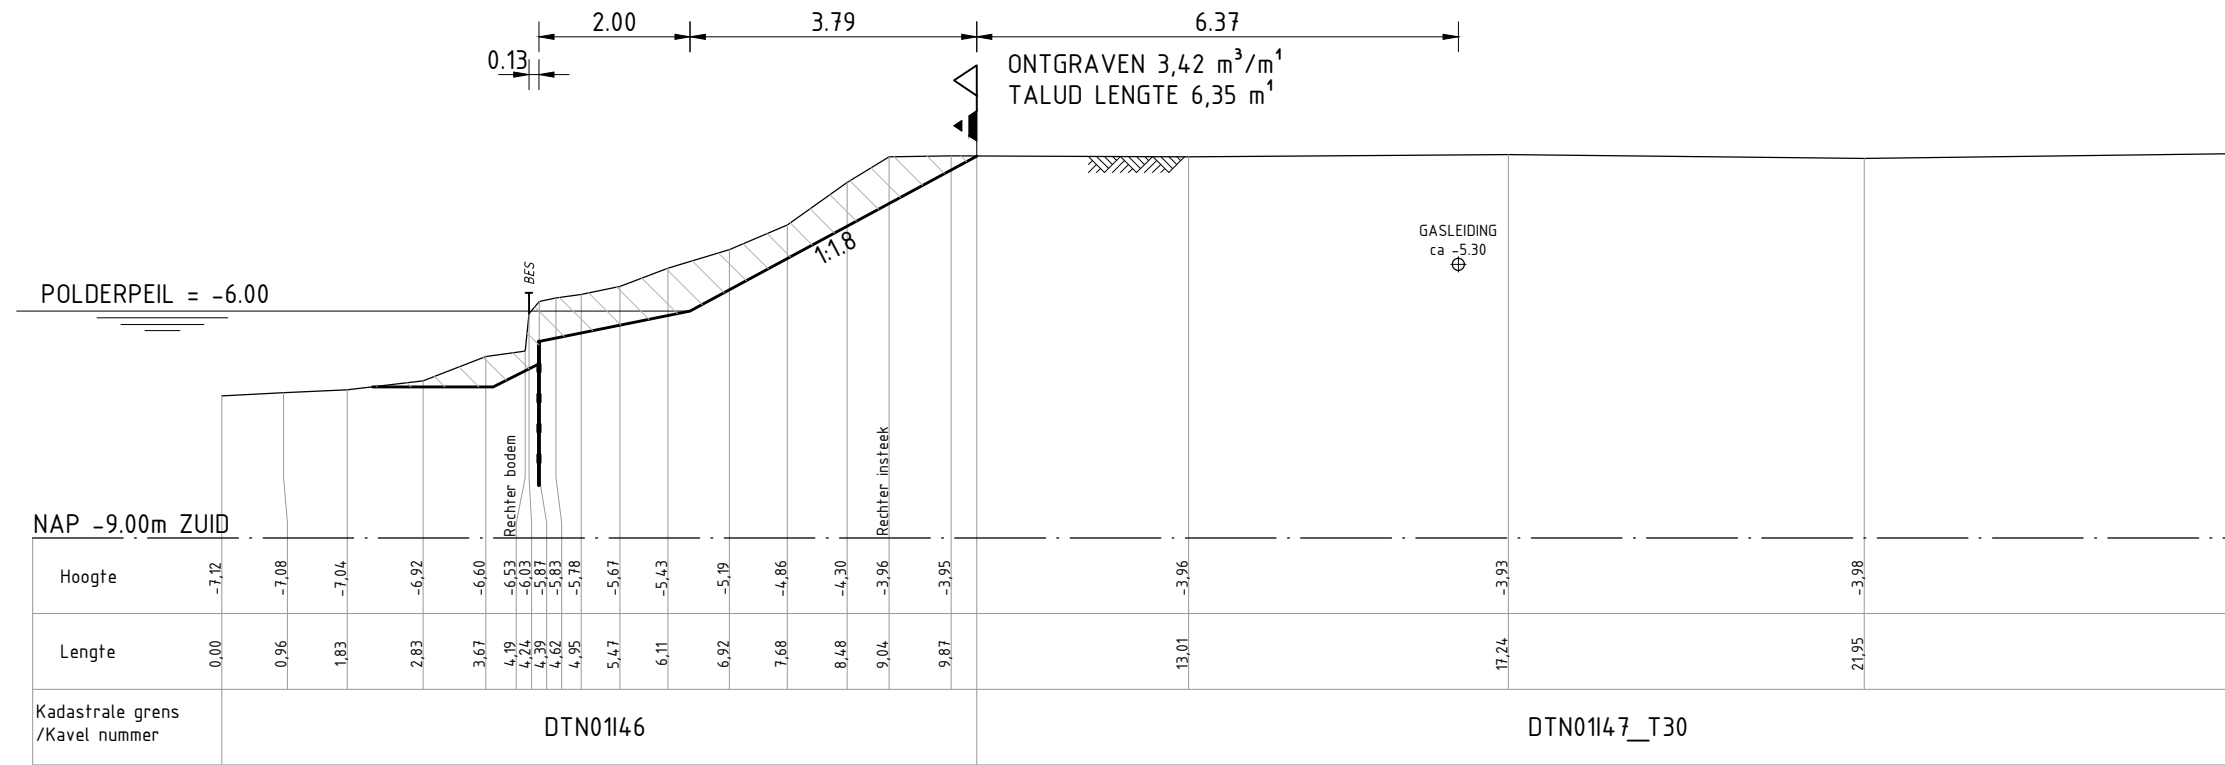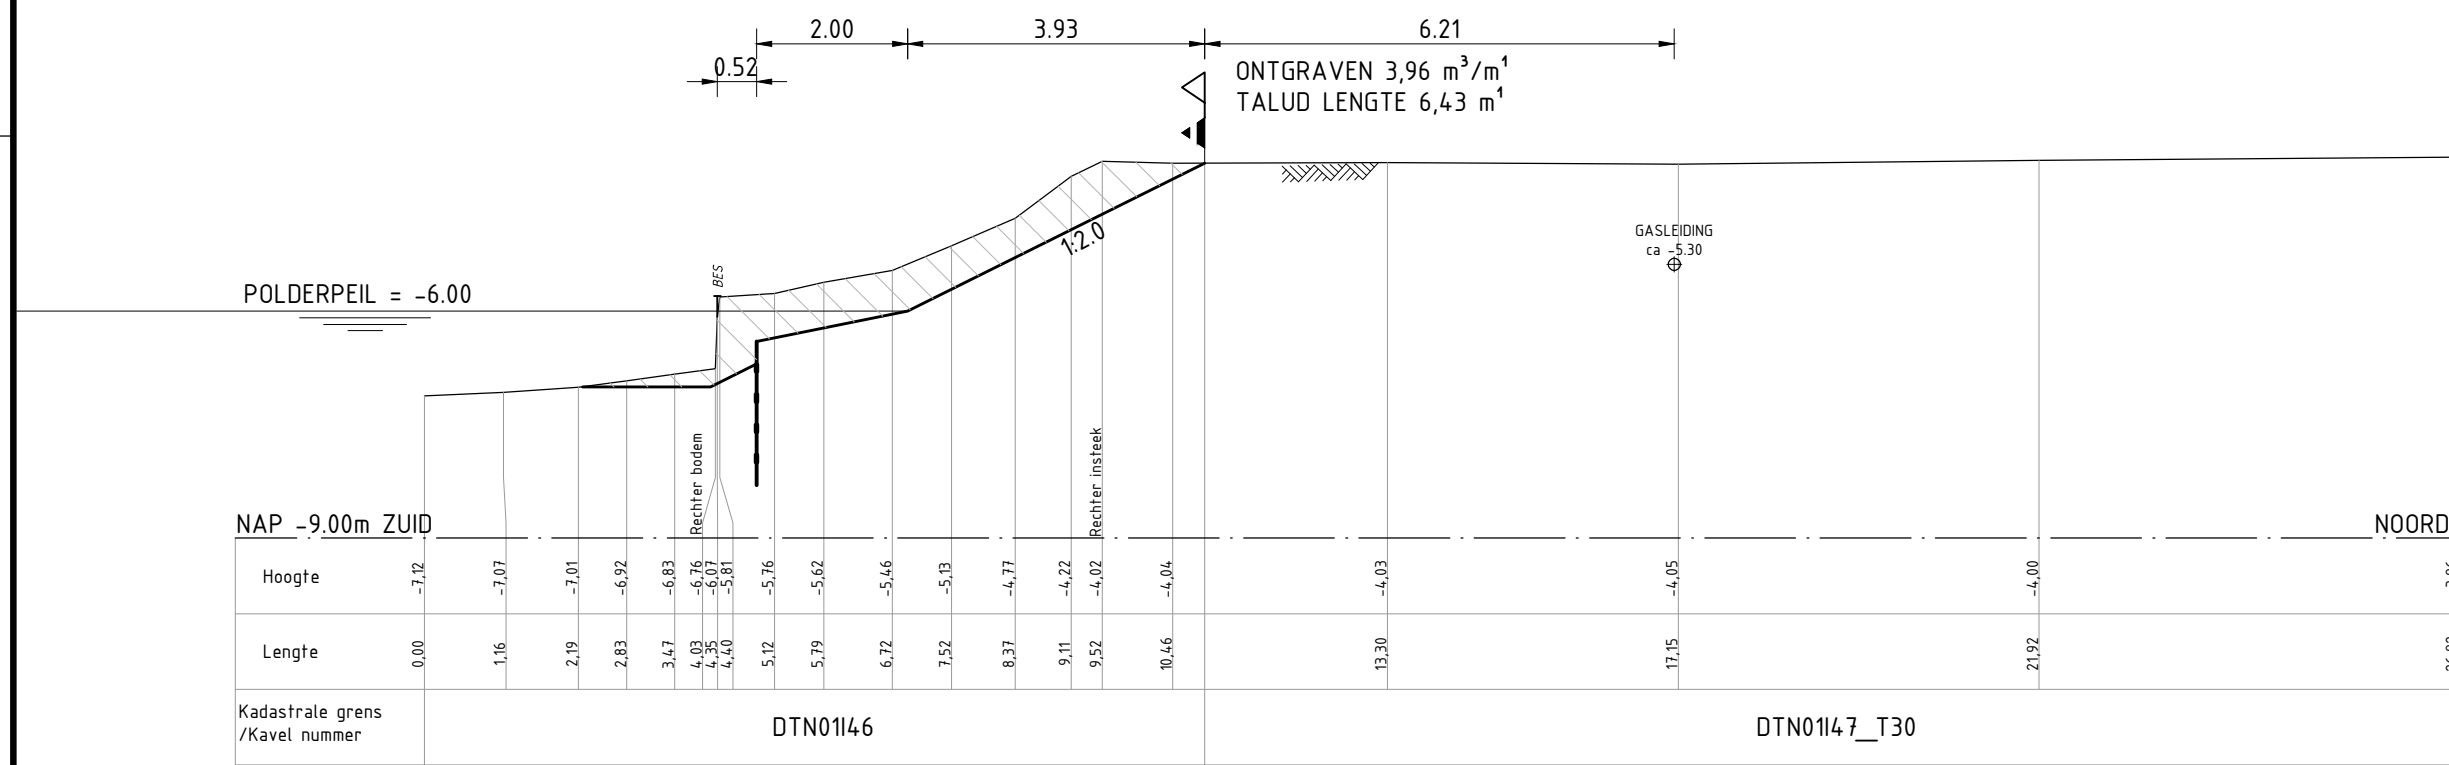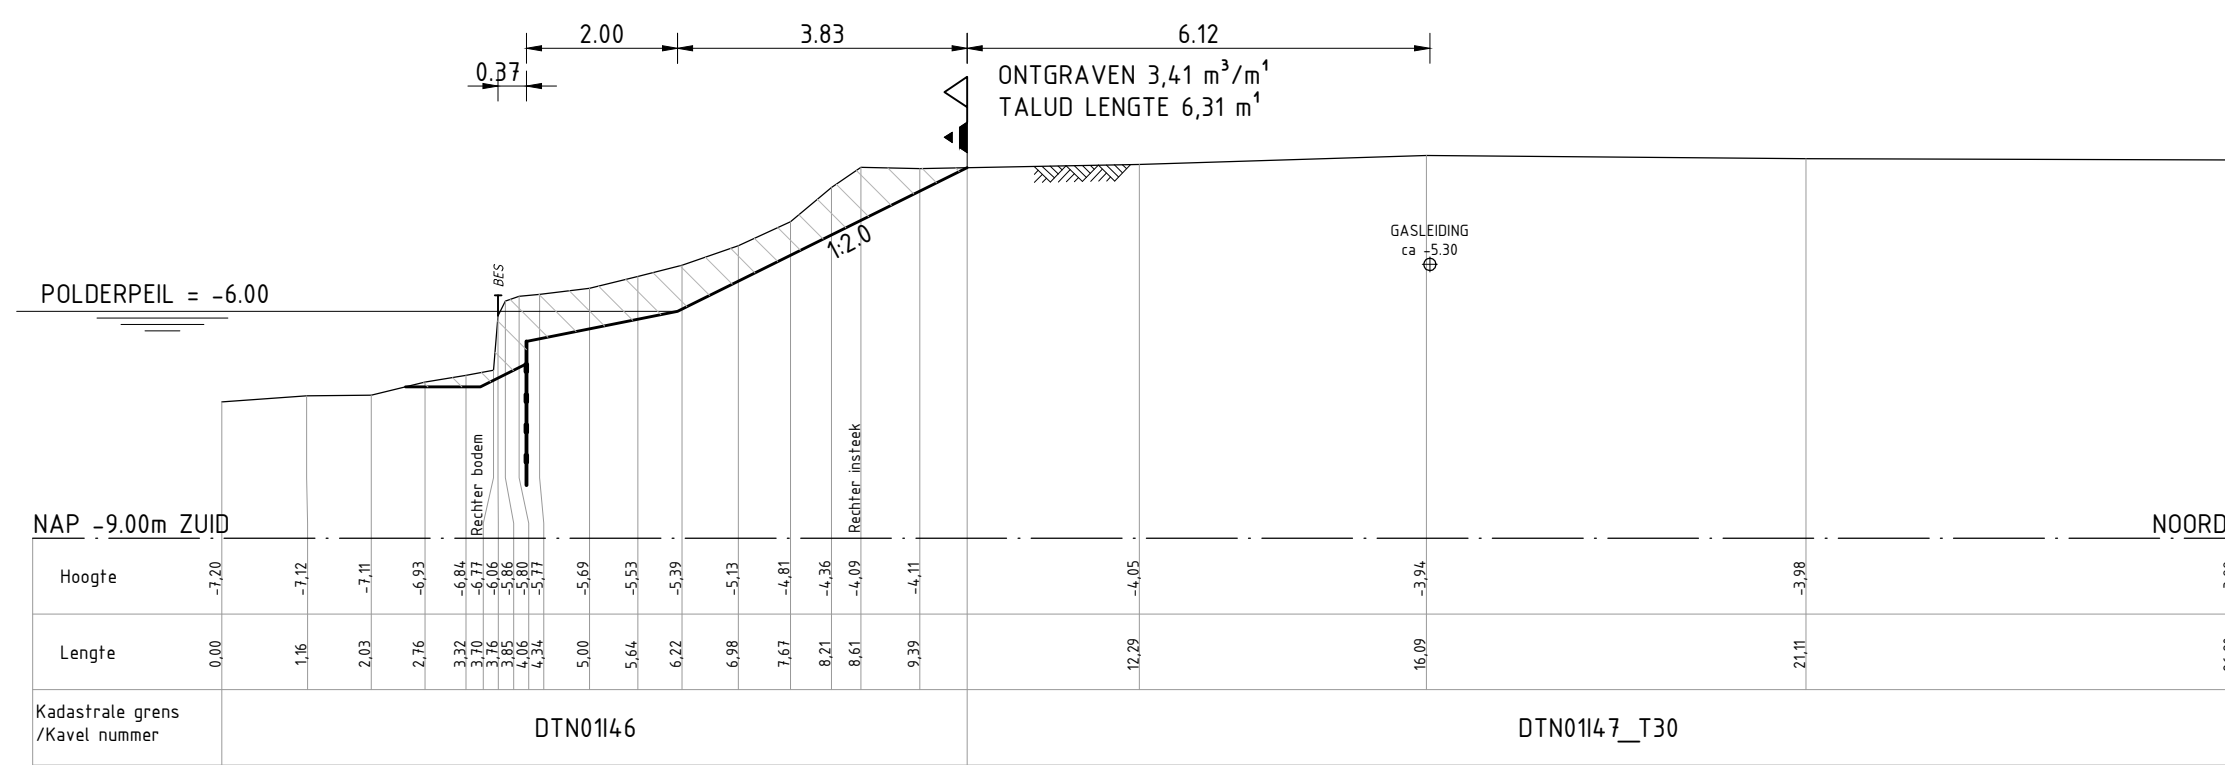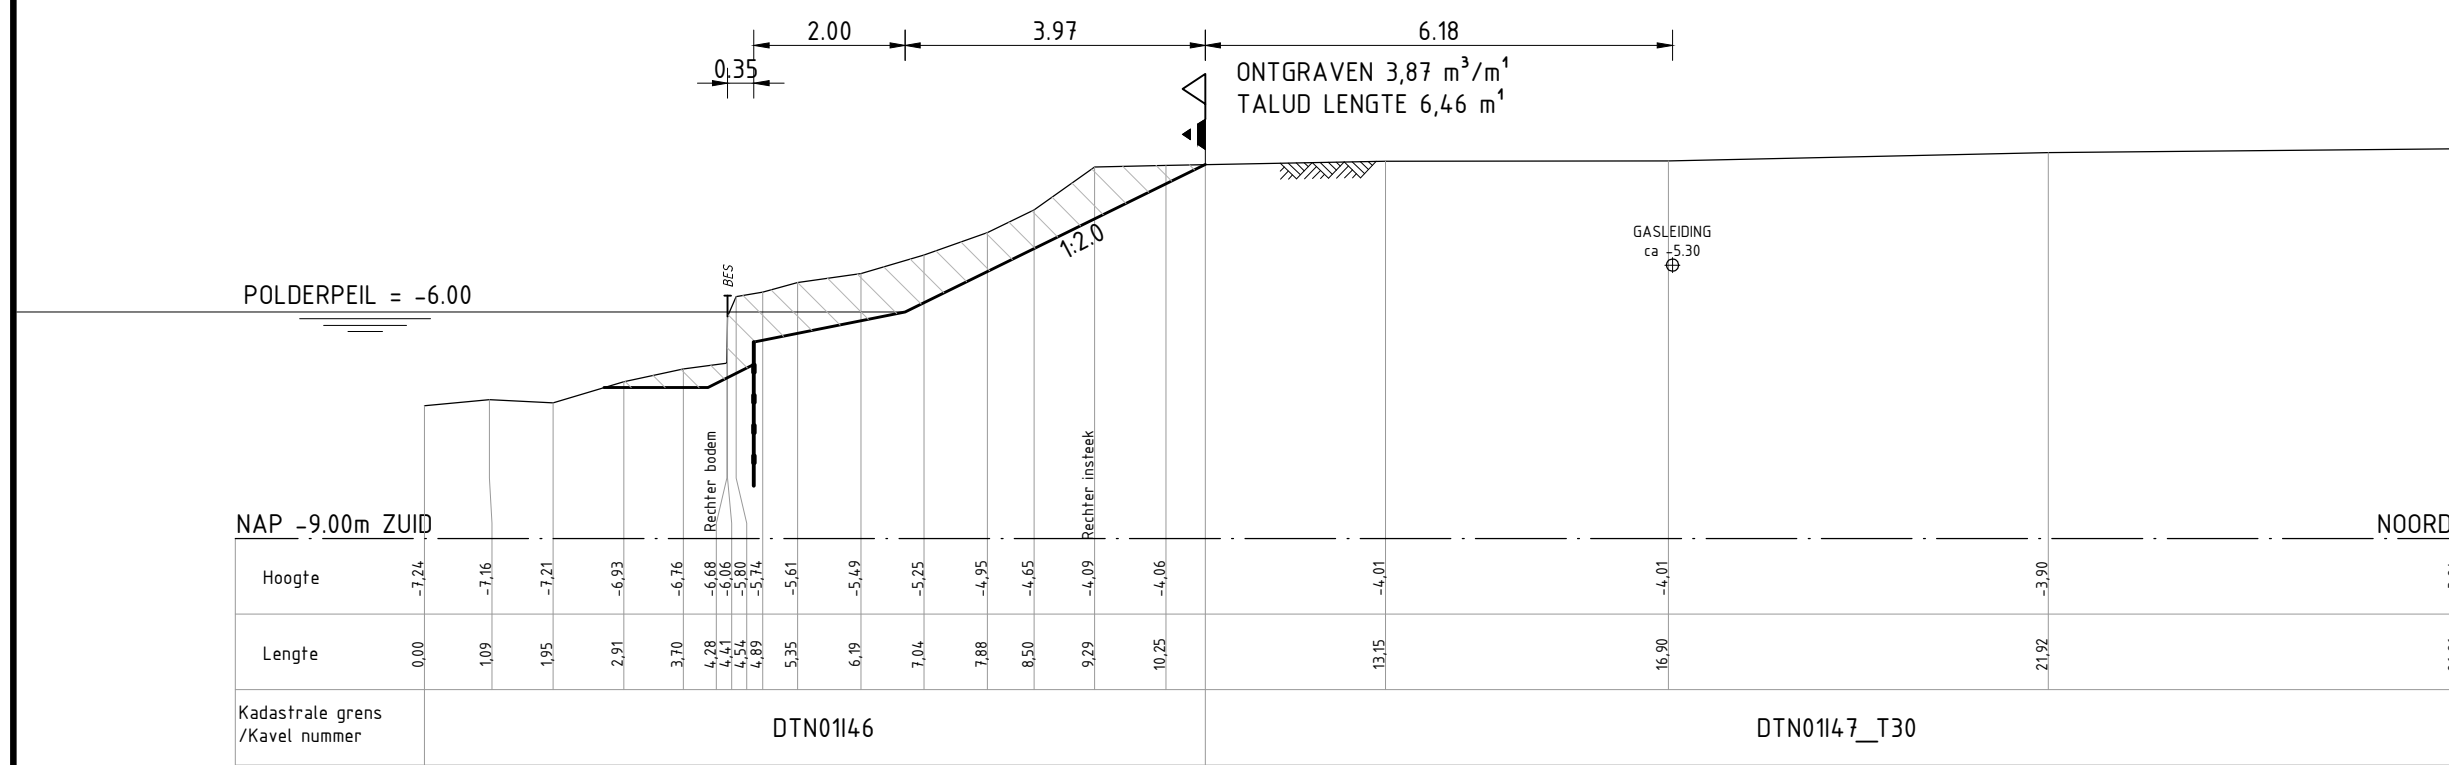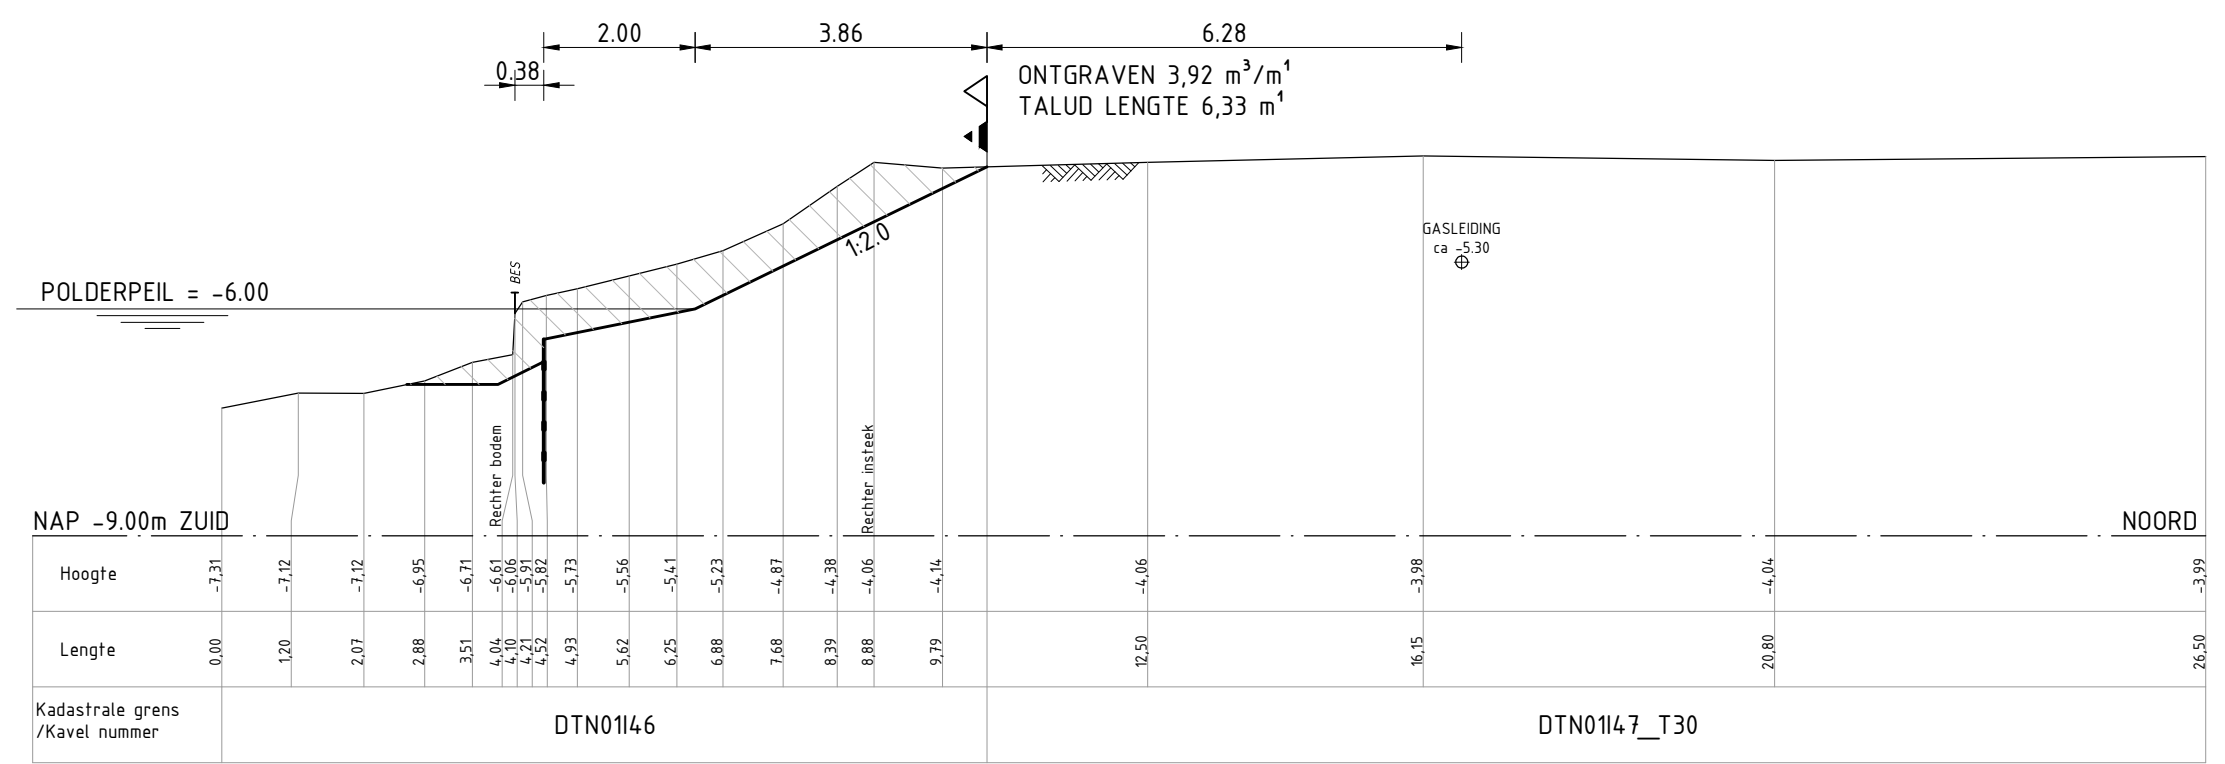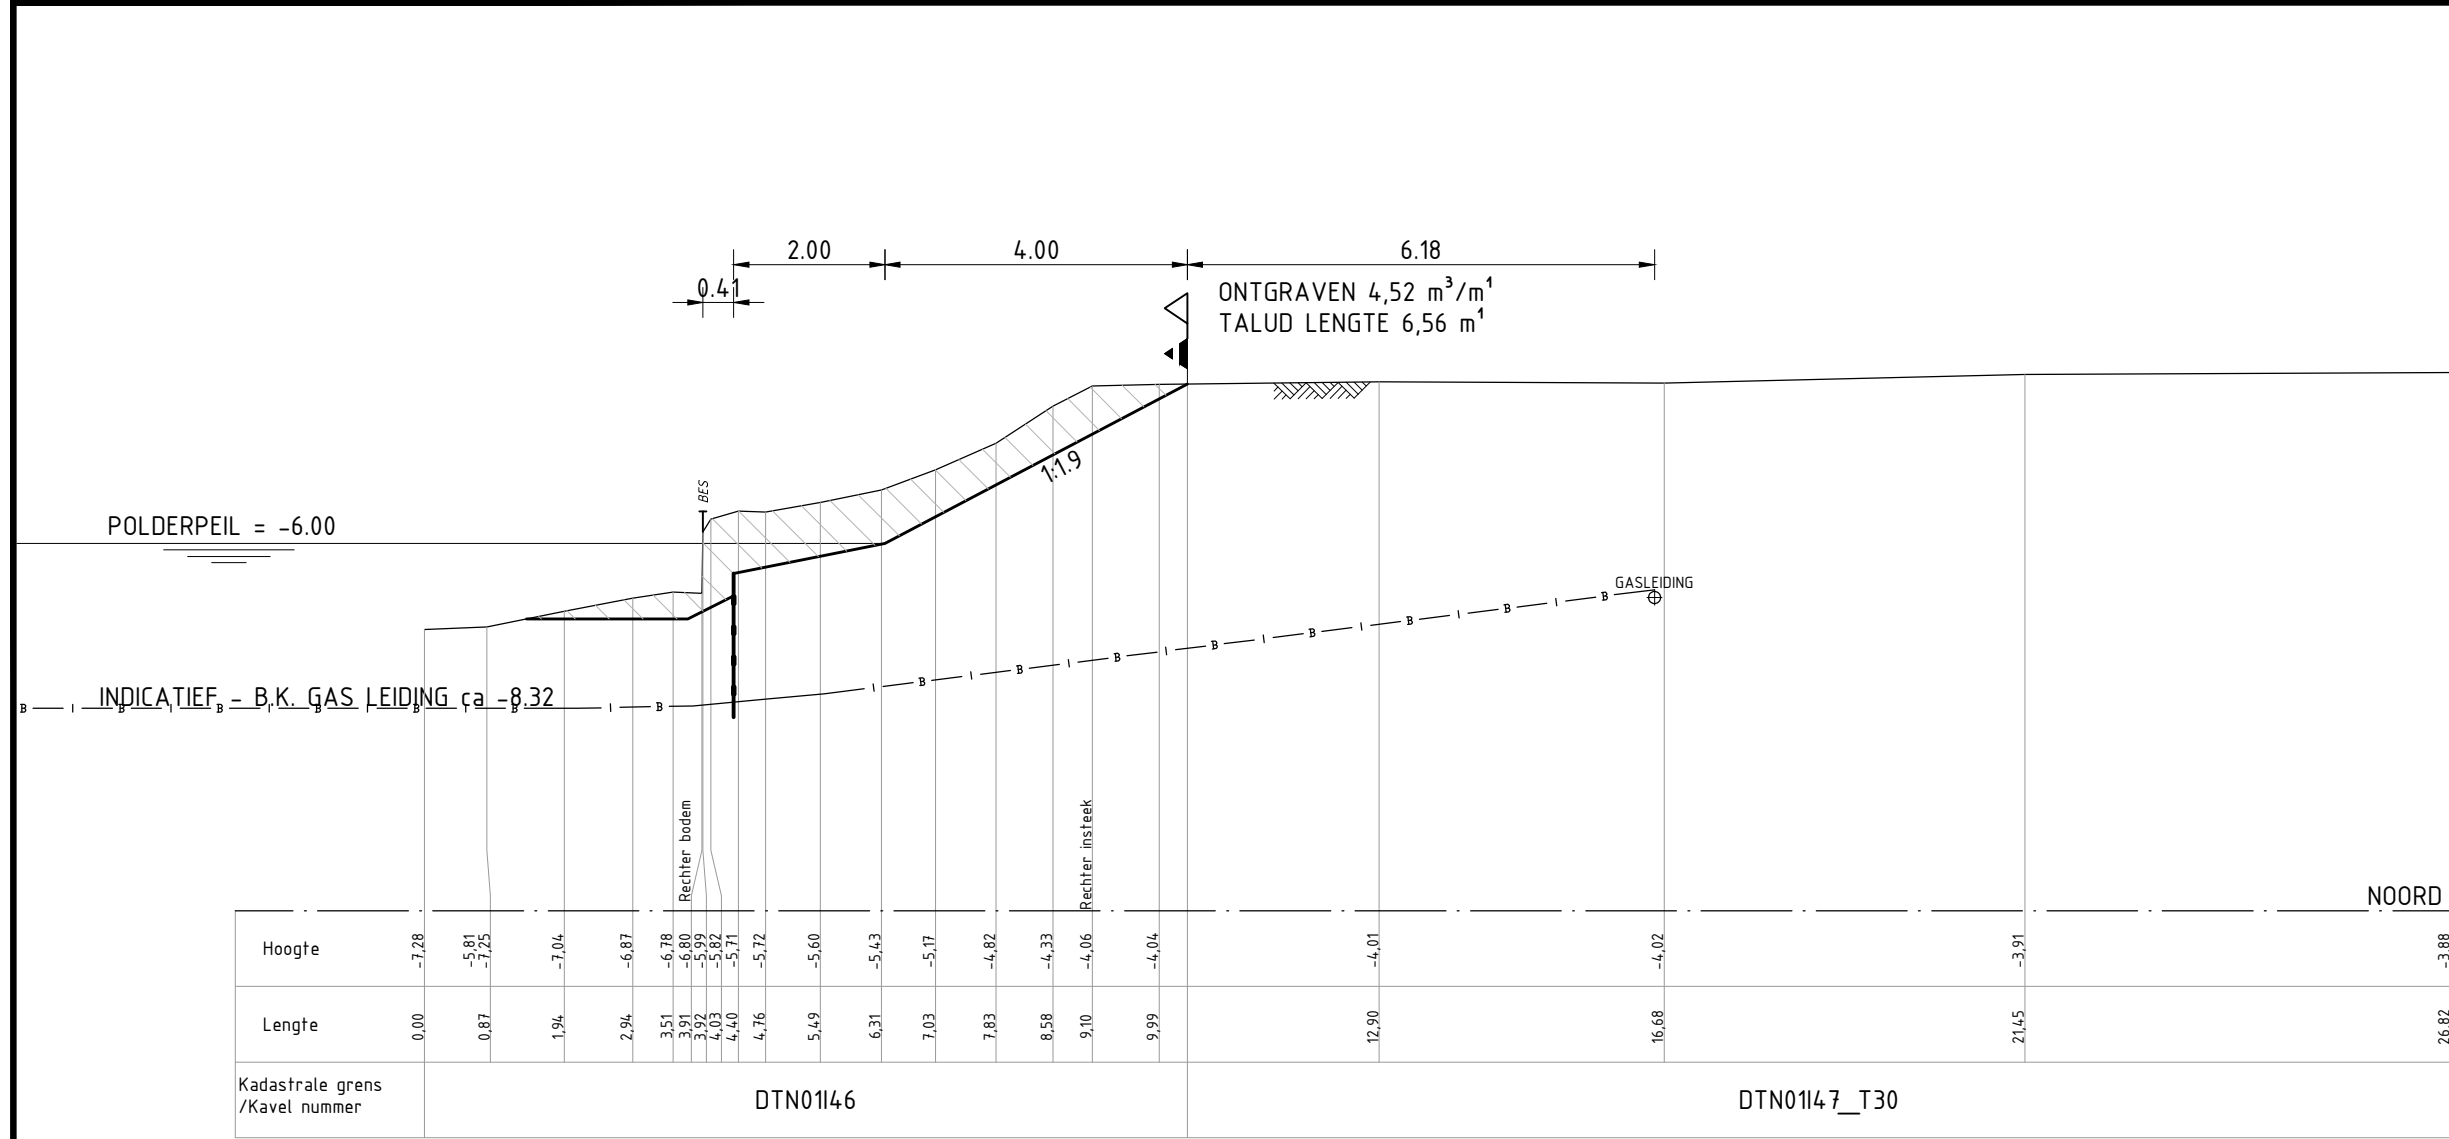


WERKZAAMHEDEN ZIJDENETTENTOCHT NOORD KAVEL T30				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSRENS/BEOOGDE EIGENDOMSRENS (GRONDIJNKOOP)	KAVELBREEDTE (m)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m)	ONTGRAVEN (m³)
DTN01147 - T30	---	774 (dp1 - dp8)	3,79 (dp1 - dp8)	2932
				2932

VERKLARING				
—	BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)			
—	HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)			
—	BEOOGDE INSTEK (SITUATIE)			
041	KAVEL NUMMER (SITUATIE)			
▨	ONTGRAVEN (PROFIELEN)			
p.p.	POLDER PEIL (PROFIELEN)			
▸	HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)			
▸	BEOOGDE INSTEK (PROFIELEN)			
▸	BESTAANDE BESCHOEIING (PROFIELEN)			
▸	NIUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)			


MATEN IN METERS. HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P. HOEKEN IN 360° STELSEL. COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.				
A	-	-	-	-
0	12-01-2021	qwe	-	-
Code	Datum	Getekend door	Controle door	Toezicht door
Omschrijving				Adviseur/aannemer
WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND				
LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL.: 0320 - 274911				
Project: Duurzame oevers				
Omschrijving: ZIJDENETTENTOCHT NOORD KAVEL T30 PROFIELEN 1 t/m 8				Status: Definitief
Besteknummer:		Schaal: 1:100		Fase: Projectplan procedure
Tekeningsnummer: P-WG206-CI-002		Fermaat: A1		Wijz: 0
		Blad: 2		Aantal: 2

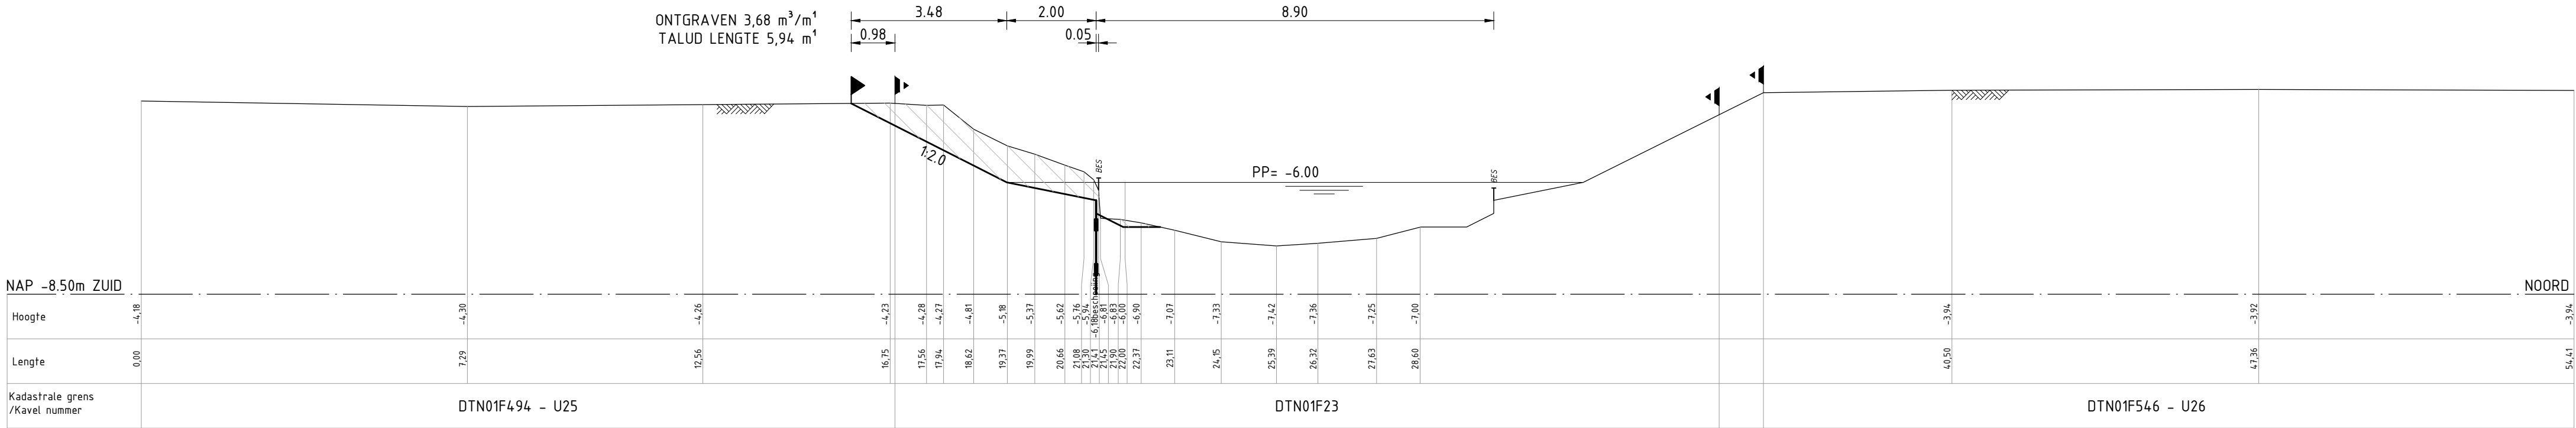


DWARSPROFIEL 1

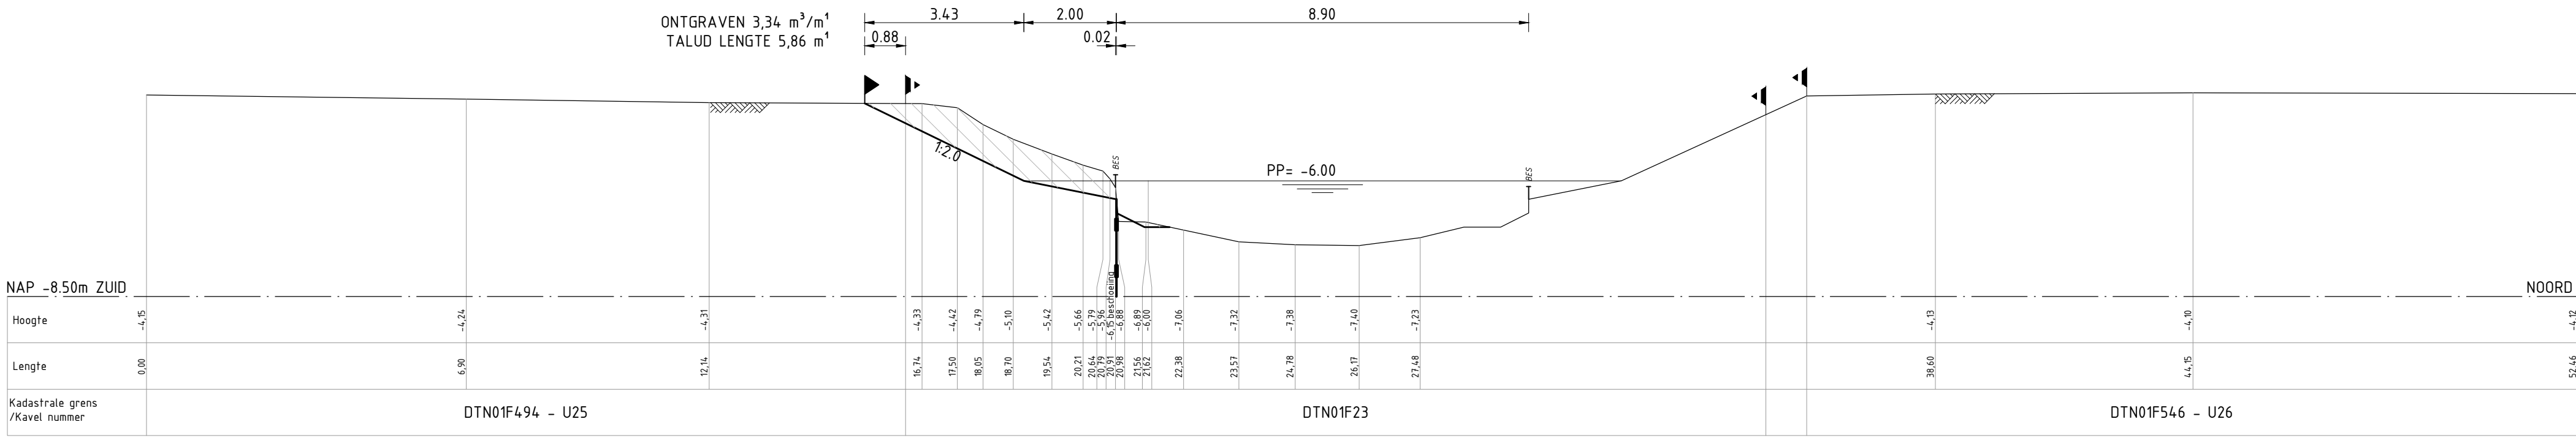


DWARSPROFIEL 2

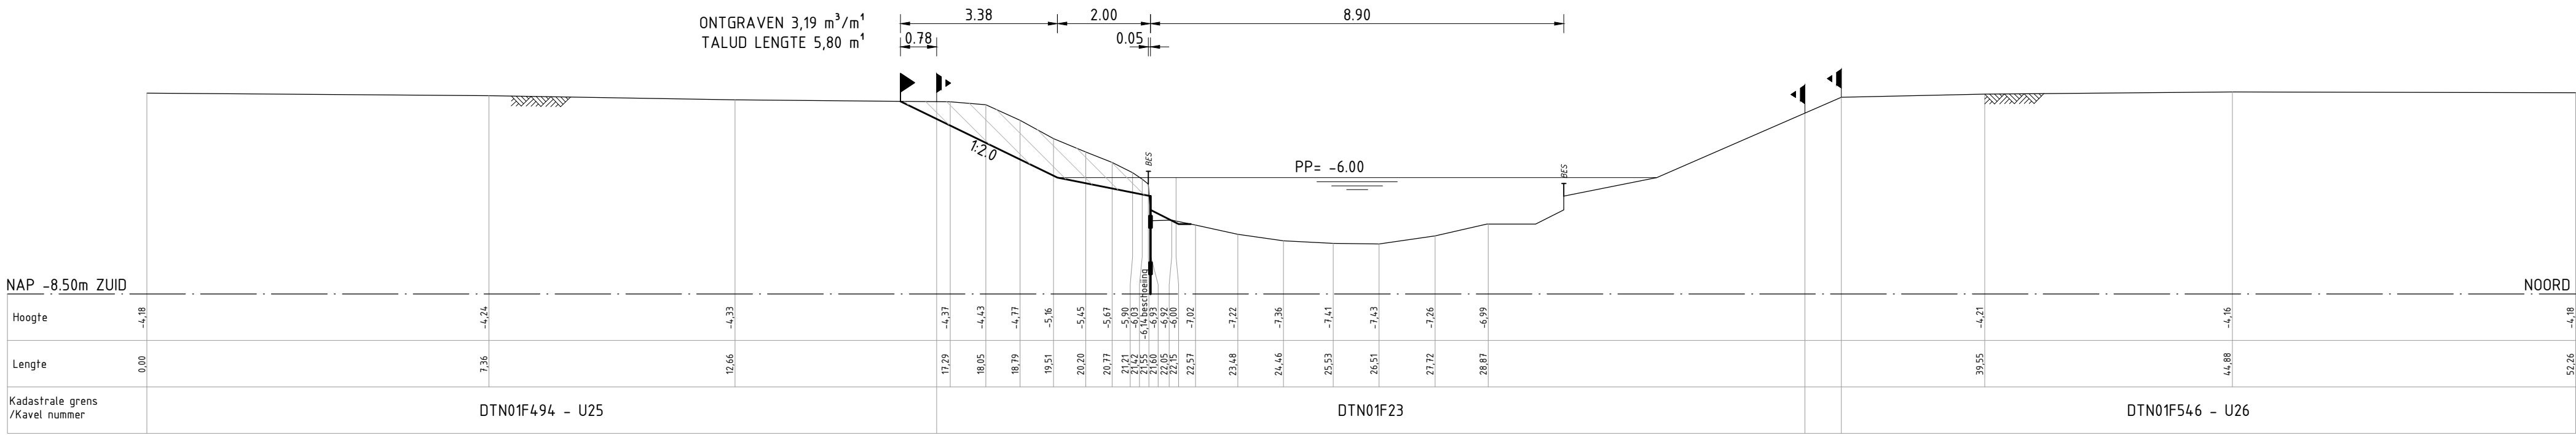



DWARSPROFIEL 3

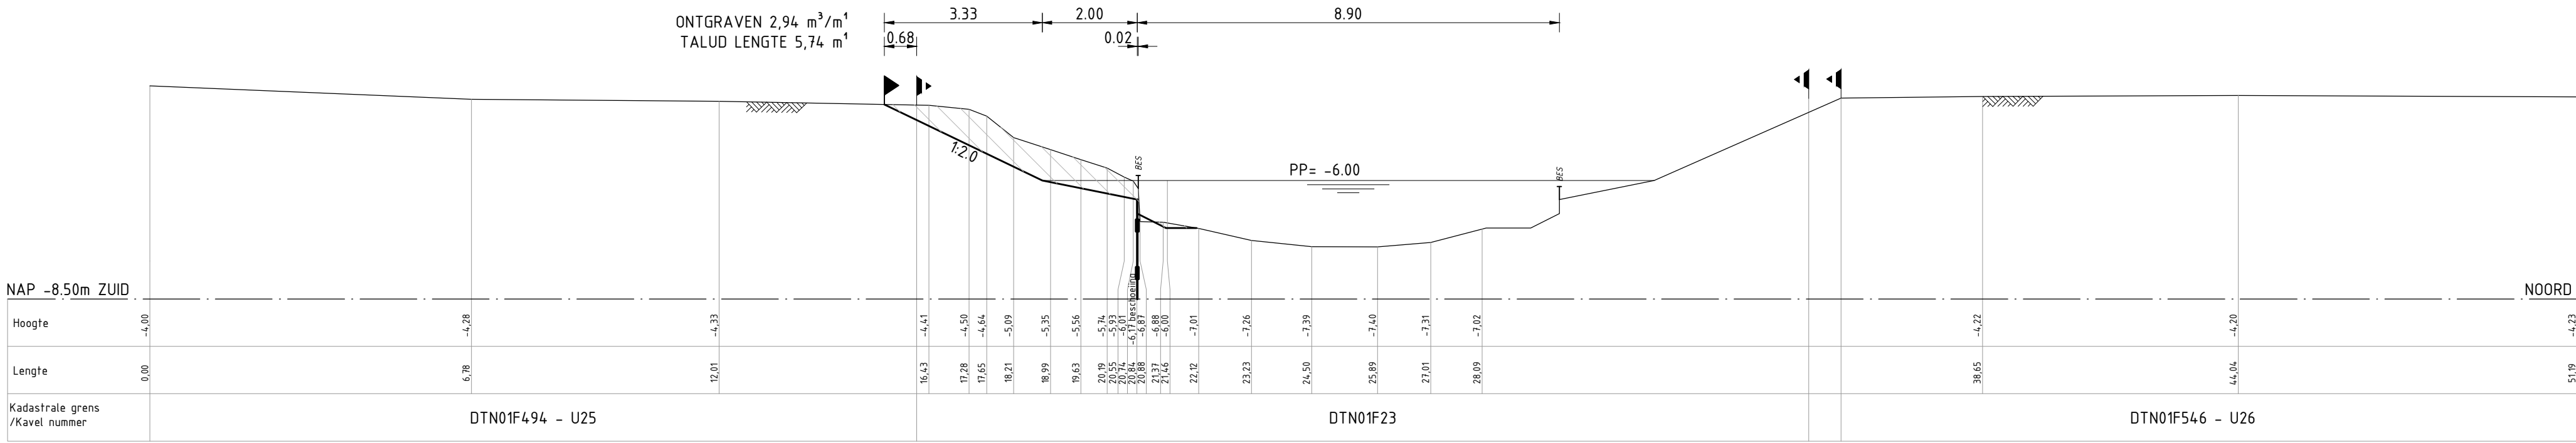

DWARSPROFIEL 4

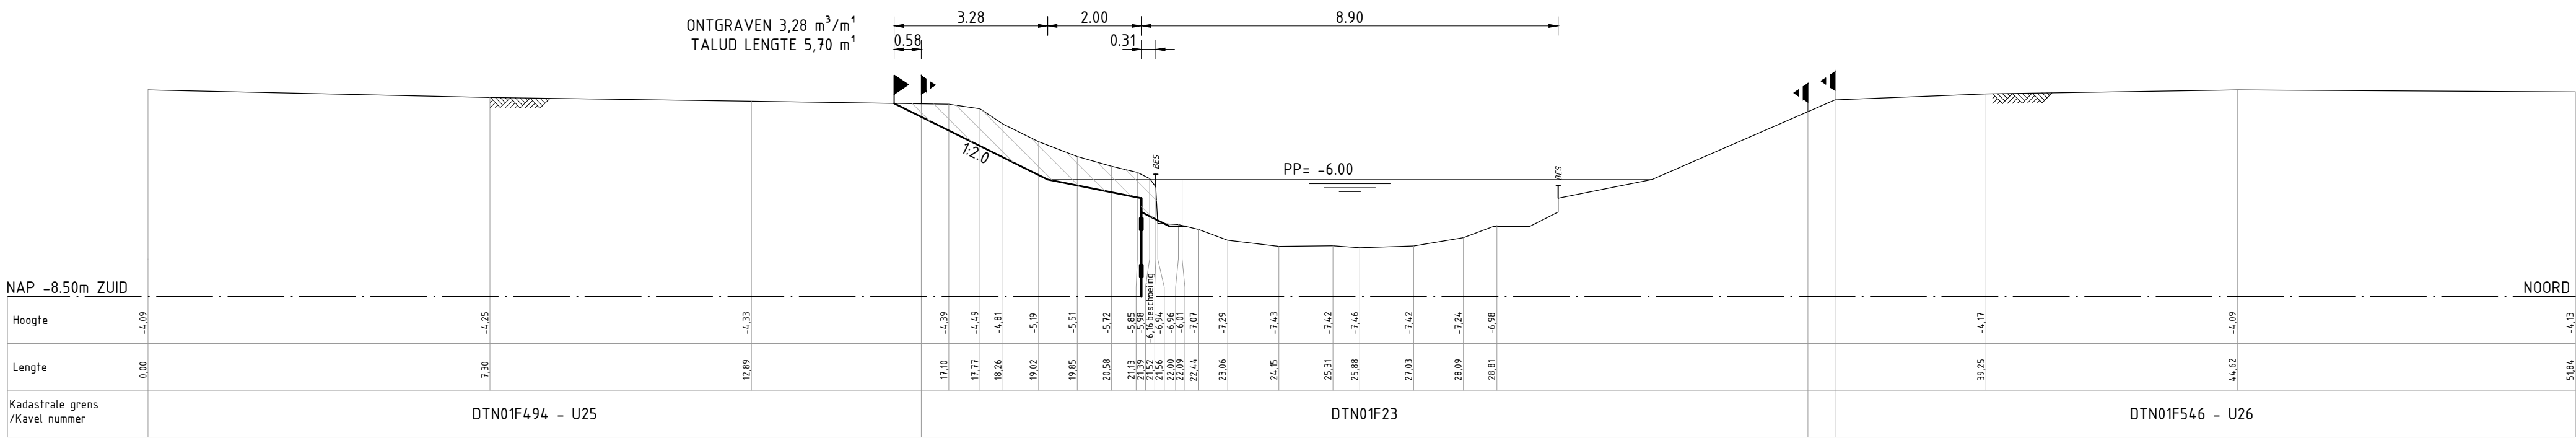

DWARSPROFIEL 5

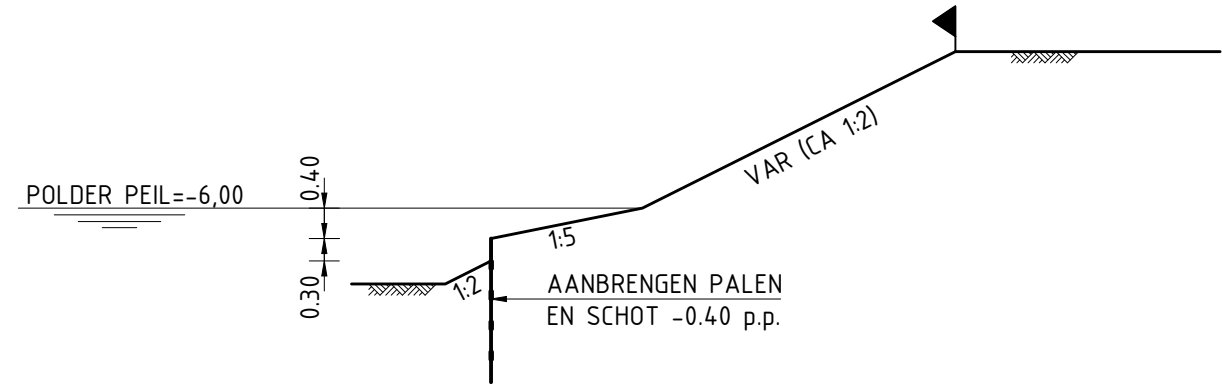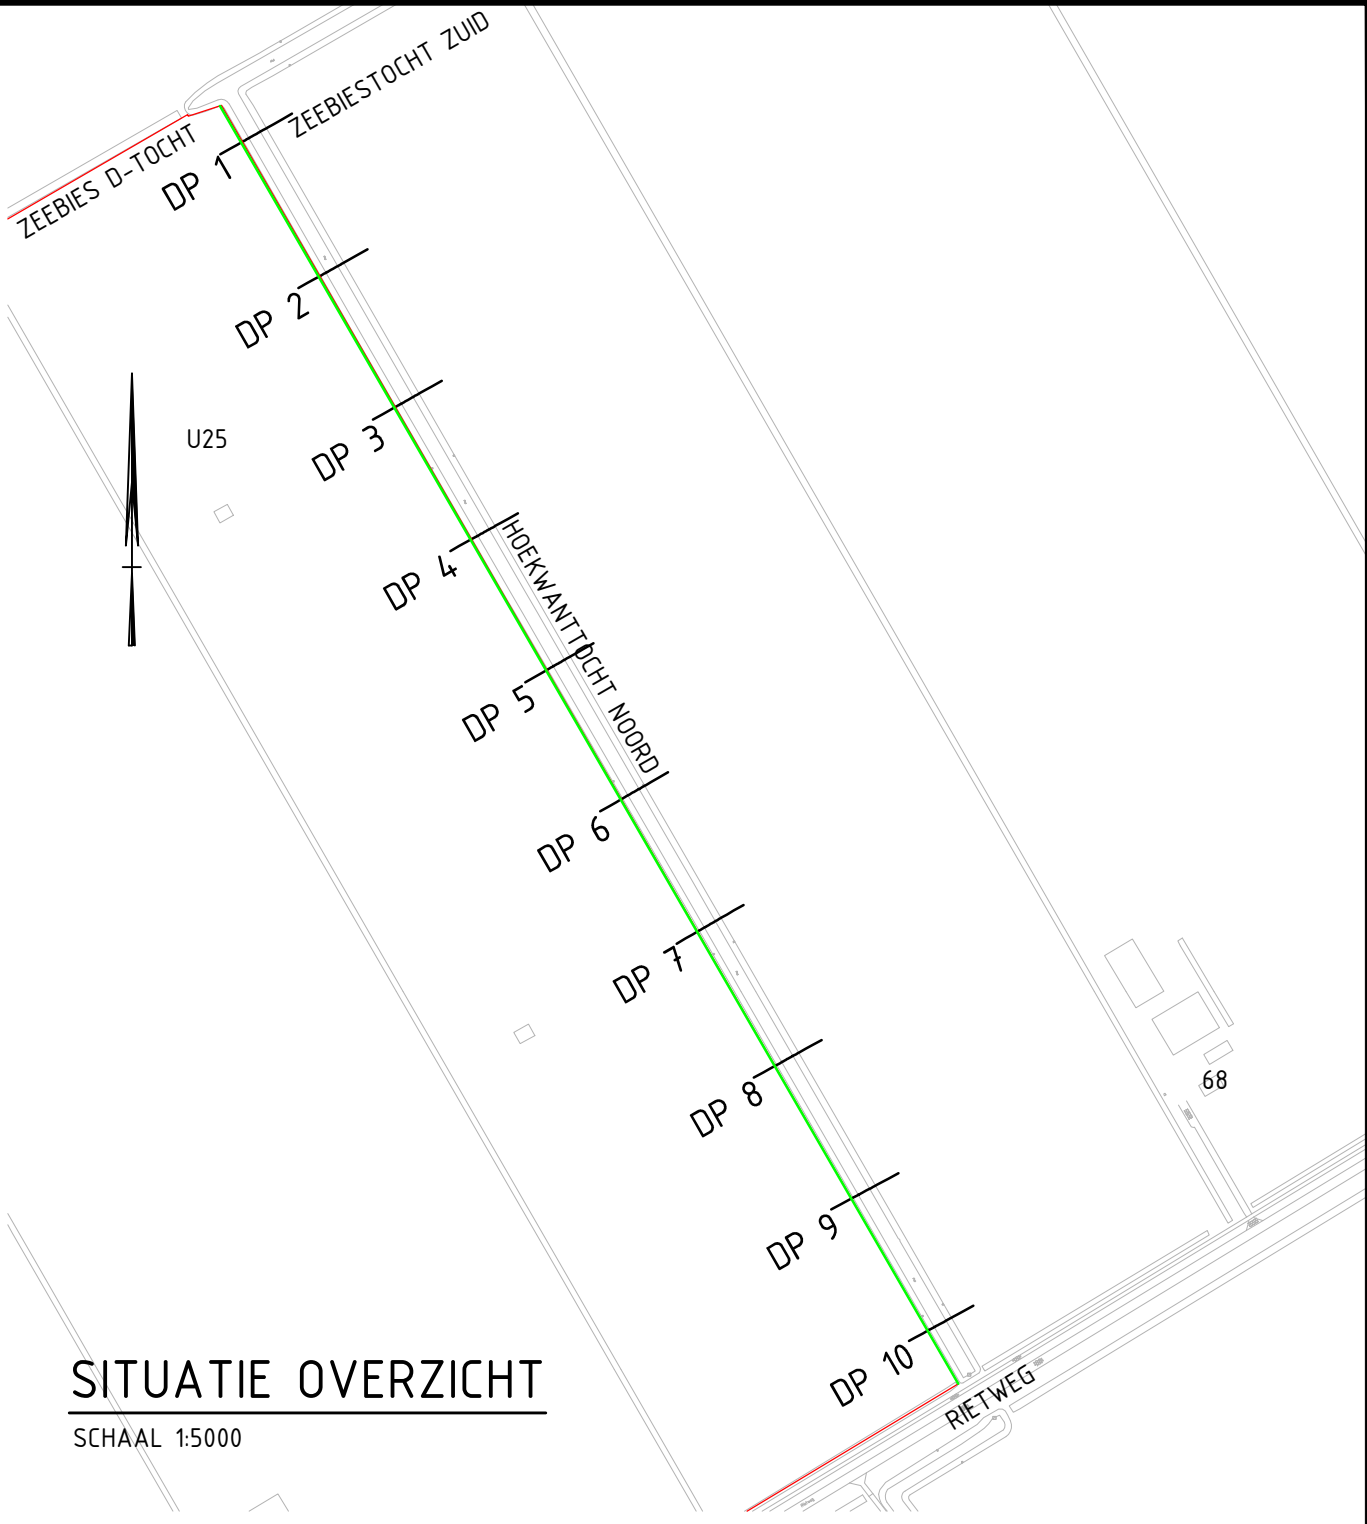


WERKZAAMHEDEN HOEKWANTTOCHT NOORD U 25				
KADASTRAAL PERCEEL / KAVELNUMMER	OPPERVLAKTE (m²) EIGENDOMSRENS/BEODGDE EIGENDOMSRENS (GRONDAANKOOP)	KAVELBREEDTE (m¹)	GEMIDDELD ONTGRAVEN (m³/m¹)	ONTGRAVEN (m³)
ZUIDELIJKE OEVER				
DTN01F494 - U25	499	976 (dp1 - dp10)	? (dp1 - dp10)	4166 8083

VERKLARING

- BGT (BGT = BASISREGISTRATIE GROOTSCHALIGE TOPOGRAFIE)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- BEODGDE NIEUWE KADASTRALE GRENS (SITUATIE)
- O41 KAVEL NUMMER (SITUATIE)
- ONTGRAVEN (PROFIELEN)
- p.p. POLDER PEIL (PROFIELEN)
- BEODGDE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- HUIDIGE KADASTRALE GRENS (PROFIELEN)
- BESTAANDE BESCHOEIING (PROFIELEN)
- NIEUWE BESCHOEIING (PROFIELEN)

MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

A	-	-	-	-	-	
0	12-01-2021	gwe	-	-	-	
Code:	Datum:	Getekend door:	Controle door:	Toezicht door:	Omschrijving:	
 WATERSCHAP ZUIDERZEE LAND				LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL.: 0320 - 274911		Adviseur/aannemer:
Project: Duurzame oevers						
Omschrijving: HOEKWANTTOCHT NOORD KAVEL U25 PROFIELEN 1 t/m 5				Status: Definitief		
Besteknummer: -				Schaal: 1:100		Fase: Projectplan procedure
Tekeningnummer: P-WG059-CI-002				Fermaat: A1		Wijz: 0
				Blad: 2		Aantal: 3



VERKLARING

- MATEN IN METERS.
HOOGTEMATEN IN METERS T.O.V. N.A.P.
HOEKEN IN 360° STELSEL.
COÖRDINATEN IN METERS, RD-STELSEL.

A	-	-	-	-
0	12-01-2021	gwe	-	-
Code:	Datum:	Gefekend door:	Controle door:	Toezicht door:
Omschrijving				
				Adviseur/aannemer:
LINDELAAN 20 8224 KT LELYSTAD TEL.: 0320 - 274911				
Project: Duurzame oeveren				
Omschrijving: HOEKWANT TOCHT NOORD KAVEL U25 PROFIELEN 6 f/m 10				Status: Definitief
Besteknummer: -				Formaat: A1
Schaal: 1:100				Wijz: 0
Tekeningnummer: P-WG059-CI-002				Blad: 3
				Aantal: 3

Deel II Contactpersoon uitvoering werken

Projectleider:
P. Vos

Waterschap Zuiderzeeland
De heer P. Vos
Lindelaan 20
8224 KT Lelystad
(0320) 274 911
duurzameoever@zuiderzeeland.nl

Bezoekadres:
Lindelaan 20
8224 KT Lelystad
