



Projectplan Waterwet

Verbreden bestaande dam met duiker langs de
N360/ Ten Boer-Ten Post

projectnr. 777

Objectcode : **KDU 012763** - Duiker

15 februari 2022

auteur(s)

R. (Reinier) Buringa

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen



Inhoud

blz.

1	Verbreiden bestaande dam met duiker.....	2
1.1	Ligging plan- en werkgebied.....	2
1.2	Beschrijving van de waterstaatswerken en knelpunten	3
1.2.1	<i>Huidige situatie</i>	3
1.2.2	<i>Nieuwe situatie</i>	5
1.2.3	<i>Werkzaamheden</i>	6
1.2.4	<i>Planning.....</i>	6
2	Effecten van het plan en de werkzaamheden	7
2.1	Watersysteem.....	7
2.2	Ecologie	7
2.2.1	<i>Overlast omgeving</i>	8
2.3	Legger en beheer en onderhoud	8
2.3.1	<i>Legger</i>	8
2.3.2	<i>Beheer, onderhoud en bediening van objecten</i>	8
3	Samenwerking en communicatie	8
4	Verantwoording.....	8
4.1	Verantwoording van keuzes in het project.....	8
4.2	Benodigde vergunningen en meldingen	8
5	Bevoegdheid en gevolgde procedure	9
5.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan.....	9
5.2	Procedure	9
6	Rechtsbescherming	9

1 Verbreden bestaande dam met duiker

Benaming van het object:

- KDU 012763

Aanleiding en doel

Oostelijk van het Westerwijtwerdermaar, tussen Ten Boer en Ten Post, bevindt zich de polder Het Anker, een landelijk gebied dat bemalen wordt door het poldergemaal Het Anker (KGM00265).

Poldergemaal Het Anker wordt in het voorjaar 2022 vervangen, e.e.a. vastgelegd middels een reeds verstrekt Projectplan Waterwet met kenmerk Z/21/051160.

Deze aanvraag betreft:

- Het verbreden van de bestaande dam en duiker, welke toegang geeft tot het perceel van het gemaal Het Anker, vanaf de Rijksweg N360.

Aanleiding is de nu smalle en onverharde toegang vanaf de Rijksweg N360. Vanwege deze smalle en onverharde dam parkeren onze medewerkers aan overzijde N360 wanneer zij het gemaal bezoeken. Dit betekent dat zij lopend de N360 oversteken om verder naar het gemaal te kunnen lopen. Wanneer we de dam verbreden en het toegangshek naar insteek van het weideperceel verplaatsen dan ontstaat er ruimte om een veilige opstelplaats/ op- en afdraaien van de N360 te realiseren. Hiertoe dient dus de duiker verlengt te worden, de dam verbreed te worden (opschuiven betonnen damligger) aanpassen hekwerken en verharden dam middels graskeien.

Binnen het vervangen van het huidige gemaal ontstaat de kans deze aanpassing van de dam mee te nemen, ten bate van een veilige toegang voor onderhoud bij het gemaal (planning: april 2022).

Dit Projectplan Waterwet is van toepassing op de volgende activiteiten:


Verbreden bestaande dam, aanpassen hekwerken, verharden dam met graskeien en het verlengen van de bestaande duiker in de dam.

1.1 Ligging plan- en werkgebied

Situering gemaal Het Anker en de toegang vanaf N360:

kadastraalnr.: BOE00 A4703

*Adres: Rijksweg, nabij 105,
9792 PC TEN POST*

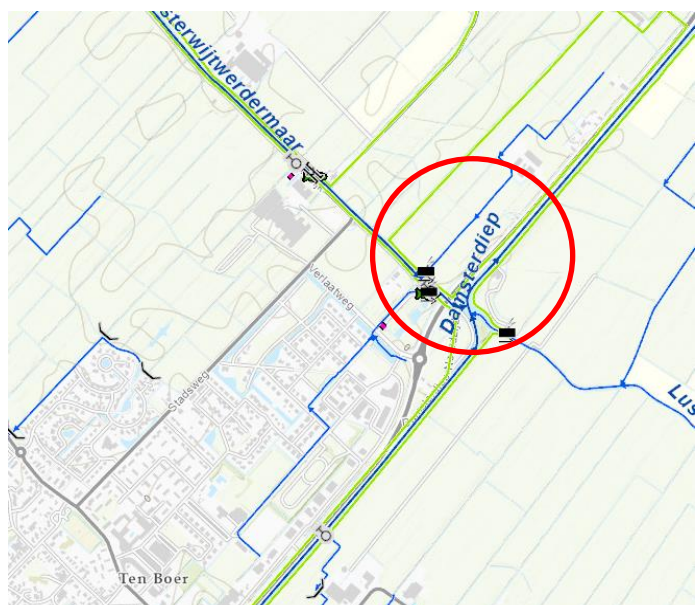

1.2 Beschrijving van de waterstaatswerken en knelpunten

1.2.1 Huidige situatie

De bestaande dam/ toegang tot gemaal Het Anker, vanuit de lucht gezien:



Huidig aanzicht vanaf de N360:





Bovenaanzicht huidige dam met duiker:




Knelpunt: geen ruimte om veilig op- en af te draaien / onveilig het gemaal te bezoeken.


1.2.2 Nieuwe situatie

Door het hekwerk naar achteren te plaatsen en de dam te verbreden, ontstaat er ruimte op de dam en daarmee overzicht en een veiligere situatie voor het op- en afdraaien N360, de rijrichting in acht genomen. Hierdoor is het oversteken van de N360 door onze medewerkers dan niet meer nodig.

Bovenaanzicht nieuwe dam met duiker:

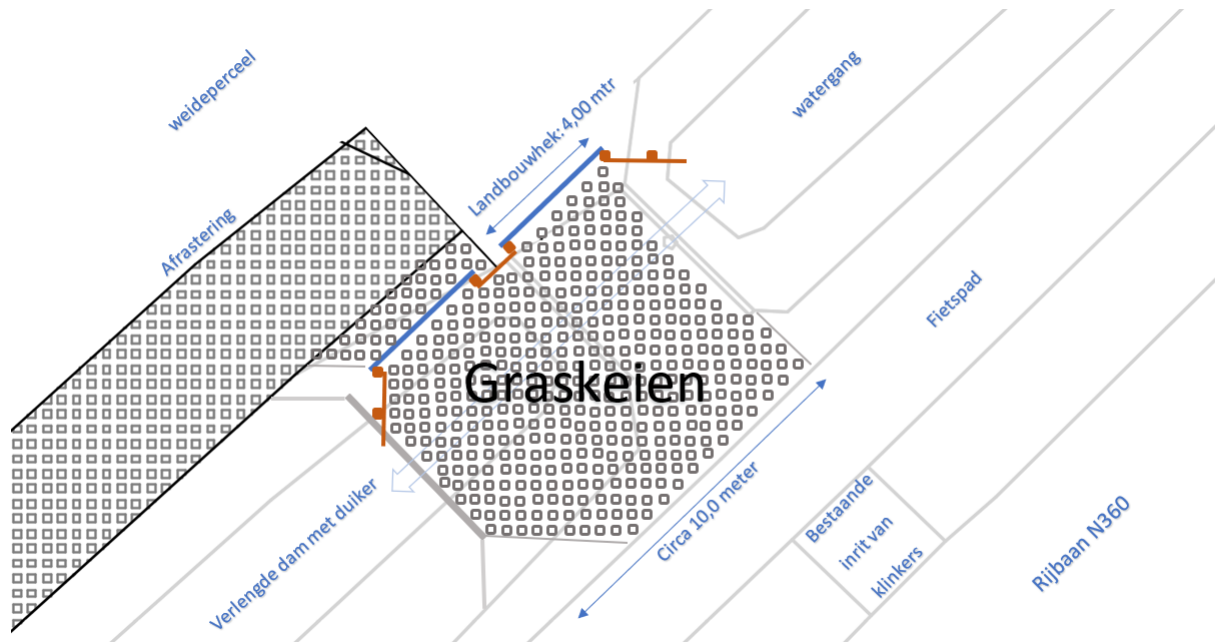

Dwarsdoorsnede van de nieuwe dam:

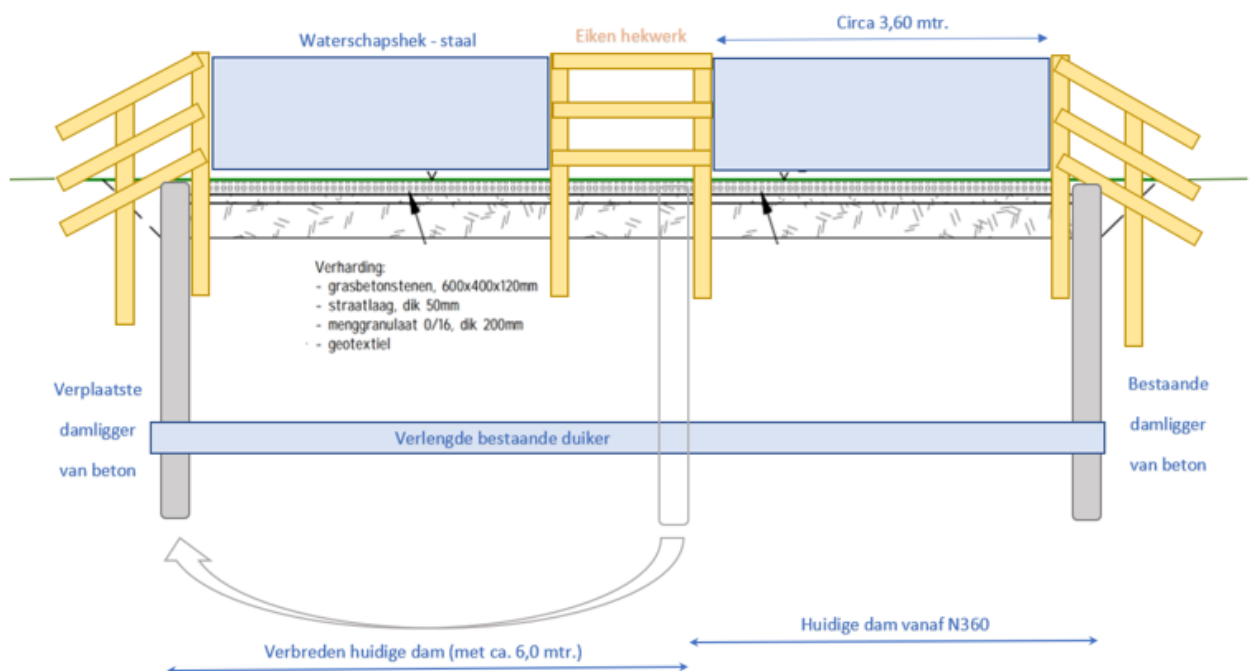



1.2.3 Werkzaamheden

Het bestaande hekwerk wordt gedemonteerd en de grond dam wordt ontgraven, zodoende de betonnen damligger te kunnen verplaatsen (hergebruik). De betonnen damligger wordt op de nieuwe positie verankerd in de taluds. De vrijgekomen duiker wordt verlengd met zelfde diepteligging, diameter en materiaal (beton of PVC). De grond dam wordt vervolgens aangevuld en het nieuwe hekwerk wordt op de perceelsgrens/ insteek sloot geplaatst. Afsluitend wordt de fundering voor de graskeien en de graskeien zelf aangebracht tussen het fietspad en het hekwerk.

1.2.3.1 Werkwijze

De werkzaamheden kunnen vanaf het weideperceel uitgevoerd worden met behulp van een mobiele/ rupskraan.

Aanvoer van materiaal zal plaats vinden vanaf de Rijksweg N360:

- Aanbrengen rijplaten in de berm tussen N360 en fietspad, ten behoeve van aanvoeren materialen (vrachtauto staat stil op de N360);
- Aanvoer grond en duiker voor dam, lossen in de dam.
- Aanvoer hekwerken, lossen op de dam;
- Aanvoer menggranulaat, lossen op de dam;
- Aanvoer zand en graskeien, lossen op de dam.

1.2.3.2 Tijdelijke verkeersmaatregelen

Om veilig langs de N360 te kunnen werken en te kunnen lossen zullen de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden:

- Snelheidsverlaging en attenderen werk in uitvoering middels tijdelijke bebording en baakschilden.

1.2.4 Planning

Vanwege de mogelijkheid tot combinatie met bouwwerkzaamheden voor het gemaal, wordt idealiter in dezelfde periode (april 2022) de realisatie van deze dam uitgevoerd.

De duur van realisatie nieuwe dam zal circa 5 werkdagen beslaan.


2 Effecten van het plan en de werkzaamheden

Beoogd effect

Het realiseren van een veiliger toegang tot gemaal en weideperceel.

2.1 Watersysteem

De dam met duiker ligt in het peilgebied Het Anker in de gemeente Groningen. De watergang langs de N360 is via de Ankertocht en het gemaal afwaterend naar de boezem/ Westerwijdwerdermaar.

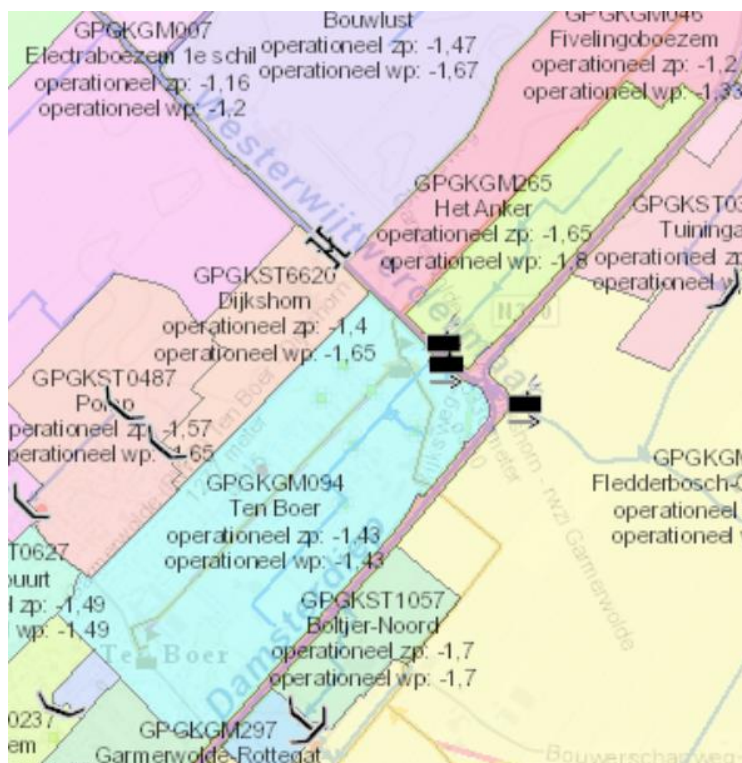

Het verlengen van de duiker en verbreden van de dam heeft geen effect op de waterhuishouding in peilgebied Het Anker. In dit peilgebied geldt een operationeel peil van -1.65 m NAP zp en -1.80 m NAP wp.

Figuur 1: peilgebieden Het Anker (geel) (bron: Geoweb)

2.2 Ecologie

Voor het vervangen van het nieuwe gemaal en de transportbewegingen via deze dam, heeft het waterschap reeds een ecologische quickscan uit laten voeren (Altenburg&Wymenga, 2021). Hieruit volgt dat er op eventueel beschermde soorten geen negatieve effecten worden verwacht van het plan en de werkzaamheden. Wel geldt de Zorgplicht.

Het waterschap stelt de eis dat bij de werkzaamheden de Gedragscode Flora en Fauna wordt nageleefd. Hiermee voldoet het waterschap aan de zorgplicht. De werkzaamheden hebben nauwelijks tot geen effect op de aquatische natuur. Het waterpeil in de watergang wordt niet gewijzigd tijdens of na de realisatie.



2.2.1 Overlast omgeving

De werkzaamheden worden tussen 7.00 en 17.00 uur uitgevoerd op werkdagen. Verkeer op de N360 zal gedurende de uitvoeringsperiode (5 dagen) met een verlaagde snelheid passeren. Aanwonenden zullen naar verwachting geen hinder ondervinden. De eigenaar en gebruiker van het weideperceel zijn akkoord met deze verbetering van de huidige dam.

2.3 Legger en beheer en onderhoud

2.3.1 Legger

Nadat het projectplan onherroepelijk is, zullen de werkzaamheden zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond vindt een oplevercontrole plaats. De nieuwe situatie zal vervolgens worden opgenomen in het beheerregister van waterschap Noorderzijlvest. Vastlegging van de nieuwe situatie zal daarna in de eerstvolgende leggerwijziging worden meegenomen.

2.3.2 Beheer, onderhoud en bediening van objecten

De grond van de dam is en blijft eigendom van de Provincie Groningen. Met haar is een vergunning in afstemming voor verbreding van deze dam. Voorwaarde van de Provincie Groningen is dat de gebruikers (Waterschap en perceeleigenaar weidegrond) zorg dragen voor het onderhoud aan de dam, duiker, verhardingen en hekwerken.

3 Samenwerking en communicatie

De werkzaamheden zijn binnen het waterschap besproken met de verantwoordelijken voor het peil- en objectbeheer; op basis hiervan zijn de ontwerpen gemaakt zoals omschreven in dit projectplan (par 1.2).

Het waterschap heeft tijdens de voorbereiding overleg gevoerd met de Provincie Groningen en grondeigenaar/gebruiker van de dam.

4 Verantwoording

4.1 Verantwoording van keuzes in het project

De primaire aanleiding voor verbreden van de dam is het realiseren van een veilige toegang voor onze medewerkers. Uit overleg met deze medewerkers en de perceeleigenaar kwam het ontwerp van par 1.2 als beste ontwerp naar voren om een veilige opstelplaats/ op-/ afdraaien N360 te realiseren.

4.2 Benodigde vergunningen en meldingen

Voor dit plan en deze werkzaamheden dient een projectplan Waterwet te worden vastgesteld.

Het waterschap heeft het ontwerp voor de dam besproken met de Provincie Groningen. De Provincie heeft aangegeven dat voor deze realisatie een vergunning aangevraagd dient te worden bij het Juzaloket.



5 Bevoegdheid en gevolgde procedure

5.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

5.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

6 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepsschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
