

Projectplan automatisering stuw KST00456 (stuw Hultenseweg – Gilze)

1. Aanleiding

Met het werkprogramma DHZ (2015) hebben de waterbeheerders in Noord-Brabant en Limburg een gezamenlijke ambitie uitgesproken om zoet water op de zandgronden langer vast te houden om daarmee klimaatrobuster te zijn in de toekomst. In dit kader zijn de stuwen in vrij afwaterend gebied belangrijke beheerobjecten van het waterschap om meer water te conserveren en daarmee de beschikbaarheid van water te vergroten.

Op de zandgronden gelden geen vaste waterpeilen (geen peilbesluit), maar wordt gewerkt met streefpeilen. Theoretisch geeft het werken met streefpeilen de peilbeheerders meer flexibiliteit om in te kunnen spelen op de actuele situatie en weersvoorspellingen. In de praktijk wordt er echter onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden, omdat:

- het in veel gevallen ontbreekt aan personele capaciteit, de juiste infrastructuur en een goede ontsluiting van beslisdata;
- er geen heldere afwegingscriteria zijn om samen met gebruikers meer water vast te kunnen houden en omdat het risico op wateroverlast vaak groter wordt ingeschat dan de schade door watertekorten.

Het watersysteem kan onder andere klimaatrobuster worden gemaakt door stuwen te automatiseren. Het automatiseren van deze stuwen is onderdeel van een bredere afweging op gebiedsniveau. Het waterschap heeft voor stuw Hultenseweg (KST00456) bepaald dat aanpassen en/of automatiseren geldt als “altijd-goed maatregel” en snel kan worden uitgevoerd. Een belangrijke randvoorwaarde van de gebruikers/agrariërs is hierbij wel dat snel geanticipeerd moet kunnen worden op veranderende omstandigheden zodat hogere stuwpeilen niet resulteren in meer of sneller schade door grote hoeveelheden neerslag.

2. Ligging locatie en huidige situatie

De stuw die wordt geautomatiseerd en/of constructief aangepast, ligt in Gilze (zie figuur 1). In tabel 1 zijn de omschrijvingen en de coördinaten van de betreffende stuw opgenomen.


Tabel 1: Locaties van de stuw

Leggercode	Omschrijving stuw	A-water	X-coördinaat	Y-coördinaat
KST00456	Stuw Hultenseweg	OVK0174	124915,95	395785,00

De stuw bevindt zich op hogere zandgronden in vrij afwaterend gebied. In tabel 2 zijn de leggergegevens van de stuw opgenomen.

Tabel 2: Huidige leggergegevens van de stuw

Leggercode	Doorlaatbreedte	Kruinhoogte min.	Regelbaarheid	Soort stuw
KST00456	2,50m	NAP+9,20m	handbediend	kantelstuw

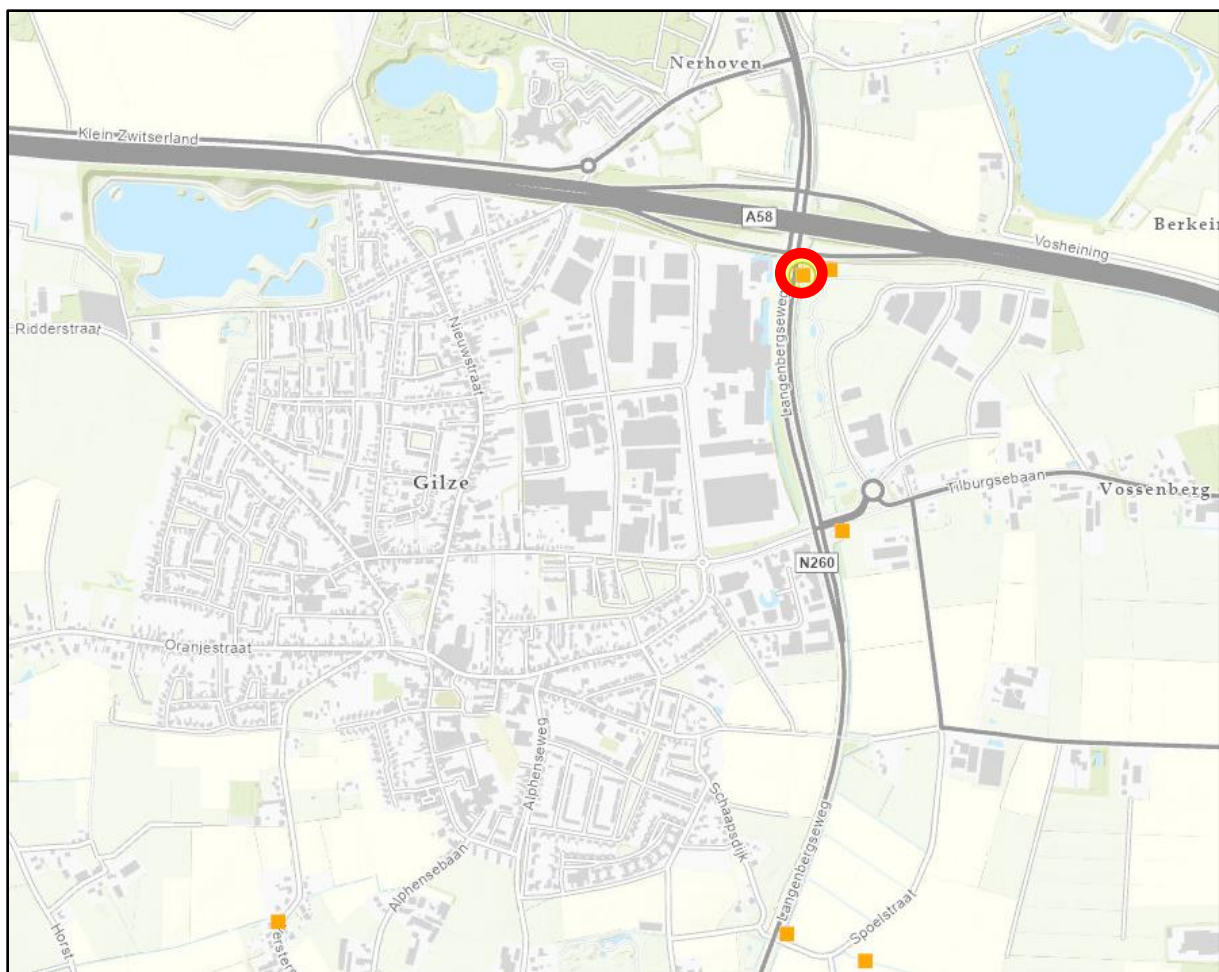

Figuur 1: Topografische kaart met locatie van de stuw

3. Toekomstige situatie

De betreffende stuw wordt geautomatiseerd en/of constructief aangepast en deze aanpassingen resulteren in een wijziging van de legger. De toekomstige situatie wordt conform tabel 3 vastgelegd in de legger.

Tabel 3: Toekomstige leggergegevens van de stuw

Leggercode	Doorlaat-breedte	Minimale kruinhoogte	Maximale kruinhoogte	Regelbaarheid	Soort stuw
KST00456	2,50m	NAP+9,20m	NAP+10,20m	automatisch	kantelstuw

Buiten de automatisering van de stuw, verandert de waterhuishoudkundige situatie niet. Wel ontstaat door de aanpassingen de mogelijkheid om zoet water op de zandgronden langer vast te houden en flexibeler in te kunnen spelen op de actuele situatie en weersvoorspellingen. Het voorkomen van wateroverlast of -schaarste wordt eenvoudiger na aanpassing van de stuw, dit moet worden geborgd door (automatische) bediening van de stuw. De locatie van de stuw wijzigt niet.

Het ontwerp van de stuw is hydrologisch getoetst door de hydroloog van het waterschap. Hiermee is gewaarborgd dat de aanpassing van de stuw niet resulteert in hydrologische knelpunten, maar juist leidt tot een waterhuishoudkundige verbetering. Bij het ontwerp van de stuw is rekening gehouden met het toekomstig beheer en onderhoud; de stuwen zijn goed en veilig bereikbaar voor onderhoudsmaterieel. Het bouwkundig onderhoud van de stuwen blijft ongewijzigd.

4. Wettelijk kader en procedure

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van artikel 5.4 van de Waterwet. Ingevolge artikel 5.4, eerste lid van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De Waterwet kent de volgende drie doelstellingen:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als gevolg van de aanpassing van de stuwen kan beter worden ingespeeld op behoeften en op weersvoorspellingen, zodat wateroverlast en –schaarste beter voorkomen kan worden.

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van procedureregels uit de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt gebruik gemaakt van de reguliere vaststellingsprocedure; het ontwerp-projectplan wordt vastgesteld, waarna het projectplan gedurende 6 weken ter inzage ligt en belanghebbenden de kans hebben om bezwaar te maken (en eventueel beroep in te stellen).

Uit bijlage 1 van de Crisis- en herstelwet blijkt dat deze wet op dit project van toepassing is. Dit betekent dat de bestuursrechter na afloop van de beroepstermijn van 6 weken na vaststelling van het projectplan, eventueel ingediende beroepen moet hebben behandeld en vervolgens binnen 6 maanden uitspraak moet hebben gedaan.

4.1 Keur waterschap Brabantse Delta 2015

In de Keur van waterschap Brabantse Delta zijn regels opgenomen voor het onderhoud van watergangen om de waterafvoer in oppervlaktewateren te beschermen (artikel 3.1). In het ontwerp en bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beleidsregels van het waterschap vanuit de Keur in acht genomen. De relevante beleidsregels zijn te vinden in Beleidsregels voor waterkering, waterkwaliteit en grondwater.

4.2 Beleidsregels waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater

In de Keur van waterschap Brabantse Delta zijn geboden en verboden opgenomen ten aanzien van werkzaamheden in het watersysteem. De "Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater" geven richtlijnen voor werkzaamheden, die zijn vertaald in het ontwerp van de stuwen en in de beoogde uitvoering van de werkzaamheden. Hiermee is geborgd dat er geen nadelige effecten zijn op de waterhuishouding (hydrologie en onderhoud) en dat er geen nadelige gevolgen optreden voor derden en lokale waarden. De gehanteerde richtlijnen volgen uit de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 1: Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam;
- Beleidsregel 3: Werken en objecten in de watergang en beschermingszone;
- Beleidsregel 7: Kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen;

4.3 Legger Brabantse Delta

De legger bevat specifieke informatie over het watersysteem en de waterkeringen. De ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken worden in de legger vastgelegd. Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs watergangen en waterkeringen en over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. De legger is op de website van Brabantse Delta in te zien.

4.4 Wijziging legger Waterschap Brabantse Delta

Door aanpassingen aan de stuw (zoals in dit Projectplan omschreven) is het noodzakelijk de legger te wijzigen. Na uitvoering van het project wordt de stuw ingemeten en wordt de legger aangepast, conform de uiteindelijke maatvoering zoals opgenomen in de revisietekening. Dit Projectplan vormt tevens de onderbouwing voor de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd. Voor de partiële herziening van de legger wordt een procedure opgestart die inspraak mogelijk maakt. De wijziging van de legger gebeurt conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

5. Belanghebbenden

In de nieuwe situatie ondervinden aangrenzende eigenaren naar verwachting geen negatieve effecten van de beoogde aanpassingen. Door de aanpassingen kan beter en sneller worden geanticipeerd op de actuele situatie en weersvoorspellingen, resulterend in positieve gevolgen voor aangrenzende grondeigenaren (agrariërs). Verder worden de belangen van de aangrenzende grondeigenaren meegenomen in de uitvoering (m.n. de uitvoeringsperiode).

6. Rechtsbescherming

Aangezien de kans op bezwaren door belanghebbenden minimaal wordt geacht, wordt voor het aanpassen van de stuwen de verkorte ("reguliere") vaststellingsprocedure doorlopen. Deze procedure is als volgt;

- het Projectplan Waterwet wordt vastgesteld door het dagelijks Bestuur van het waterschap (gemandateerd aan de teammanager Vergunningen);
- na vaststelling van het projectplan, wordt dit besluit bekendgemaakt;
- het Projectplan Waterwet ligt gedurende zes weken ter inzage en gedurende deze termijn kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt;
- eventuele bezwaren worden behandeld door de bezwarencommissie;
- de bezwarencommissie geeft advies en dit advies wordt doorgaans door het waterschap overgenomen;
- de bezwaarmaker kan eventueel bij de rechtbank beroep instellen tegen de "Beslissing op bezwaar";
- voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd;
- tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep door de bezwaarmaker hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Breda, 6 januari 2022

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager Vergunningen



mr. B.P. de Jong

Bijlage I: Ontwerptekeningen
