



Vervangen Leuringsstuw KST0937

Auteur(s)

Beheer WSWV



Voor



na

Opdrachtgever

Waterschap Noorderzijlvest

Postbus 18

9700 AA Groningen

Datum vrijgave	Status	Revisie	
03-05-2022	Definitief	1	



Inhoud

blz.

1	Vervangen Schotbalkstuw	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging schotbalkstuw	3
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken	4
1.4	Beschikbaarheid gronden	4
1.5	Effecten van de schotbalkstuw	4
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	4
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	4
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering</i>	<i>5</i>
1.1.1	<i>Nadeelcompensatie</i>	<i>5</i>
1.8	Legger en beheer en onderhoud	5
1.8.1	<i>Legger</i>	<i>5</i>
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	<i>5</i>
1.9	Samenwerking	5
2	Verantwoording	5
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid	5
1.1.2	<i>Toets beleid waterschap</i>	<i>6</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project	6
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen	6
3	Bevoegdheid en gevolgde procedure	7
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan	7
3.2	Procedure	7
4	Rechtsbescherming	8



1 Vervangen Schotbalkstuw

1.1 Aanleiding en doel

Door dat de doorgang van de stuw verstoppt is geraakt is het talud weggespoeld en zo heeft de stuw zijn functie verloren. Na inspectie is er voor gekozen om de stuw in zijn geheel te vervangen en wel zo dat deze niet weer verstoppt kan raken of voor overlast gaat zorgen.

1.2 Ligging schotbalkstuw

De stuw bevindt zich in hoofdwaterring Leuringsriet in Tolbert.



Figuur 1. locatie van de vervangen Leuringsstuw KST0937 (omcirkeld in rood)



1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De Leuringsstuw KST0937 is een vaste stuw/overlaat met een vast peil van peilgebied Lage Riet - 0.36m NAP.


1.4 Beschikbaarheid gronden

De hoofdwatgang is in kadastraal eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. De aangrenzende percelen LEE01H4918 en LEE01H4914 zijn niet in kadastraal eigendom van Noorderzijlvest. Een strook aan de oostkant van de water op perceel LEE01H4918 is gebruikt voor de aanvoer van materiaal en materieel. Daarvoor is tijdelijk een rijbaan met stalen rijbaanplaten aangelegd.

1.5 Effecten van de schotbalkstuw

Door het vervangen van de huidige schotbalkstuw wordt de waterbeheersing hersteld en voorkomen dat het bovenstrooms gelegen gebied leeg blijft lopen.

Er is voor gekozen om de doorgang te vergroten van 1100mm naar 1500mm en ook de bovenste balk weg te laten om verstopping in de toekomst te voorkomen en zo de doorstroom te borgen. De afmetingen van de nieuwe schotbalkstuw zijn zoals opgenomen in de bestektekening hieronder en in de bijlage

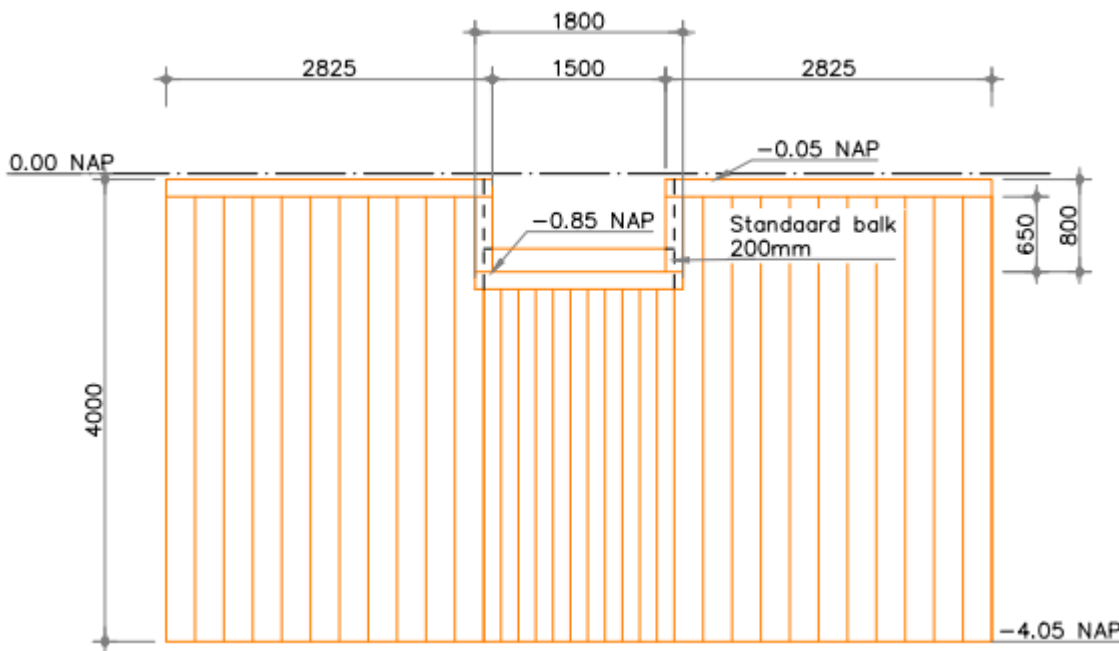

Figuur 2. bestektekening nieuwe schotbalkstuw

1.6 Wijze waarop het werk werd uitgevoerd

Ter plaatse is de watgang dicht gezet met schotten om in den droge te kunnen werken. Overtollig water is via hoofdwatgang de Riet bij Niebert geleid. Dit is afgestemd met de peilbeheerder

1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

1.7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

De waterhuishouding zal alleen maar beter worden in de nieuwe situatie. In perioden met veel waterbezwaar



kan dit water goed afgevoerd worden.

Naast het verbreden van de overlaat is er ook voor gekozen om de stuw iets verder bovenstrooms te plaatsen (circa 4 meter) om zo te voorkomen dat de nieuwe stuw opnieuw in een laagte wordt aangelegd.

1.7.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering*

In overleg met de aangrenzende eigenaar en om het waterpeil zo snel mogelijk weer te kunnen hanteren is het project reeds uitgevoerd. Dit is in overleg met perceeleigenaren gedaan.

1.1.1 *Nadeelcompensatie*

n.v.t

1.8 Legger en beheer en onderhoud

1.8.1 *Legger*

Het object, type, materiaal van de deelconstructies en hoofdconstructie en afmetingen van nieuwe schotbalkstuw worden na realisatie opgemeten door een landmeter en opgenomen in het beheerregister van Noorderzijlvest. De hoofdconstructie en afmetingen worden vervolgens in de legger opgenomen.

1.8.2 *Beheer en onderhoud*

Het beheer en onderhoud van het waterstaatwerk wijkt na vervanging niet af van de huidige situatie. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de nieuwe schotbalkstuw berust bij waterschap Noorderzijlvest.

1.9 Samenwerking

Het werk is in opdracht van waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door Macadam B.V. Bakkeveen. De aangrenzende eigenaren zijn voor de uitvoering van het werk op de hoogte gesteld bij aanvang van het werk.

2 Verantwoording

2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) waaronder:

- Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en die voor toepassing in de grond-, wegen- en waterbouw geschikt zijn.

2.2 Verantwoording op basis van beleid



1.1.2 Toets beleid waterschap

Beleid van het waterschap is onder andere onderhoud van kunstwerken, waarvan het beheer een eigendom bij het waterschap ligt, in geval de onderhoudsstaat dat aangeeft.

2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

De aanleiding tot het vervangen van de Leuringssluw KST0937 is dat de schotbalksluw geen goede waterbeheersing in het bovengenoemde gebied meer kan garanderen omdat de wal kant is weggespoeld.

2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

n.v.t.



3 Bevoegdheid en gevolgde procedure

3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 5610. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruik making van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

3.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.

