

Projectplan Waterwet

*Aanleg schepplek Oude Maasweg;
Koningsvliet, nabij gemaal Gansoijen*



Inhoud

Leeswijzer	3
DEEL I: Aanleg schepplek Oude Maasweg, Koningsvliet	4
1 Aanleiding en doel	4
2 Locatie	4
3 Beschrijving van de waterstaatswerken	5
4 Beschikbaarheid gronden	5
5 Effecten van het plan	6
6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	6
7 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	7
8 Legger, beheer en onderhoud	7
9 Afstemming	7
DEEL II: VERANTWOORDING	8
1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	8
2 Verantwoording op basis van beleid	8
3 Verantwoording van de keuzen in een project	8
4 Benodigde vergunningen en meldingen	8
DEEL III: RECHTSBESCHERMING	10
Projectplan	10
Bezwaar	10
Voorlopige voorziening	10
Bijlage: Stappenplan Handreiking	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Leeswijzer

Het projectplan bestaat uit vier delen.

- In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd.
- Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan.
- Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures.

DEEL I: Aanleg schepplek Koningsvliet

1 Aanleiding en doel

Op grond van artikel 5.4 Waterwet is het verplicht om een projectplan vast te stellen voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. Dit projectplan beschrijft de aanleg van een schepplek langs onze Koningsvliet.

In de Koningsvliet net voor ons gemaal Gansoijen hebben we een drijflijn t.b.v. afvangen drijfvuil, zodat dit niet bij het gemaal terecht komt. Dit drijfvuil moet regelmatig voor de drijflijn weg geschept worden door een kraan. Deze kraan staat dan in de berm van de Oude Maasweg, gemeente Waalwijk.

Het regelmatig in deze berm opstellen van de kraan veroorzaakt schade aan zowel de berm als ons talud, dit wordt door gemeente Waalwijk als overlast ervaren. Bovendien is het niet veilig omdat de kraan zich in de modderige berm opstelt, en glijden een reëel risico is.

Door het inrichten van een opgesloten verharding op deze berm is het opstellen van een kraan veilig, en ontstaat geen schade aan de berm en talud.

2 Locatie

De aan te leggen schepplek is gelegen aan de Oude Maasweg. Deze is aanwezig in de Koningsvliet ten westen van het Drongelens kanaal en ten zuiden van de Maas.




Figuur 1: Locatie (rode cirkel)

3 Beschrijving van de waterstaatswerken

Langs de Koningsvliet zal een houten keerwand over een lengte van 30 m1 worden aangebracht t.b.v. opsluiting verharding, en als wand waartegen het vuil opgescheept kan worden. Zie figuur 2 voor de overgang die ontstaat als een keerwand in het waterlichaam is aangebracht.

211045P0010 (10-12-2010)



Figuur 2, dwarsprofiel waterloop met damwand aan een zijde.

4 Beschikbaarheid gronden

De werkzaamheden vinden plaats op grond in eigendom van het waterschap.




Figuur 3: Perceel waterschap 548 (locatie te plaatsen damwand oranje lijn)

5 Effecten van het plan

Geen effect want voor ecologie is het maar een kleine onderbreking en voor doorstroming ook geen effect omdat profiel van Koningsvliet hier al overbemeten is en een damwand niet begroeid raakt.

Oever:

In principe wordt de gehele zone van beneden insteek naar boven insteek van een waterlichaam als oever aangemerkt. Een deel van de oever bevindt zich onder water (aquatische zone) en een deel bevindt zich boven water (terrestrische zone). Het tussenliggende deel, de overgang van water naar land, wordt aangeduid als amfibische zone. Zie figuur 4.

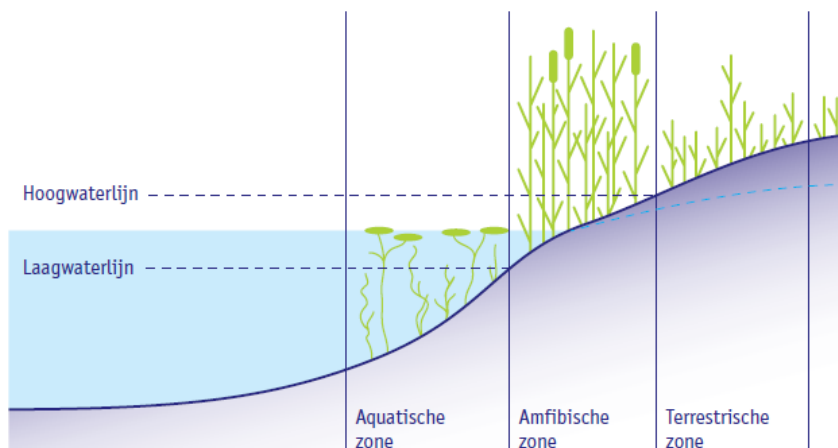

Figuur 4, oeverzones. bron STOWA2011-19

Grondkering:

Een grondkering is een constructie om een hoogte verschil in maaiveld te overbruggen zonder talud. Dergelijke constructies worden toegepast in situaties waarbij er onvoldoende ruimte is om een talud aan te leggen of om in situaties waar een talud niet gewenst is.

Beleid oeeververdediging:

Beleid van het waterschap (beleid oeeververdediging, vastgesteld mei 2010) is dat oevers van waterlopen zoveel mogelijk natuurlijk zijn ingericht. Reden hiervoor is dat dergelijke oevers bijdragen aan de veerkracht en gezondheid van het watersysteem. De min of meer geleidelijke overgang van land naar water vergroot het zelfreinigend vermogen van het watersysteem, biedt leefruimte, voedsel en bescherming aan allerlei planten en dieren en vormt een buffer voor allerlei activiteiten die buiten het watersysteem plaatsvinden. Bovendien zijn zij in de aanleg goedkoper, milieuvriendelijker en duurzamer dan een harde oever.

De belangrijkste effecten die getoetst dienen te worden:

- Werken in of op a-wateren kunnen worden toegestaan als er geen probleem voor de doorstroming en benodigde bergingscapaciteit ontstaat en de huidige en toekomstige wijze van uitvoeren van onderhoud niet wordt verzwaard of gehinderd.
- Bij werken in a-wateren wordt getoetst op het effect op de vastgestelde natuurwaarden. Negatieve effecten op deze natuurwaarden worden niet toegestaan.
- Een werk of object mag de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone niet negatief beïnvloeden.

6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Na vaststelling van het projectplan Waterwet wordt de schepplek aangelegd.

Stapsgewijs vinden de volgende werkzaamheden plaats:

- Aanbrengen damwanden.
- Aanvullen talud met grond.
- Aanbrengen verharding, betonplaten 200x200 cm.
- Inzaaien terrein na gereedkomen grondwerk.

7 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

Beperken nadelige gevolgen van het plan en van de uitvoering

Ter beperking van de nadelige gevolgen van het plan tijdens de uitvoering zijn de volgende maatregelen voorzien:

- Er wordt gewerkt volgens de gedragscode Flora en faunawet.
- Indien aan de orde zal er een werkplan, veiligheid & gezondheidsplan en/of een uitvoeringsplan worden opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het werk met in achtneming van de veiligheid voor de omgeving. Dit betreft met name tijdens transport en levering van de vispassage en hijswerkzaamheden op de projectlocatie.

Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de website www.aaenmaas.nl.

8 Legger, beheer en onderhoud

Legger

De schepplek wordt op dezelfde locatie als de huidige schepplek aangelegd. Na uitvoering worden de verharding en damwanden ingemeten in een profiel. De leggerkaarten worden aangepast. Via www.aaenmaas.nl/legger worden de wijzigingen gepubliceerd.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de schepplek bestaat hoofdzakelijk uit periodieke controle en het ongedaan maken van vervuiling.

9 Afstemming

Om toegang te krijgen tot de locatie van de opstelplaats dient over grond dat niet in eigendom van het waterschap gereden te worden. De betreffende eigenaar/eigenaren worden geïnformeerd over dit plan en waar nodig worden afspraken gemaakt in verband met de uitvoering. Voor de aan te leggen verharding in berm loopt een vergunningaanvraag bij de gemeente Waalwijk.

DEEL II: VERANTWOORDING

1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de ecologische toestand van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. In de richtlijn is een indeling gemaakt in stroomgebieden. Het gebied van waterschap Aa en Maas valt onder het stroomgebied Maas. Waterbeheerders en overheden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorvertalen van de KRW doelstelling in het eigen beleid en in concrete maatregelen om de toestand van het watersysteem op orde te krijgen. Onderhavig projectplan doet geen afbreuk aan de ecologische toestand van de betreffende watergang omdat het een zeer lokale ingreep betreft.

2 Verantwoording op basis van beleid

Indien de vergunningaanvraag een keerwand betreft die niet als oeverbescherming kan worden aangemerkt (en dus een grondkering betreft), dient er getoetst te worden aan BR 3 “werken en objecten in de watergang en beschermingszone” en BR 6 “Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen”.

Hiervoor gelden de volgende toetscriteria:

BR3

Mag geen negatief effect hebben op de doorstroming

Mag niet ten koste gaan stabiliteit talud (betreft een nader specificatie van mag geen negatief effect hebben op de doorstroming)

Mag niet huidige of toekomstige wijze van onderhoud verzwaken of hinderen

Mag geen negatief effect hebben op de vastgestelde natuurwaarden

3 Verantwoording van de keuzen in een project

De locatie en voorziening blijft op dezelfde locatie, echter word de inrichting aangepast in kader van veiligheid, en beperken overlast.

4 Benodigde vergunningen en meldingen

Het betreft wijzigingen aan het watersysteem die via dit projectplan gereguleerd worden.

Mogelijke noodzakelijke omgevingsvergunning(en) worden separaat aangevraagd bij gemeente Waalwijk.

DEEL III: RECHTSBESCHERMING

Projectplan

Dit projectplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na bekendmaking.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het projectplan bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u zowel schriftelijk als digitaal indienen.

- Digitaal: Op de website van waterschap Aa en Maas treft u het formulier Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan. Het bezwaar kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien een online bezwaarschrift niet door middel van dit formulier wordt ingediend.
- Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch.

Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Uw bezwaarschrift moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, uw handtekening en het zaaknummer.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage 1, tekening schepplek

