


## PROJECTPLAN:

### OPVAART JELLUM (KR038-004 T/M KR038-008).

Besluit aanleg of wijziging van een Waterstaatswerk: artikel 5.4 Waterwet, in combinatie met het Leggerbesluit:

- artikel 5.1 Waterwet – vastlegging ligging, afmeting, vorm en constructie van de waterstaatswerken
- artikel 78 lid 2 Waterschapswet – toewijzing onderhoud waterstaatswerken

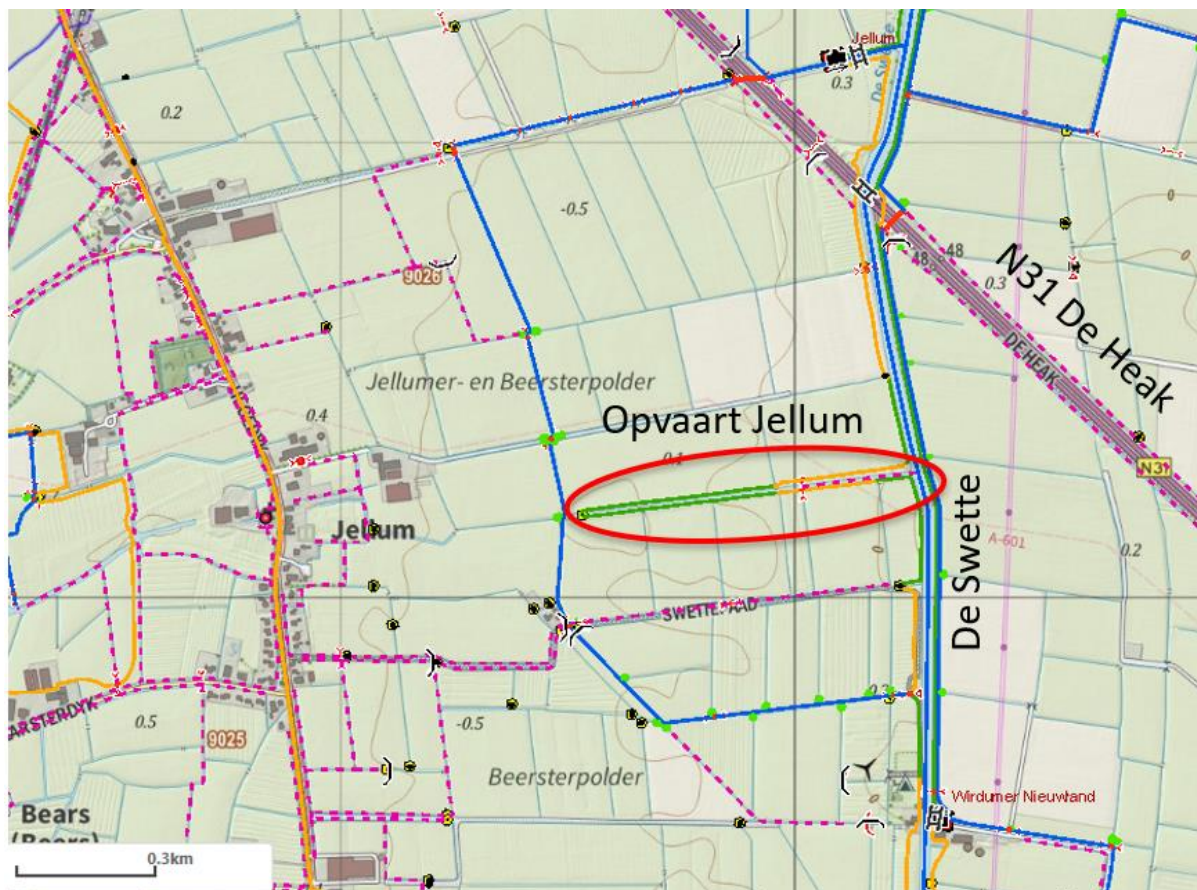

Datum:  
OW nummer:  
Projectleider:

17-03-2023  
OW.13901  
Libbe Zijlstra


## Inhoud

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Aanleiding en doel besluitvorming .....                                                      | 3  |
| 2. Juridische status Projectplan .....                                                          | 4  |
| 3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming .....                                      | 5  |
| 4. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken (besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet).....  | 6  |
| A. Aan te leggen, te wijzigen waterstaatswerken t.p.v. opvaart Jellum (KR038-004 t/m 008) ..... | 7  |
| 5. Motivatie, onderbouwing van het besluit .....                                                | 9  |
| 6. Benodigde zakelijke rechten .....                                                            | 9  |
| 7. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan .....                     | 9  |
| 7.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:.....                                                     | 9  |
| 7.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt. ....                    | 10 |
| 8. Uitvoering, planning van het werk.....                                                       | 11 |
| 9. Procedure (rechtsbescherming) .....                                                          | 11 |
| Bijlage 1 Leggerblad.....                                                                       | 13 |

## 1. Aanleiding en doel besluitvorming

Op basis van het "Waterbeheerplan 2022-2027 Wetterskip Fryslân" en de "Werkwijze opvaarten", vastgesteld door het DB 19 november 2019, onderdeel "Verbeterprogramma Oevers en Kaden", worden de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken gewijzigd. De wijziging vindt plaats, omdat het waterstaatswerk, zijnde een regionale waterkering (RWK), niet voldoet aan de door de provincie vastgestelde hoogte en/of stabiliteitsnorm. De onderhavige RWK hebben de veiligheidsklasse 3 (IPO norm). Dit betekent dat de RWK een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar hebben.

Dit Projectplan betreft de RWK ten oosten van Jellum, gemeente Leeuwarden:  
Zie voor de ligging van het traject afbeelding 1.

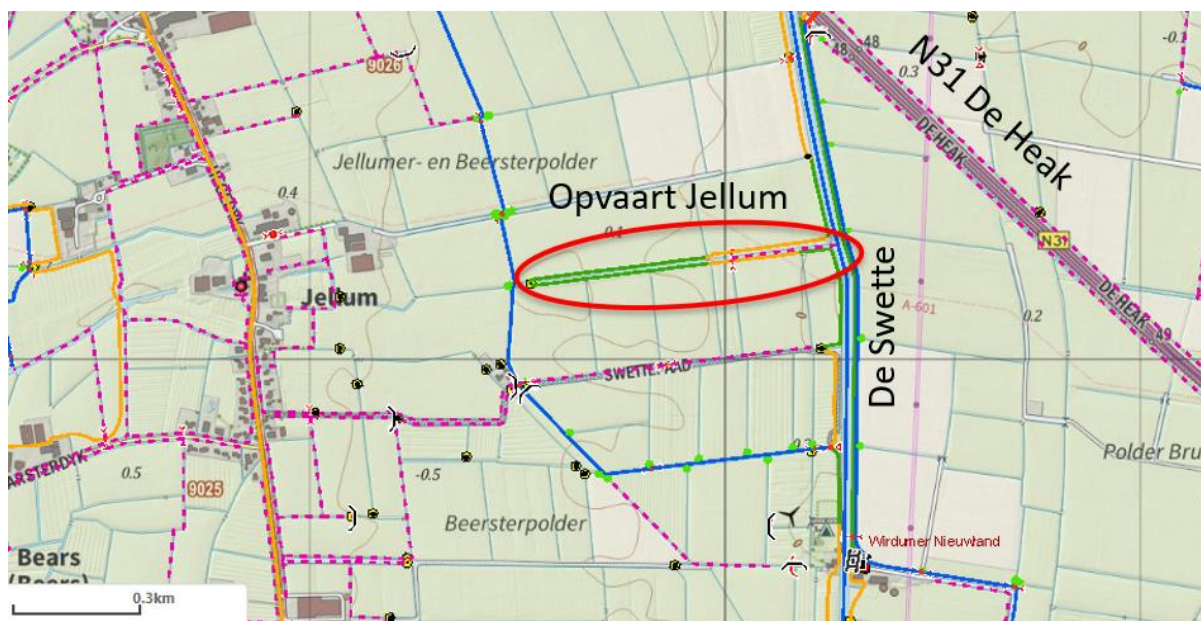

AFBEELDING 1

Conform de "Werkwijze opvaarten", vastgesteld door het DB 19 november 2019, is beoordeeld of deze opvaart incidenteel afgesloten kan worden van de boezem (beheersbare boezem). Door de opvaart bij hoog water af te sluiten blijft de bescherming van het achterland tegen overstromingsgevaar met als gevolg wateroverlast-wat uiteindelijk het doel is- gewaarborgd. De status van de waterkering wijzigt daarmee van regionale waterkering grotendeels naar lokale waterkering. De gewijzigde afmetingen worden verwerkt in de legger.

Door het afsluitbaar maken van de opvaart hoeft de huidige regionale waterkering aan weerskanten niet langer aan de door de provincie gestelde normen voor regionale waterkeringen te voldoen, omdat deze wordt aangemerkt als een lokale waterkering. Dit is goedkoper qua aanleg en toekomstig onderhoud, omdat de huidige kering voldoet aan de hoogte-eisen van een lokale kering.

Hiervoor stelt het waterschap een Projectplan vast.

## 2. Juridische status Projectplan

### Definitie

Een Projectplan is een besluit dat een waterschap (als waterbeheerder) vaststelt als dat waterschap waterstaatswerken (1) aanlegt of wijzigt. Het besluit vindt plaats op basis van artikel 5.4 Waterwet (2).

### Legger en Algemene wet bestuursrecht

In dit document (Projectplan) is ook het besluit opgenomen voor het vaststellen van de Legger (3), voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken. Deze besluitvorming vindt zijn basis in artikel 5.1 Waterwet (vastlegging waterstaatswerken qua: ligging, afmeting, vorm, constructie) en artikel 78 lid 2 Waterschapswet (toewijzing van de onderhoudsplicht voor de aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken). Het Projectplan is een besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit vindt een belangenafweging plaats en wordt rechtsbescherming geboden aan belanghebbenden.

### Schadebesluiten

In het Projectplan wordt ook beschreven welke nadelige gevolgen rechthebbenden (eigenaren, pachters) en eventueel andere belanghebbenden ondervinden van de besluitvorming. De afhandeling van schade wordt onder punt 8 beschreven. Tegen schadebesluiten die op grond van het Projectplan worden vastgesteld, staat aparte rechtsbescherming open.

Voor de besluitvorming (Projectplan en Legger) is het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bevoegd. Dit is geregeld in het delegatiebesluit Wetterskip Fryslân d.d. 6 juli 2010.

### Besluit MER

Naast Projectplan, Leggerbesluit en Schadebesluit moet het dagelijks bestuur bij **Kadeprojecten**, op basis van artikel 7.19 Wet Milieubeheer / Besluit Milieueffectrapportage (Besluit MER), bijlage C. onderdeel D 3.2, ook een besluit nemen over een MER-beoordeling. Het dagelijks bestuur kan besluiten om daarvan af te zien. De keuze om dit te doen hangt af van overwegingen die vermeld staan in de Europese richtlijn 2011/92/EU. Een MER-beoordeling hoeft pas plaats te vinden als er aanzienlijke effecten zijn op het milieu.

Aangezien de beschreven maatregelen in dit projectplan vanwege haar aard en schaal geen aanzienlijke effecten op het milieu hebben is besloten af te zien van een MER-beoordeling.

---

<sup>1</sup> Artikel 1.1 Waterwet: waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.

<sup>2</sup> Artikel 5.4 Waterwet:

1. De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Met de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk wordt gelijkgesteld de uitvoering van een werk tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam.
2. Het plan bevat tenminste een beschrijving van het betrokken werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk.

<sup>3</sup> De Legger is een besluit van een waterschap waarin voor waterstaatswerken aangegeven wordt wie onderhoudsplichtig is en wat de onderhoudsplicht omvat. Verder wordt in de legger vastgelegd, de ligging, vorm, constructie en afmeting van het waterstaatswerk.

### 3. (Zorgvuldige) voorbereiding van de besluitvorming

Het Projectplan is als volgt voorbereid:

Ten behoeve van de voorbereiding zijn de volgende vooronderzoeken uitgevoerd:

1. Landmeetkundige werkzaamheden;
2. Inventarisatiewerkzaamheden in het veld;
3. Verkennend archeologisch onderzoek ter plaatse van de voorgenomen werkzaamheden;
4. Natuurtoets Flora en Faunawet;
5. Onderzoek Kabels en Leidingen (KLIC),
6. Onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven.
7. Analyse op basis van de "Werkwijze opvaarten" naar alternatieven en varianten.

De Provincie Fryslân is bevoegd gezag voor het aanwijzen van een regionale waterkering, maar ook aan welke norm voldaan moet worden. Door dit projectplan wijzigt de status van de regionale waterkering langs de opvaart grotendeels naar lokale waterkering. De provincie stemt hier mee in. Bij een volgende herziening van de waterverordening, na 1 januari 2023 omgevingsverordening, wordt deze wijziging (de nieuwe ligging van de regionale waterkering) door de provincie opgenomen.

Voor de toetsing en het beheer en onderhoud van lokale waterkeringen wordt verwezen naar de "Beheernota waterkeringen".

Op basis van de resultaten van deze vooronderzoeken is het definitief ontwerp tot stand gekomen.

Verder zijn er de volgende ontwerpstappen doorgelopen:

1. Keurhoogteberekeningen;
2. Het informeren van en overleggen met belanghebbenden. Mede naar aanleiding van gesprekken met de rechthebbenden (perceeleigenaren en/of gebruikers) van de percelen is het ontwerp op enkele onderdelen aangepast.

Tijdens de voorbereiding is geconstateerd dat er alternatieven zijn om de waterhuishoudkundige knelpunten op te lossen. Deze alternatieven zijn (conform de "Werkwijze opvaarten"):

1. Afsluiten van de opvaart bij hoog water door middel van een spindelafsluiter op een nieuw aan te brengen dam met duiker in de opvaart nabij de uitmonding in De Swette.
2. Het ophogen van de huidige regionale waterkering langs de opvaart.

Het waterschap heeft in dit besluit gekozen voor de onder 1 genoemde wijziging, Beheersbare boezem; afsluiter plaatsen op nieuwe duiker in een nieuw aan te brengen dam, omdat dit de meest eenvoudige en voordelige manier is om een beheerste boezem ten tijde van hoog water te creëren, zonder of met minimale negatieve effecten op aspecten genoemd in de "Werkwijze opvaarten".

Hieronder volgt een toelichting met betrekking tot de afgewogen aspecten:

- Bergingsafname boezem: het waterpeil in de opvaart blijft boezempeil en onder normale omstandigheden mee fluctueren. De duiker wordt gesloten indien het maatgevend boezempeil van -0,03 m NAP bereikt. De lokale waterkering kan deze waterstand blijven keren, waarmee er geen sprake is van bergingsafname op de boezem.
- Bergingstoename deelsysteem; Er vindt geen toe- of afname plaats van de aanwezige wateroppervlakte in de omringen poldersysteem als gevolg van de te treffen maatregelen..

- Ecologie: Door middel van een open verbinding met de boezem blijft de ecologische waarde van de opvaart intact voor de aanwezige flora en fauna. De duiker krijgt een voldoende grote diameter en aansluiting met de waterbodem voor zowel ecologische als hydrologische functioneren. De duiker wordt aangelegd met 25% lucht.
- Recreatie: De vaart is niet in gebruik als vaarroute of een formele vaarweg. Ook in de praktijk wordt de vaart niet voor recreatie doeleinden gebruikt.
- Cultuurhistorisch en landschappelijke aspecten: hiervoor wordt verwezen naar de beoordeling en motivering in paragraaf 7.2
- Inlaatvoorziening(en): door het handhaven van het boezempeil blijven bestaande inlaatvoorzieningen ongewijzigd functioneren
- Peilvakken: er is geen sprake van een toename van peilvakken.
- Financiële gevolgen: Op basis van kostenramingen is gebleken dat de aanlegkosten en de beheer- en onderhoudskosten variant 1 is dan van variant 2.

Tijdens de voorbereiding van de besluitvorming zijn de nadelige gevolgen van dit besluit geïnventariseerd. Onder punt 8 wordt uiteengezet hoe deze gevolgen worden voorkomen of beperkt. E.e.a. conform artikel 5.4 lid 2 Waterwet. Zie voor de tekst van genoemd artikel, noot 2.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee zorgvuldig is voorbereid (artikel 3.2 Awb <sup>(4)</sup>).

## 4. De aan te leggen of te wijzigen waterstaatswerken (besluit artikel 5.4 lid 1 Waterwet)

De volgende waterstaatswerken worden aangelegd of gewijzigd, met de volgende specificaties (Leggerwaarden). De hier genoemde Loggerwaarden worden opgenomen in de Logger (artikel 5.1 Waterwet <sup>(5)</sup>). Voor de toewijzing van het onderhoud van deze waterstaatswerken wordt verwezen naar punt 5.


Op onderstaande afbeelding zijn de locaties weergegeven. Op deze locaties worden waterstaatswerken aangelegd en worden leggerwijzigingen toegepast. De groene lijn betreft een regionale waterkering in de vorm van het type polderdijk, de oranje lijn betreft een regionale waterkering in de vorm van het type hoge grond.

---

<sup>4</sup> Artikel 3:2 Awb: Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

<sup>5</sup> Artikel 5.1 Waterwet (Logger – Waterwet): De Beheerder (waterschap) draagt zorg voor de vaststelling van een Logger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar **Ligging, Vorm, Afmeting en Constructie** moeten voldoen. Van de Logger maakt deel uit een overzichtskaart waarop de Ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven.



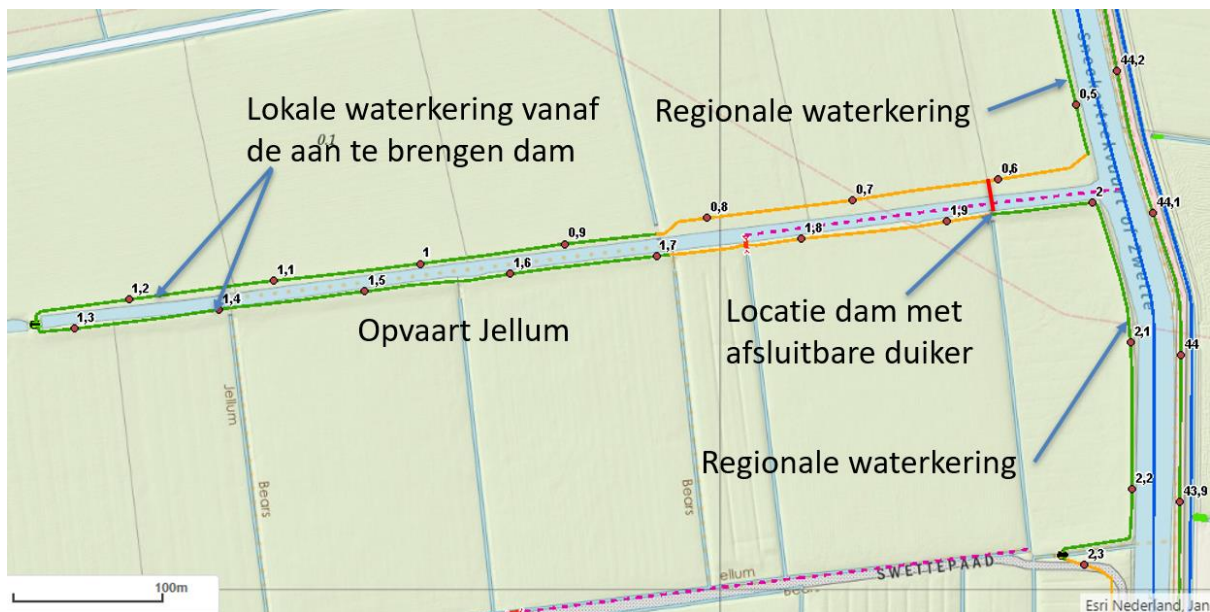

AFBEELDING 2

#### **A. Aan te leggen, te wijzigen waterstaatswerken t.p.v. opvaart Jellum (KR038-004 t/m 008)**

##### **Aan te leggen waterstaatswerk (kunstwerk)**

Aan de oostzijde van de opvaart wordt op ca. 70 meter vanaf de oeverlijn van De Swette, ter hoogte van de eerste dwarsloot, een gronddam met een afsluitbare duiker gerealiseerd. De dam wordt voorzien van een dubbel vekerend hekwerk en aan de boezemzijde van een damwand/beschoeiing ter bevestiging van de afsluiter. Deze duiker krijgt een ronde diameter van 500 mm, met een binnen onderkant buis van -0,89 m NAP. Hierop wordt een afsluiter geplaatst. Dit is de hoogwaterafsluiter.

De bestaande boezem wordt gewijzigd naar "beheersbare boezem" met een afsluitpeil van -0,03 m NAP. Dit komt overeen met het maatgevend boezempeil dat overeenkomt met een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar.

Na uitvoering van het project wordt deze situatie opgenomen in het calamiteitenoverzicht van het waterschap, waardoor de rayonbeheerder bij hoog water weet dat hij deze duiker moet afsluiten.

##### **Te wijzigen waterstaatswerk (waterkering)**

De regionale waterkering langs de opvaart westelijk vanaf de nieuw aan te brengen dam tot het eindpunt van de vaart wijzigt naar een lokale waterkering. De afkeurhoogte van de lokale waterkering, achter de hoogwaterafsluiter, wijzigt van +0,17 m NAP naar -0,03 m NAP. Dit komt overeen met het maatgevend boezempeil dat overeenkomt met een overschrijdingsfrequentie van 1/100 per jaar.

##### **Ligging gewijzigde situatie**


Aan de oostzijde van de opvaart wordt op ca. 70 meter vanaf de oeverlijn van De Swette een gronddam met een afsluitbare duiker gerealiseerd. De regionale kering komt daarmee over de dam te liggen.

De regionale waterkering betreft een type polderdijk met de volgende leggerafmetingen:

- Buitentalud 1:3, kruinbreedte 1,50 meter, binnentalud 1:5
- De afkeurhoogte is +0,17 m NAP

Het binnentalud wordt aangelegd met een talud van 1:7.

De locatie van de dam met afsluitbare duiker en de ligging van de waterkeringen is weergegeven in afbeelding 3.

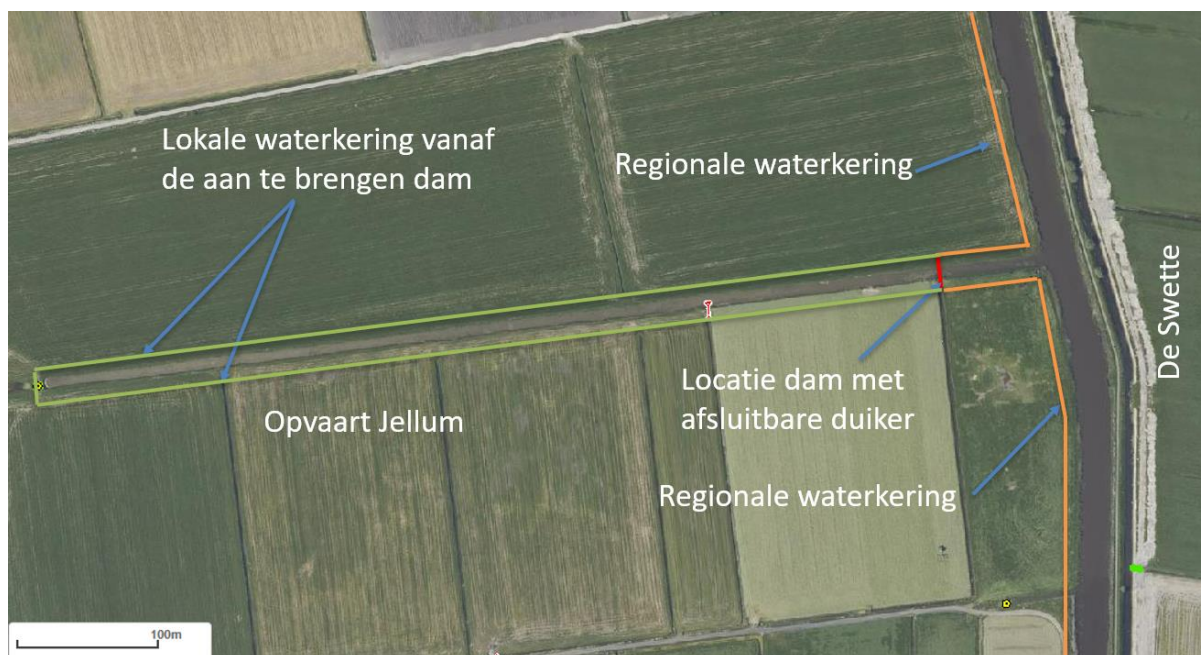

AFBEELDING 3

Zie ook Bijlage 1 Leggerblad.

## 5. Legger – toewijzing van het onderhoud

De Legger wordt als volgt gewijzigd:

### a. Legger ex. artikel 5.1 Waterwet (vastlegging: Ligging, Afmeting, Vorm en Constructie)

Op onder punt 4 vermelde aangelegde of gewijzigde waterstaatswerken, met bijbehorende Leggerwaarden (Ligging, Afmetingen, Vorm en Constructie), worden toegevoegd aan de Legger. De Leggerkaart en het Leggerregister worden hierop aangepast.

### b. Toewijzing van het onderhoud (Legger ex. artikel 78 lid 2 Waterschapswet)

Voor de onder punt 4 genoemde waterstaatswerken geldt de volgende onderhoudstoewijzing:

| Waterstaatswerk           | Onderhoudsplichtige | Onderhoudsplicht         |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Regionale waterkering     | Wetterskip Fryslân  | buitengewoon onderhoud   |
| Regionale waterkering     | Eigenaar            | gewoon onderhoud         |
| Lokale waterkering        | Wetterskip Fryslân  | buitengewoon onderhoud   |
| Lokale waterkering        | Eigenaar            | gewoon onderhoud         |
| Afsluiter                 | Wetterskip Fryslân  | (buiten)gewoon onderhoud |
| Dam met duiker en hekwerk | Wetterskip Fryslân  | (buiten)gewoon onderhoud |

De toewijzing van de onderhoudsplicht aan onderhoudsplichtigen is gebaseerd op de Keur Wetterskip Fryslân 2013 en de Beleidsregels Integrale Legger.



## 6. Motivatie, onderbouwing van het besluit

Met dit Projectplan worden de volgende waterhuishoudkundige knelpunten opgelost:

Ten behoeve van de besluitvorming zijn de volgende motivaties geformuleerd:

1. De regionale waterkering voldoet momenteel niet aan de door de provincie gestelde veiligheids- en stabiliteitsnormen. Met de leggerwijziging en de verbetering en aanpassing van de regionale waterkeringen voldoen deze aan de gestelde normen.
2. Met de wijzigingen van de regionale waterkeringen wordt invulling gegeven aan doelstelling artikel 2.1 lid 1 a Waterwet, namelijk voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen en wateroverlast.

Het waterschap concludeert dat het besluit hiermee deugdelijk is gemotiveerd (artikel 3:46 Awb <sup>(6)</sup>).

## 7. Benodigde zakelijke rechten

Voor de aanleg of wijziging van de waterstaatswerken, zoals genoemd onder hoofdstuk 4, verandert de eigendomssituatie niet. Er is ook geen reden om andere zakelijke rechten te vestigen.

## 8. Beperken of voorkomen van de nadelige gevolgen van het Projectplan

### ***8.1. Geïntariseerde nadelige gevolgen:***

Tijdens de voorbereiding van het project en dit besluit zijn de volgende nadelige gevolgen geïntariseerd, namelijk:

#### a. Tijdelijke nadelige gevolgen (gevolgen tijdens de uitvoering):

1. Overlast als gevolg van de werkzaamheden op de percelen waar de verbeteringswerken, vermeld onder hoofdstuk 4, worden uitgevoerd.
2. Mogelijke schade aan lokale Flora en Fauna op de locaties waar het werk wordt uitgevoerd.
3. Schade aan gewas.

#### b. Blijvende nadelige gevolgen:

1. Mogelijke schade aan de cultuurhistorisch waarde en de beleving van de vaart, omdat deze niet meer in open verbinding is met De Swette .
2. Mogelijke schade aan de toekomstwaarde van de vaart.
3. De bevaarbaarheid van de vaart is door de aanleg van de dam met afsluitbare duiker vervallen.
4. Een polderdijk met taluds langs een deel van de opvaart geeft nadelen voor de bewerkbaarheid.

---

<sup>6</sup> Artikel 3:46 Awb: Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering.

## **8.2. Beschrijving hoe de nadelige gevolgen worden voorkomen of beperkt.**

### **a. Beperken/voorkoming tijdelijke nadelige gevolgen:**

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen tijdens het werk te voorkomen of te beperken:

1. Uitvoeringsperiode in overleg met perceeleigenaren in het gebied.
2. Tijdens de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met het gestelde in de Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen.
3. Gebruik van rijplaten en aanleg van rij- en werkstroken, overslaglocaties, indien weer- en terreinomstandigheden daarom vragen. De benodigde grond wordt aangevoerd via het water.
4. Voor zover mogelijk wordt schadeherstel tijdens de uitvoering van het werk uitgevoerd.
5. Na de werkzaamheden worden de werkstroken hersteld en opnieuw ingezaaid.

### **b. Beperken/voorkoming blijvende nadelige gevolgen:**

De volgende maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen te beperken:

#### **1. Cultuurhistorische waarde en de beleving van de vaart**

Door het aanbrengen van de dam met afsluitbare duiker in de vaart vindt er een minimale aanpassing plaats, waardoor de overige waarden van de vaart niet worden aangetast. De vaart met de huidige waterkeringen blijft behouden en zichtbaar aanwezig in het landschap, ook blijft de vaart het huidige boezemwaterpeil behouden en behoudt daarmee ook een functie in het boezemsysteem. In de historie gegevens is te zien dat de opvaart op andere plekken reeds eerder is afgedamd.

De beleving van de opvaart naar Jellum vanaf het fietspad langs De Swette wordt in stand gehouden doordat de dam met afsluitbare duiker ca. 70 meter teruggedraaid wordt vanaf de oeverlijn van De Swette, waardoor de opening van de vaart zichtbaar blijft en er geen gesloten oeverlijn ontstaat. De dam zelf wordt een grondlichaam voorzien van met gras beklede taluds en is daardoor passend bij het landschap. De zichtlijn over de vaart naar Jellum wordt maximaal in stand gehouden door de kruin van de dam met afsluitbare duiker niet hoger te maken dan vanuit de waterkerende functie noodzakelijk is.

#### **2. Toekomstwaarde van de vaart**

Het plaatsen van een dam met afsluitbare duiker is geen onomkeerbare handeling die permanent de cultuurhistorische waarde van de vaart aantast. Het waterpeil in de vaart blijft boezempeil en staat in open verbinding met de boezem via de duiker. Toekomstige ontwikkelingen kunnen, na het doorlopen van diverse procedures, tot uitvoering komen. Qua procedures valt te denken aan o.a. bestemmingsplan, omgevingsvergunning, watervergunning en eventueel een peilbesluit. In dat geval dient de dam met duiker en afsluiter verwijderd te worden.. De lokale waterkering langs de vaart wordt dan weer als regionale kering aangewezen en dient dan op voldoende kerende hoogte te worden gebracht op kosten van de initiatiefnemer. Het waterschap heeft bij een eventuele verlenging van de vaart afkoopbeleid voor het beheer en onderhoud van extra lengte regionale waterkeringen als gevolg van dergelijke ontwikkelingen.

#### **3. Bevaarbaarheid**

Door de aanleg van de dam met afsluitbare duiker is de vaart niet meer in een open verbinding met de Swette, waardoor deze niet meer bevaarbaar is. In de praktijk wordt deze nu echter ook niet bevaren. Het gaat hier om een doodlopende opvaart, die midden in de landerijen eindigt. Bovendien heeft deze doodlopende vaart een beperkte diepgang en zijn er geen aanlegvoorzieningen of recreatieve aanknopingspunten.

#### 4. Nadelen van bewerkbaarheid

Een polderdijk heeft aan landzijde een talud van 1:7 wat in de praktijk goed bewerkbaar is. Door een vlakke kruin van 1,5 meter en een buitentalud van 1:3 is het ruimtebeslag van een polderdijk op het weideperceel minimaal. Alternatief is om de regionale waterkering langs de opvaart te realiseren met een talud van 1:7 aan zowel land- als boezemzijde, waardoor deze goed bewerkbaar is. Echter een flauwer talud aan de buitenzijde heeft wel tot gevolg dat de oppervlakte waar beweiding plaats kan vinden, vanaf landzijde tot de insteek van het buitentalud op de kruin, wat kleiner wordt, en dat er meer grond in de kering moet worden verwerkt bij de aanleg.

Indien er sprake is van (bedrijfsmatige) schade door onze werkzaamheden -wat wij overigens niet verwachten - kan aanvullend met rechthebbenden een gebruiksovereenkomst worden gesloten.. Mocht het niet lukken er minnelijk uit te komen dan kunnen rechthebbenden o.g.v. artikel 7.14 Waterwet verzoeken om schadevergoeding. Hierop neemt het waterschap een besluit en daartegen staat dan weer rechtsbescherming open. Het waterschap baseert zich hierbij op haar schadevergoedingsregeling waterstaatswerken.

Voor het overige geldt dat in de voorbereiding bij het opstellen van dit projectplan en op basis van artikel 3:4 Awb, er een belangenafweging heeft plaatsgevonden. De nadelige gevolgen van het besluit en de wijze waarop deze ongedaan of beperkt worden, staan beschreven in dit besluit (Projectplan). In de besluitvorming is geconstateerd dat de (mogelijk) nog aanwezige nadelige gevolgen niet onevenredig zijn in verhouding het te dienen doel van dit besluit.

## 9. Uitvoering, planning van het werk

Het voornemen is om het project uit te voeren in een nader te bepalen periode tussen: 1 juli 2023 en 31 december 2023. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00-18.00 uur op werkdagen.

## 10. Procedure (rechtsbescherming)

### Bezwarenprocedure

Rechthebbenden en belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen dit Projectplan, volgens de procedure opgenomen in de bekendmakingsadvertentie. Deze bekendmakingsadvertentie wordt elektronisch gepubliceerd in een Waterschapsblad ([overheid.nl](https://overheid.nl)).

Na de bezwarenperiode wordt het besluit ook bekendgemaakt in een Waterschapsblad ([overheid.nl](https://overheid.nl)), eventueel na behandeling van ingediende bezwaren. Tegen dat besluit staat beroep open bij de rechtbank.

Een eventueel ingediend bezwaar of beroep schort de uitvoering van het werk niet op. Wil men voorkomen dat onomkeerbare handelingen worden verricht dan dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank (voorzieningenrechter) of de voorzitter van de Raad van State (al naar gelang de procedure is gevorderd).

Op de vaststelling van dit Projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in een eventuele beroepsprocedure bij de rechtbank in het beroepsschrift moet worden aangegeven wat de inhoudelijke beroepsgronden zijn (dus geen pro forma beroep).

Voor eventuele vragen over dit besluit, kan contact opgenomen worden met de heer L. Zijlstra en voor vragen over de procedure met mevrouw R. Doting. Beide functionarissen zijn te bereiken op het volgende telefoonnummer 058-292 2222.

Hoogachtend,  
namens het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,

Anneke Westra  
Vakgroepleider plannen & projecten, boezem

## Bijlage 1 Leggerblad
