

Projectplan aanleggen stuw

*nabij Halve Morgensstraat te
Berghem (3 jaren)*



Inhoud

Leeswijzer	3
Deel I Aanleg van een stuw	4
1. Aanleiding en doel	4
2. Ligging en begrenzing plangebied	4
3. Beschrijving van de waterstaatswerken	4
4. Beschikbaarheid gronden	5
5. Effecten van het plan	5
6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	5
7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen	6
7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan	6
7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering	6
7.3 Financieel nadeel	6
8. Legger, beheer en onderhoud	6
Deel II Verantwoording	7
1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving	7
1.1 Waterwet	7
1.2 Wet natuurbescherming	7
2. Verantwoording op basis van beleid	8
2.1 Toets beleid waterschap	8
2.2 Toets overig beleid	8
3. Benodigde vergunningen en meldingen	8
Deel III Rechtsbescherming	9
Projectplan	9
Bezwaar	9
Verzoek om voorlopige voorziening	9

Leeswijzer

Het projectplan geeft invulling aan artikel 5.4 van de Waterwet voor de aanleg of wijziging van een waterstaatwerk. Het projectplan “aanleggen van een stuw, nabij Halve Morgensstraat te Berghem” bestaat uit drie delen.

- In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt uitgevoerd.
- Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met andere woorden, de onderbouwing van het plan.
- Deel III geeft informatie over de rechtsbescherming en de procedures.

Deel I Aanleg van een stuw

Dit projectplan heeft betrekking op de aanleg van een stuwconstructie ten zuiden van het spoor langs in de waterloop langs de Halve Morgensstraat te Berghem.


1. Aanleiding en doel

Aan de oostzijde van Berghem loopt een waterschapssloot (A waterloop) die water afvoert vanaf het zuiden richting de Hertogswetering aan de noordzijde. In het kader van droogtebestrijding willen we tijdelijk -voor de maximale duur van 3 jaren- een stuw plaatsen in de waterloop om water zoveel als mogelijk te conserveren.

Deze tijdelijke maatregel is een aanvulling op een overkoepelend project waarbij gewerkt wordt aan anti verdrogingsmaatregelen voor natuurgebied Herperduin.

2. Ligging en begrenzing plangebied

De locatie is gelegen aan de oostzijde van Berghem. De stuw is voorgenomen in de A waterloop ten zuiden van het spoor en ten oosten van de Halve Morgensstraat in Berghem.

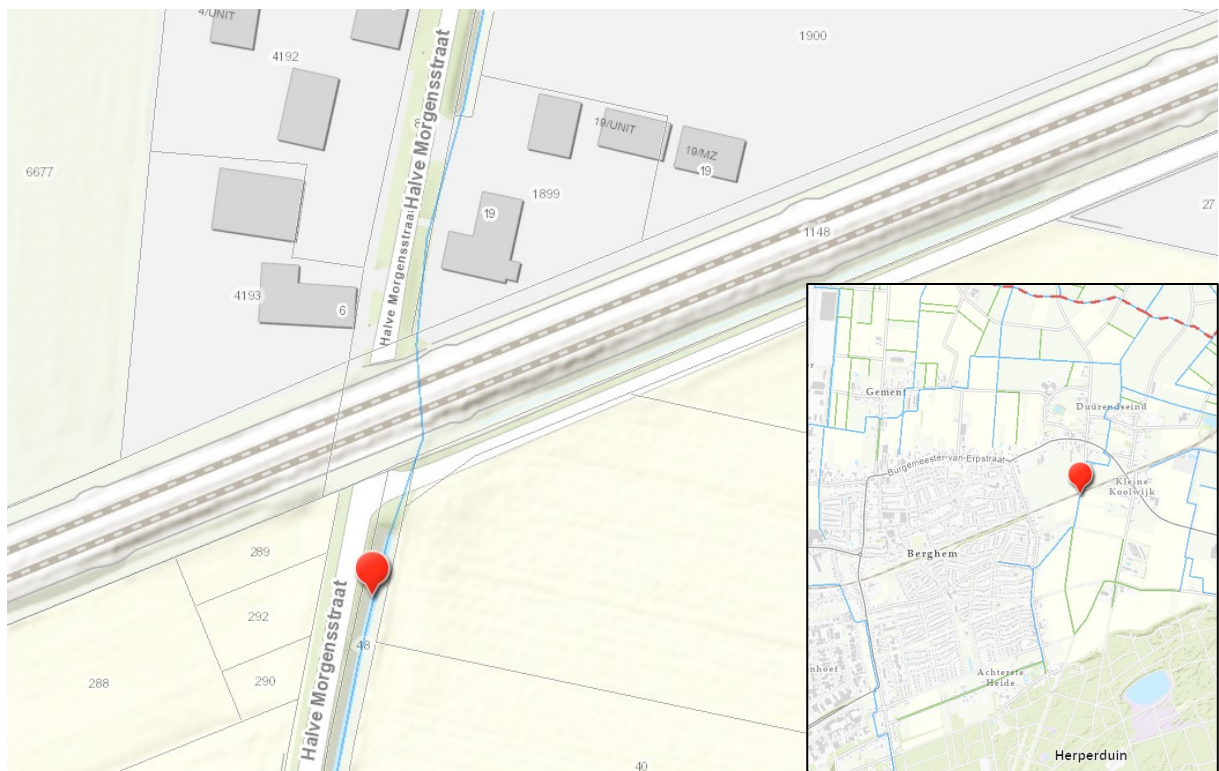


Figuur 1: Voorgenomen locatie stuwconstructie (rode speld; in overzichtstekening stippellijn Hertogswetering)

3. Beschrijving van de waterstaatswerken

Er wordt een schotbalk stuw geplaatst in de A waterloop voor een periode van maximaal 3 jaar. Het waterpeil kan met dit type stuwtype gereguleerd worden door een schot te verwijderen of bij te plaatsen.

4. Beschikbaarheid gronden

De stuw wordt aangelegd op grond in eigendom van het waterschap.

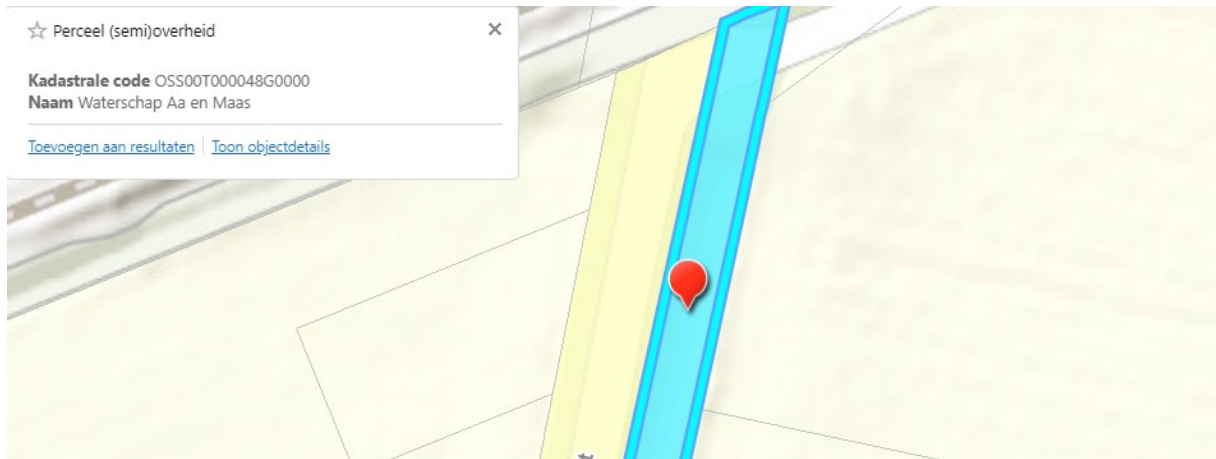

Figuur 2: Eigendom waterschap (perceel gemeente Oss, sectie T, nummer 48)

5. Effecten van het plan

De waterloop betreft een waterloop in vrij afwaterend gebied. Voor het gebied is dit een vrij hellend gebied waar de waterbodem vanaf het zuiden (nabij Herperduin) tot aan het spoor een verval heeft van 1,7 meter.

Met een stuwconstructie wordt bekeken of er meer water geconserveerd kan worden en wat de effecten zijn in het oppervlaktewaterpeil. Een hoger oppervlaktepeil kan een verhogend effect op de grondwaterstand.

De constructie wordt aangelegd om de effecten de komende drie jaren te monitoren. Er worden geen negatieve effecten verwacht. De mogelijke nadelige effecten worden inzichtelijk tijdens de periode.

6. Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Na vaststelling van onderhavig projectplan Waterwet wordt het werk aanbesteed.

De impact op de omgeving tijdens het werk is nihil. Werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de wet- en regelgeving omtrent flora en fauna, waarbij de Gedragscode wet natuurbescherming van de Unie van Waterschappen van toepassing wordt verklaard.

Eventueel vrijkomende grond wordt milieukundig getoetst en zoveel mogelijk ter plaatse verwerkt. Indien wettelijk vereist wordt de grond afgevoerd naar een erkend verwerker.

7. Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen

7.1 Beperken nadelige gevolgen van het plan

De effecten na plaatsen van de stuw worden gemonitord en bij nadelige effecten worden het waterpeil aangepast door schotten te verwijderen.

7.2 Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering

Er wordt gewerkt volgens de wet Natuurbescherming. De tijdsduur van de activiteit is kort (maximaal halve dag). Er zijn geen nadelige gevolgen voor de uitvoering te verwachten.

7.3 Financieel nadeel

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die aan de uitvoering van het project in de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de verordening schadevergoeding van waterschap Aa en Maas.

8. Legger, beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van waterschap Aa en Maas. Hierbij wordt gewerkt conform het Waterbeheerplan 2022-2027. Dit beheerplan beschrijft op hoofdlijnen het onderhoud aan de A-watgangen, inclusief het onderhoud aan de bijbehorende kunstwerken en aangrenzende natuurlijk ingerichte gebieden.

De legger beschrijft de eisen naar ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken op grond van waterstaatkundige eisen moeten voldoen en heeft als zodanig geen rechtsgevolg. De legger volgt de waterstaatkundige besluitvorming, zoals de vaststelling van het onderhavige projectplan. Tegen deze vaststelling staat rechtsbescherming open (zie Deel III van dit plan). Als gevolg van de in dit projectplan opgenomen maatregelen is aanpassing van de legger nodig. Na afloop van de werkzaamheden worden de aangelegde voorzieningen opgenomen dan wel aangepast in de legger van het waterschap.

Deel II Verantwoording

1. Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

1.1 Waterwet

Als een waterschap een waterstaatswerk wil aanleggen of wijzigen, dient op grond artikel 5.4 Waterwet een projectplan te worden vastgesteld, met daarin een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1).

De doelen van de Waterwet worden voor het beheergebied van waterschap Aa en Maas nader uitgewerkt door middel van de thema's in het Waterbeheerplan:

1. Voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (waterkwantiteit: veilig en bewoonbaar beheergebied en voldoende water) in samenhang met:
2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit: schoon water, natuurlijk water) en
3. Vervulling van maatschappelijke functies (zoals schoon water, natuurlijk en recreatief water) van watersystemen.

Relevantie voor het projectplan: De geplande maatregelen dragen bij aan thema 1 van het waterbeheerplan 2022-2027. De maatregelen worden genomen om de het water langer vast te houden in het gebied en om grondwater aan te vullen.

1.2 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen, vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren of doden van sommige dieren. In bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing (mogelijk als onderdeel van een omgevingsvergunning) of vrijstelling nodig.

Relevantie voor het projectplan: De uitvoering van de geplande maatregelen heeft geen invloed op het verwijderen, verstoren of doden van dier- en plantsoorten.

2. Verantwoording op basis van beleid

2.1 Toets beleid waterschap

Waterbeheerplan

De beleidsvisie die in het waterbeheerplan wordt omschreven, benadrukt onder andere dat er continu gewerkt moet worden aan een robuust en veerkrachtig watersysteem. Voorliggend projectplan Waterwet is een uitvloeisel waarin wordt gestreefd naar oppervlaktewaterbeheer die bijdraagt aan het aanvullen van de grondwaterstanden.

Keur

Het doel van de beleidsregels Keur is aan te geven hoe het dagelijks bestuur van het waterschap omgaat met zijn bevoegdheid om vergunning te verlenen van de gebods- en verbodsbepalingen die in de Keur zijn opgenomen. Dit toetsingskader is ook van toepassing op eigen werken.

Voor de aanleg van een stuwconstructie zijn de toetsingscriteria uit hoofdstuk 1: Beleidsregel peilafwijkingen in een oppervlaktewater.." van toepassing.

Relevantie voor het projectplan: De stuw wordt aangelegd in een categorie A waterloop buiten beschermd gebied. Het beheer en onderhoud wordt niet belemmerd door de aanleg of aanwezigheid van de stuwconstructie.

2.2 Toets overig beleid

Grondwaterconvenant 2021 - 2027

13 Brabantse (water)partijen, waaronder de provincie Noord-Brabant, hebben afgesproken intensiever samen te werken om de grondwatervoorraad in Brabant te verbeteren. Het doel van deze samenwerking is om meer water vast te houden, minder grondwater te gebruiken en bij droogte of wateroverlast sneller te kunnen reageren om schade en overlast te beperken.

Relevantie voor het plan: De maatregel in dit projectplan betreft de uitwerking van het doel 'meer water vasthouden' zoals gesteld in het grondwaterconvenant.

3. Benodigde vergunningen en meldingen

Door een uitspraak van de Raad van State op 2 november 2022 is de bouwvrijstelling uit de stikstofwet niet langer houdbaar. Ook voor projecten met een tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de uitvoeringsfase moet worden getoetst of een stikstofvergunning nodig is. Maatregelen die onder regulier beheer en onderhoud vallen, zijn vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbeheer. Er is door waterschap Aa en Maas een lijst opgesteld met werkzaamheden die redelijkerwijs onder beheer en onderhoud vallen. "Het vervangen van een damwand/lop-stuw/rijplaatstuw en het plaatsen van nieuwe damwanden/stuwen" is daarbij opgenomen als activiteit die redelijkerwijs onder beheer en onderhoud vallen.

Er zijn geen aanvullende vergunning nodig. Mocht dit alsnog het geval zijn, dan worden deze separaat aangevraagd.

Deel III Rechtsbescherming

Projectplan

Dit projectplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na bekendmaking.

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen

Hoe maakt u digitaal bezwaar? U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Hier vindt u hoe dit kan: <https://www.aaenmaas.nl/regelen/bezwaar-beslissing-bestuur/>.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
