

Projectplan

Aanleg of wijziging van waterstaatswerken voor Beheer en Onderhoud

Naam: 574705 Haaren, Ruijsbossche Waterloop, ZL34: Automatiseren stuwen ES24-st2, ZL34-st2 en ZL34-st3

1. Doel

Waterschap De Dommel heeft als beheerder van het oppervlaktewater de taak om de functie van watergangen en daarin aanwezige kunstwerken in stand te houden. Dit doen we door de (bestaande) watergangen en kunstwerken zo effectief en efficiënt mogelijk te beheren, te onderhouden en in te richten, zodat deze (gaan) voldoen aan de gestelde doelen. In de gemeente Haaren, ten (zuid)oosten van Haaren en Helvoirt, ligt de Ruijsbossche Waterloop (ZL34). Ten oosten van Esch, parallel aan het spoor, ligt watergang ES24. In deze watergangen staan verschillende stuwen die nu alleen handmatig bediend kunnen worden. Hierdoor is snel reageren op een hoosbui niet altijd mogelijk, met de kans op natschade als gevolg. Tegelijkertijd heeft het vasthouden van water een hoge prioriteit na de laatste droge zomers. Daarvoor moeten de stuwen zo hoog mogelijk ingesteld worden. Dat gebeurt nu niet omdat de kans op natschade bij een hoosbui dan te groot is. Het vasthouden van water wordt daardoor niet maximaal benut. Waterschap De Dommel is voornemens om 3 stuwen te automatiseren. Het gaat om de stuwen ZL34-st2, gelegen aan de Geveer te Haaren. Stuw ZL34-st3 gelegen nabij de Groenstraat te Helvoirt en stuw ES24-st2, gelegen aan de Heikant te Esch.

2. Beschrijving waterstaatswerken (ligging, vorm, afmeting, constructie)

ZL34-st2 is nu een stuw met klep en wordt omgebouwd naar een RVS kandelstuw. De effectieve doorstroombreedte wordt hierdoor ca. 12 cm smaller. De minimale doorstroomhoogte wordt ca. 8 cm hoger dan dat deze nu is.

ZL34-st3 is nu schotbalkstuw en wordt vervangen voor een RVS kandelstuw. De nieuwe kandelstuw wordt circa 100 meter verderop, in benedenstroomse (noordoostelijke) richting geplaatst. De effectieve doorstroombreedte van de nieuwe stuw blijft gelijk, 2,5 m. De minimale doorstroomhoogte wordt 3,89 m+NAP. Dat is gelijk aan de hoogte van de onderkant duiker die direct benedenstrooms van de nieuwe stuw ligt.

Stuw ES24-st2 is nu schotbalkstuw en wordt vervangen voor een RVS kandelstuw. De effectieve doorstroombreedte van de nieuwe stuw wordt 94 cm. Dat is 42 cm breder dan de huidige doorstroombreedte (nu 52 cm). De uitstroomduiker, de bestaande duiker onder de Runsdijk (diameter van 60 cm), blijft ongewijzigd.

3. Effecten van het plan

Door de stuw en te automatiseren kan er meer water worden vastgehouden (waterconservering) en sneller gereageerd worden op (lokale) hoosbuien waardoor de kans op natschade geminimaliseerd wordt.

De versmalling van de effectieve doorstroombreedte van stuw ZL34-st2 is dermate klein dat deze geen ongewenst opstuwend effect heeft.

4. Omgevingsrecht

N.v.t.

5. Rechtsmiddelen

Verkorte procedure


Als een projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode bezwaar maken tegen het plan. Dat kan schriftelijk. Een bezwaarschrift moet vóór afloop van de termijn van zes weken bij het waterschap zijn ingediend. Tegen de beslissing op bezwaar staat vervolgens beroep en hoger beroep open bij de rechtbank en de Raad van State.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan gelijktijdig of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamd 'verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening' worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval is griffierecht verschuldigd. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de rechtbank Oost-Brabant sector bestuursrecht. Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat op het bezwaar is beslist. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang.





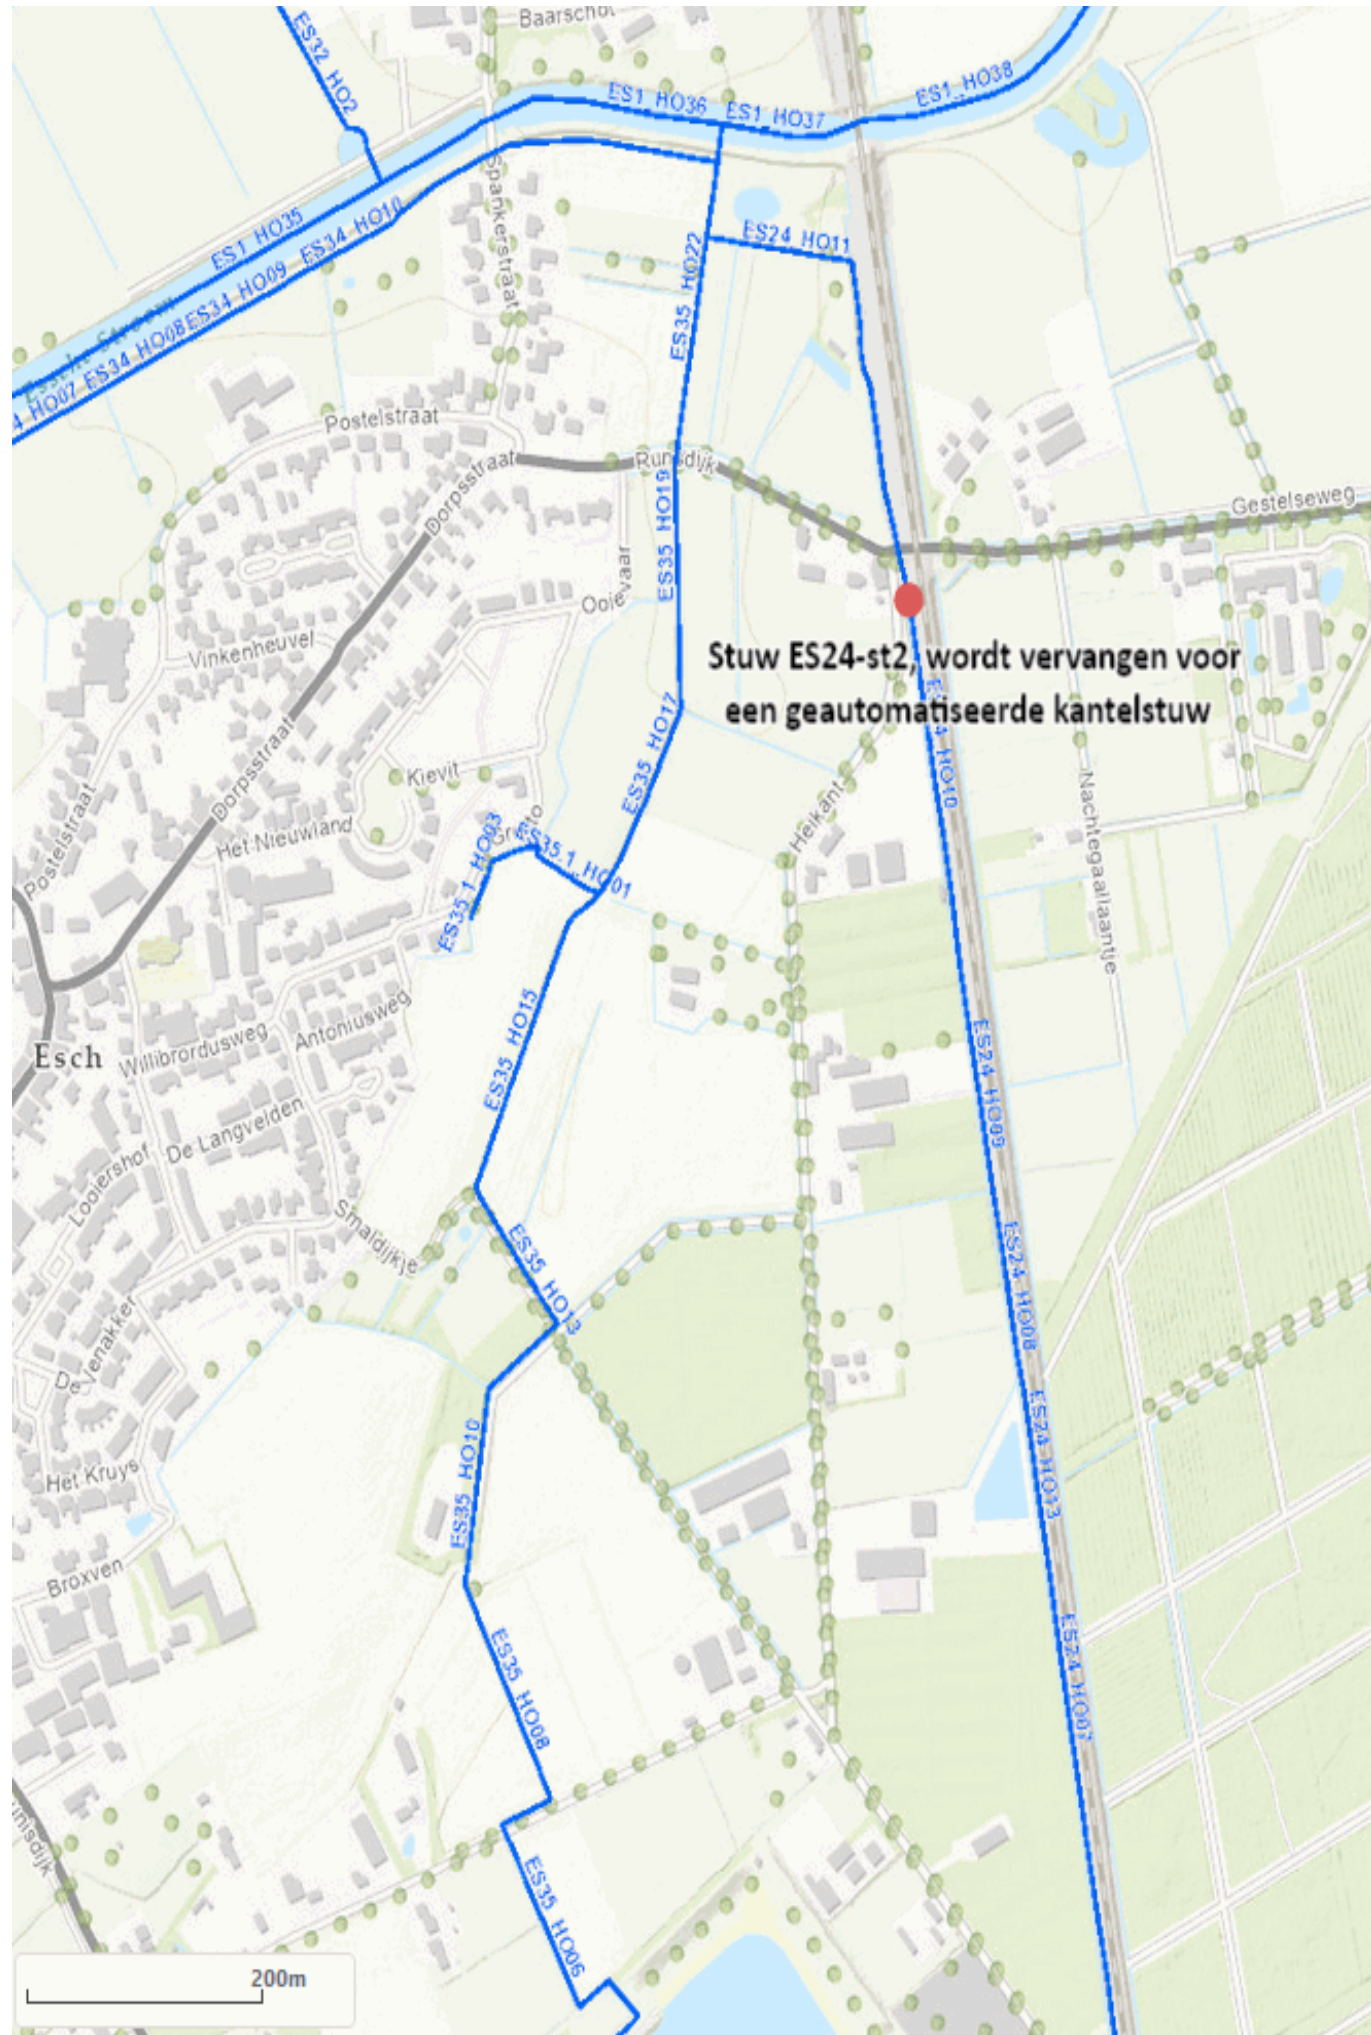

Naam: 574705 Haaren, Ruijsbossche Waterloop, ZL34: Automatiseren stuwen ES24-st2, ZL34-st2 en ZL34-st3

