



# Projectplan Waterwet voor vervangen Buikstedestuw KST0486

**Auteur(s)**  
Beheer WSWV

Voor



Na



**Opdrachtgever**  
Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen



## Inhoud

blz.

<b>1</b>	<b>Vervangen klepstuw .....</b>	<b>3</b>
1.1	Aanleiding en doel .....	3
1.2	Ligging schotbalkstuw .....	3
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken .....	3
1.4	Beschikbaarheid gronden .....	3
1.5	Effecten van de klepstuw .....	3
1.6	Wijze waarop het werk werd uitgevoerd.....	4
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....	4
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan .....</i>	<i>4</i>
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering .....</i>	<i>4</i>
1.1.1	<i>Nadeelcompensatie .....</i>	<i>4</i>
1.8	Legger en beheer en onderhoud.....	4
1.8.1	<i>Legger .....</i>	<i>4</i>
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud .....</i>	<i>4</i>
1.9	Samenwerking .....	4
<b>2</b>	<b>Verantwoording .....</b>	<b>4</b>
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving .....	4
2.2	Verantwoording op basis van beleid .....	5
1.1.2	<i>Toets beleid waterschap.....</i>	<i>5</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project.....	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen .....	5
<b>3</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure .....</b>	<b>6</b>
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....	6
3.2	Procedure .....	6
<b>4</b>	<b>Rechtsbescherming .....</b>	<b>7</b>






# 1 Vervangen klepstuw

## 1.1 Aanleiding en doel

Omdat de oude stuw te dicht bij een dam met duiker zat, was machinaal onderhoud onmogelijk. In overleg met eigenaren van aangrenzende gronden besloten om de stuw opnieuw op te bouwen 10 meter na de dam (achter het oude stortebed).

## 1.2 Ligging schotbalkstuw

De stuw bevindt zich in hoofdwatergang Martinustocht in Lutjegast.

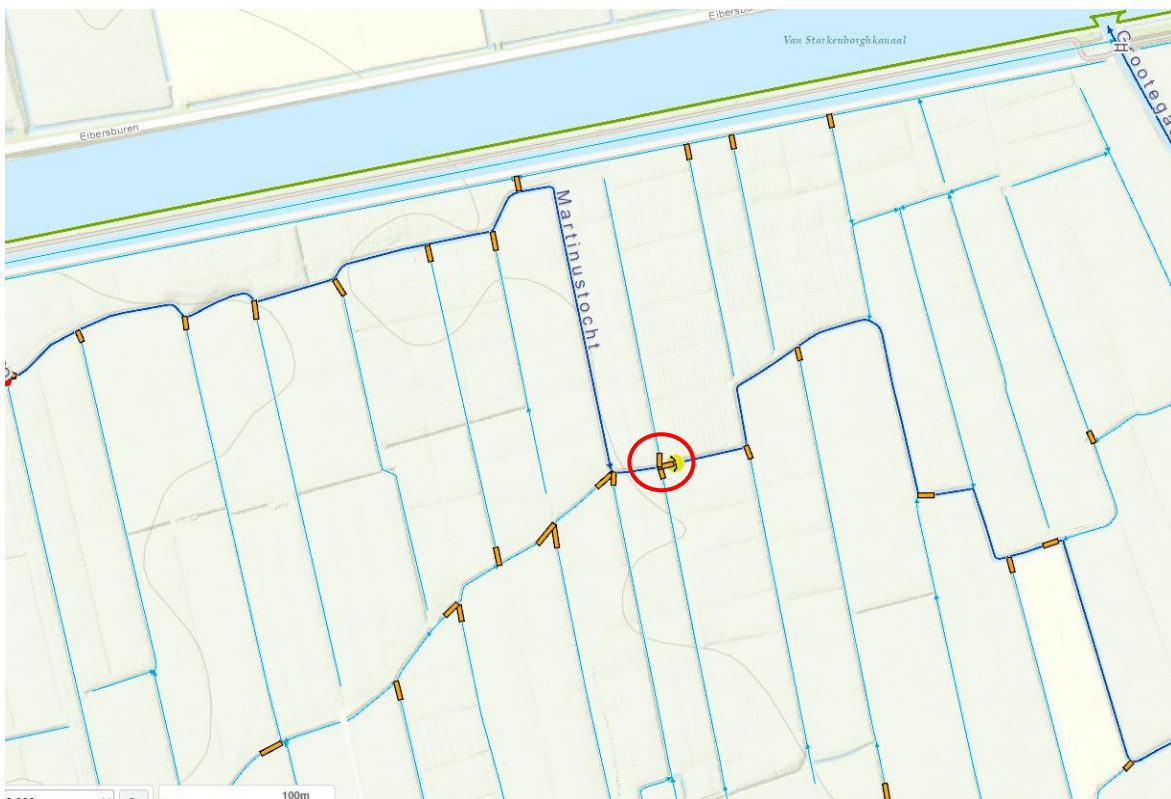

Figuur 1. locatie van de vervangen Buikstedestuw KST0486 (omcirkeld in rood)

## 1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De Buikstedestuw KST0486 is een kantel-stuw die het winterpeil van -1.15 m NAP en een zomerpeil van -0.95 m NAP in peilgebied Buikstede reguleert.

## 1.4 Beschikbaarheid gronden

De hoofdwatergang is in kadastraal eigendom van Waterschap Noorderzijlvest. De aangrenzende percelen GTG00M464 en GTG00M786 zijn niet in kadastraal eigendom van Noorderzijlvest. Een strook aan de zuidkant van de water op perceel GTG00M486 is gebruikt voor de aanvoer van materiaal en materieel. Daarvoor is tijdelijk een rijbaan met stalen rijbaanplaten aangelegd.

## 1.5 Effecten van de klepstuw



Door het vervangen en verplaatsen van de huidige klepstuw werd de waterbeheersing hersteld en onderhoud aan de watergang machinaal mogelijk gemaakt.

## **1.6 Wijze waarop het werk werd uitgevoerd**

Ter plaatse is de watergang dicht gezet met schotten om in den droge te kunnen werken. Dit is afgestemd met de peilbeheerder.

De aanwezige RVS klep is gecontroleerd op correcte werking en weer gebruikt in de nieuwe situatie.

## **1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

### **1.7.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan***

De waterhuishouding is verbeterd in de nieuwe situatie. In perioden met veel waterbezwaar kan dit water goed afgevoerd worden. Maar ook in drogere perioden blijft het bovenstroomse peilgebied op peil. Ook goed onderhoud van de watergang is nu mogelijk.

### **1.7.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering***

In overleg met de aangrenzende eigenaar en om het waterpeil zo snel mogelijk weer te kunnen hanteren is het project reeds uitgevoerd. Dit is in overleg met perceeleigenaren gedaan.

### **1.1.1 *Nadeelcompensatie***

Wanneer derden menen dat zij nadelige financiële gevolgen ondervinden van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe een dergelijk verzoek bij het waterschap in te dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, staat op onze website

<https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>

## **1.8 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.8.1 *Legger***

Het object, type, materiaal van de deelconstructies en hoofdconstructie en afmetingen van nieuwe klepstuw worden na realisatie opgemeten door een landmeter en opgenomen in het beheerregister van Noorderzijlvest. De hoofdconstructie en afmetingen worden vervolgens in de legger opgenomen.

### **1.8.2 *Beheer en onderhoud***

Het beheer en onderhoud van het waterstaatwerk wijkt na vervanging niet af van de huidige situatie. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de nieuwe schotbalkstuw berust bij waterschap Noorderzijlvest.

## **1.9 Samenwerking**

Het werk is in opdracht van waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd door Macadam B.V. Bakkeveen. De aangrenzend eigenaren zijn voor de uitvoering van het werk op de hoogte gesteld bij aanvang van het werk.

## **2 Verantwoording**

### **2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving**

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) waaronder:

- Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
- Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.



Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en die voor toepassing in de grond-, wegen- en waterbouw geschikt zijn.

## **2.2 Verantwoording op basis van beleid**

### **1.1.2 Toets beleid waterschap**

Beleid van het waterschap is onder andere onderhoud van kunstwerken, waarvan het beheer een eigendom bij het waterschap ligt, in geval de onderhoudsstaat dat aangeeft.

## **2.3 Verantwoording van de keuzen in het project**

De aanleiding tot het vervangen van de Buikstedestuw KST0486 is, dat de klepstuw geen goede waterbeheersing in het bovengenoemde gebied meer kon garanderen omdat deze aan het einde van de levensduur was en onderhoud van de watergang lastig.

## **2.4 Benodigde vergunningen en meldingen**

n.v.t.



### **3 Bevoegdheid en gevolgde procedure**

#### **3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan**

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 5610. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap.

Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruik making van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 02 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

#### **3.2 Procedure**

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.



## 4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.
