


Algemene gegevens

Type	Boom niet vrij uitgroeiend	Beheerder	Gemeente
- gedetailleerd		- gedetailleerd	R&E_VOR_Bomen
Soortnaam	Sorbus intermedia	Eigenaar	Gemeente
- Nederlands	Zweedse meelbes	- gedetailleerd	Gemeente Amsterdam
- boomgrootte		Onderhoudsplichtige	
Meerstammig		Beheerafspraak	Boom - BOOM IN BEPLANTING
Jaar van aanleg (leeftijd)	197550 jaar	Omgevingsrisicoklasse	2. Gemiddeld
Standplaats	Planten	Controlefrequentie BVC	Eens in 3 jaar
- gedetailleerd	Vaste planten	Jaar volgende inspectie	2025
Beschermingsstatus		Cyclus segment	C
- gedetailleerd		Actuele opkroonhoogte	Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewenst
Groeifase		Beoogde opkroonhoogte	
Actuele ecostatus		Beleid opmerkingen	
		Memo (algemeen)	
Beheergebied	Noord-West	Stadsdeel	Noord
Openbare ruimte	Tussendek	Woonplaats	Amsterdam
Buurt	Banne-Noordwest	Gemeente	Amsterdam
Wijk	Banne Buiksloot	Sportterrein	
		Deelsportcomplex	
		Postcode	

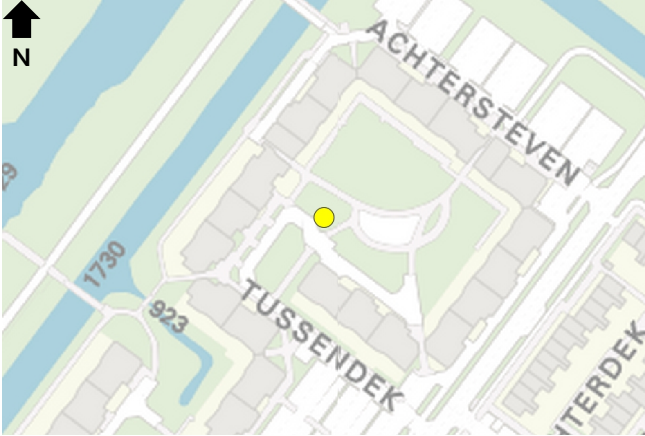

Algemene gegevens - Boomvoorzieningen

<<Niet ingevuld>>

Algemene gegevens - Memo

<<Niet ingevuld>>

Nader technisch onderzoek (NTO)

Inspectietype	Datum	Insp. organisatie	Vaste gegevens	Positie	Stamdiameter	Stamdiameterkl.	Boomhoogtekl.	Actuele opkroon.	Kroondiameterkl	Boomconditie	Boombeeld	Veiligheidsklasse	Toekomstverw.
NTO	29-09-2022	Idverde	Juist	Juist	33 cm	0,3 tot 0,5 m.				c. Onvoldoende	a. Aanvaard boombeeld	Risicoboom	a. 0 tot 5 jaar

Nader technisch onderzoek (NTO) - Foto's

Datum

29-09-2022

Foto's



Nader technisch onderzoek (NTO) - gebreken

Datum	Plaats	Gebrek	Afwijking	Risico/gevolg	Opmerking	Foto
29-9-2022	Stamvoet	Zwam/schimmel	Dikrandtonderzwam	Stambreuk of instabiliteit		
29-9-2022	Stamvoet	Mechanisch defect	Klankafwijking	Stambreuk of instabiliteit		

Nader technisch onderzoek (NTO) - conclusies en advies onderzoek

Datum	Status onderzoek	Conclusie en advies onderzoek	Opmerking advies	NTO Aanvullend onderzoek	Advies duurzame instandhouding
29-9-2022	Onderzoek na vervolg afgerond	Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheidscategorie van de boom en de omvangrijke aantasting door de dikrandtonderzwam aan de stamvoet is het advies om de boom binnen 6 maanden te verwijderen.	<<Niet ingevuld>>	<<Niet ingevuld>>	De parasitaire zwamaantasting (dikrandtonderzwam) is een onomkeerbaar proces dat van invloed is op de duurzame instandhouding van de boom. Vanwege het type en de mate van aantasting is de boom niet duurzaam in stand te houden op locatie.


Nader technisch onderzoek (NTO) - Metingen

Datum	29-09-2022
Onderzoeksmethode	Visuele inspectie prikken en kloppen (KLP)
- locatie	Visuele Inspectie prikken en kloppen op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	Westzijde
Meethoogte	
Stamdiameter	45
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	
Min. restw. Mattheck x 1.4	
Meetwaarden per meting	10 cm indringing
Omvang	30-40%
Ernst	Licht
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	Horizontaal
Indicatie restwanddikte	20
Overig	

Datum	29-09-2022
Onderzoeksmethode	Geluidstomograaf (GT)
- locatie	Geluidstomograaf op maaiveld
Locatie onderzoek	Stamvoet
Windrichting	
Meethoogte	6
Stamdiameter	45
- op meet of prikhoogte	
Min. restw. Mattheck	6,75
Min. restw. Mattheck x 1.4	9,45
Meetwaarden per meting	Over 100% van de omtrek minder dan de minimale benodigde restwanddikte
Omvang	
Ernst	Ernstig
Afstand tov hart stam	
Maatvoering sleuf LBD	
Prikrichting	
Indicatie restwanddikte	
Overig	

Foto

Foto

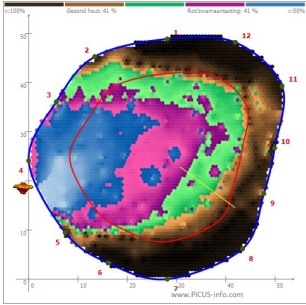

Boomveiligheidsinspecties (NTO) - maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
29-09-2022	ldverde	Vellen (boom verwijderen) (q)		< 6 maanden	13-5-2025	Vellen (boom verwijderen)		Boom was in eerder kapbesluit, maar niet meegekomen in het handmatige proces.

Ecoscan - Maatregelen

Datum inspectie	Insp. organisatie	Maatregel	- gedetailleerd	Urgentie	Datum besluit	Besluit maatregel	- gedetailleerd	Toelichting
-----------------	-------------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-------------------	-----------------	-------------
