


Zoals afgesproken hierbij de onderbouwing waarom de bomen weg moeten. Zoals je hieronder kan zien schuift de asfaltconstructie de groenstrook in.

Dit is natuurlijk niet wenselijk. Om dit op te lossen moeten we de gehele asfaltconstructie incl. fundering verwijderen. Ook zullen we de groenstrook moeten ontgraven om ruimte te maken om de L elementen te kunnen aanbrengen. We gaan aan twee zijden L elementen aanbrengen en koppelen deze aan elkaar. Daarnaast willen we bomengranulaat terug aanbrengen om meer body te creëren voor de L elementen. De overlevingskansen van de bomen wordt zeer mager als we daar veel moeten ontgraven. We zien dus graag dat de bomen worden gekapt en tijdelijk worden verplaatst en weer terug worden geplant op locatie. Kun je hiermee uit de voeten of heb je meer van mij nodig?




De groenstroken blijven gehandhaafd.

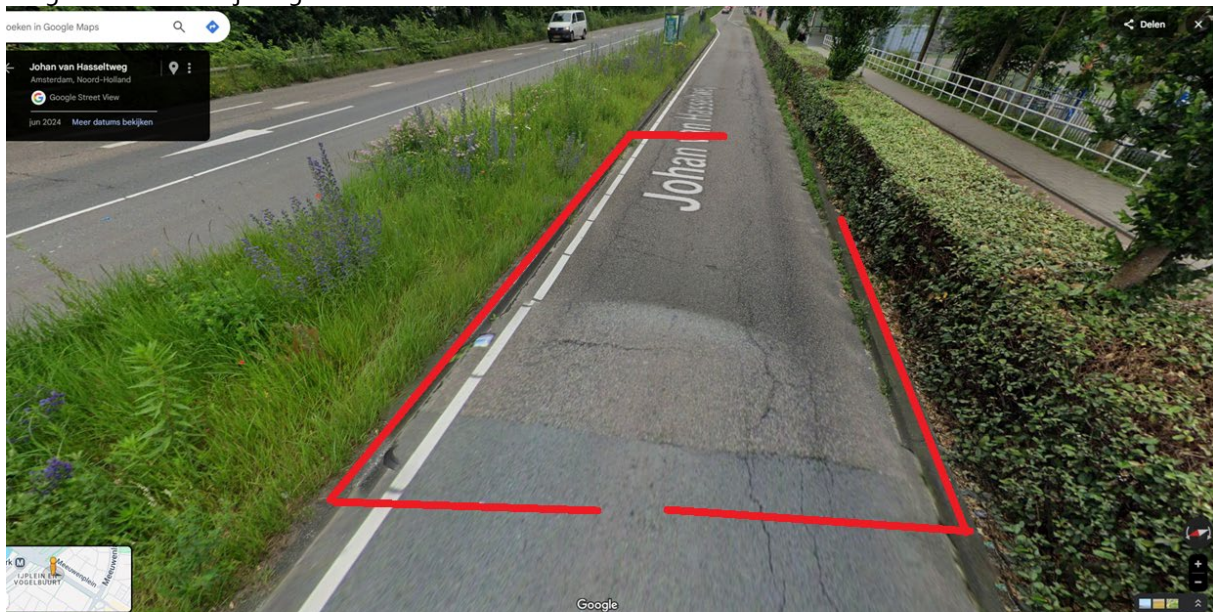

Vragen inclusief antwoord:

- Worden de elementen over de gehele lengte van de groenstrook aangebracht? **Ja**
- Welke afmetingen hebben de L-elementen? **Dat is nog niet bekend, maar iig met een voet van 0,5 m en 0,8 hoog**
- Tot welke diepte moet worden afgegraven? **0,8 m**
 - o Is het bijvoorbeeld mogelijk om de elementen te plaatsen zonder de groenstrook van de bomen af te graven? **Nee want we willen de fundering verbreden dmv bomengranulaat.**

Schets hieronder (maatvoering buiten beschouwing laten)

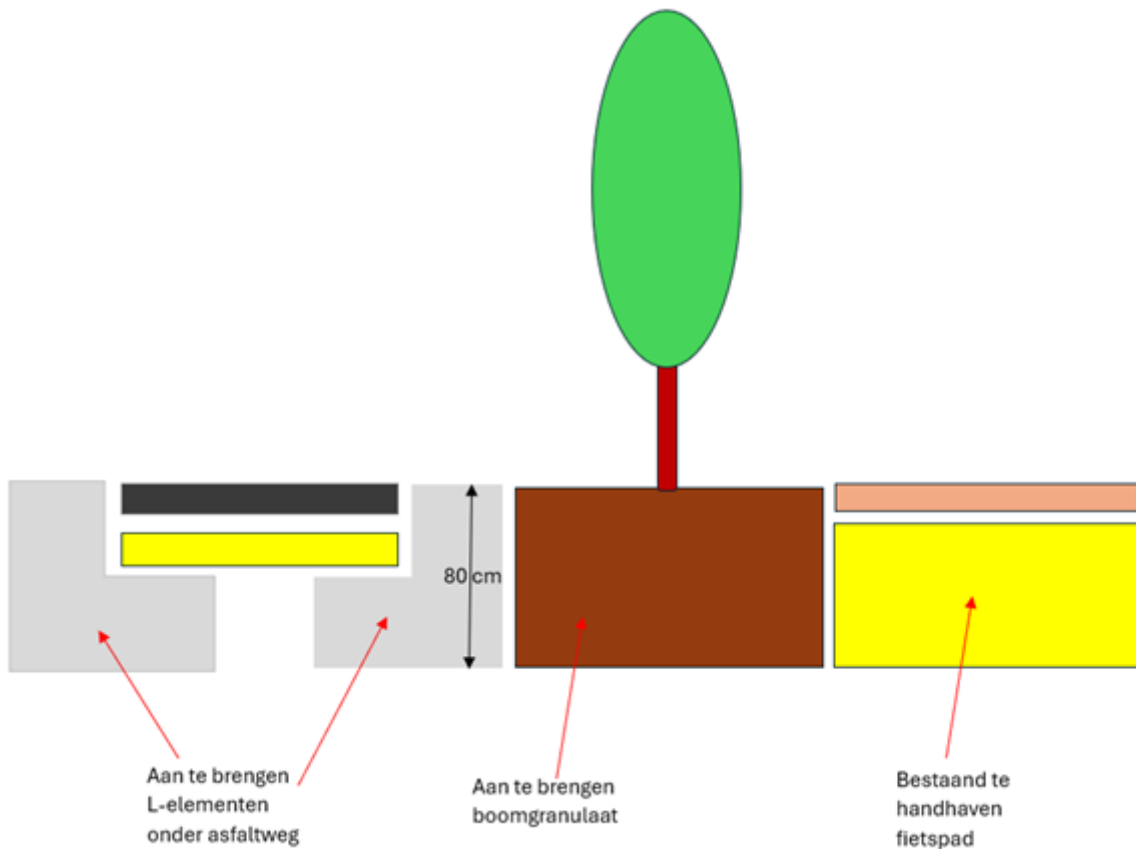

Boomgranulaat als fundering en versteviging van de L-elementen.
