


Plan van Aanpak – Verplaatsing bomen Tijdelijk JC Molenwijk



Project Tijdelijk Jongerencentrum Molenwijk
Onderdeel Bijlage bij aanvraag omgevingsvergunning
Datum 11 augustus 2025

INTRO

Om zo min mogelijk negatieve impact te maken op het bestaande groen op de bouwlocatie is het noodzakelijk 2 jonge lindes te verplaatsen. Hierover is overleg geweest met de relevante contactpersonen bij de Gemeente Amsterdam. Ook zijn tijdens de informatieavond van 24 juni jl de bewoners over dit voornemen geïnformeerd.

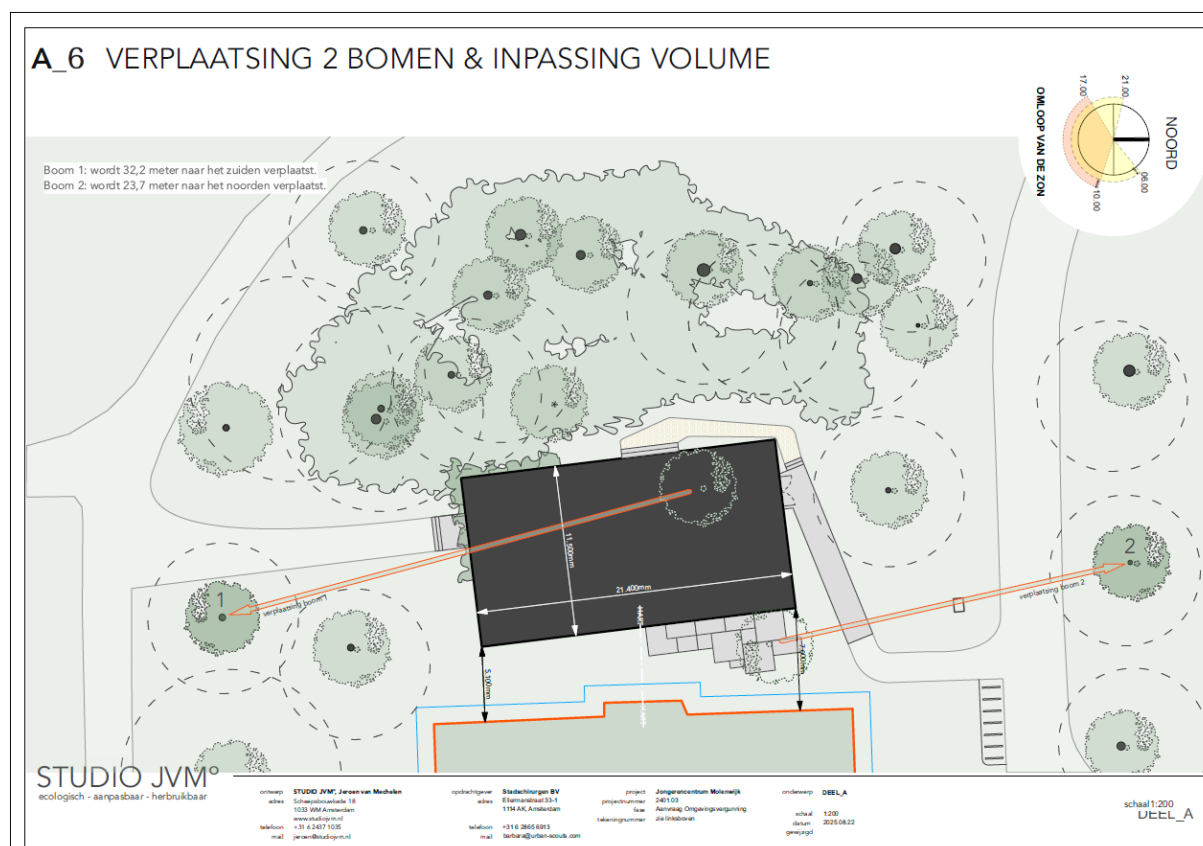


Plan van Aanpak – Verplaatsing bomen Tijdelijk JC Molenwijk



De bomen worden verplant met een kluitdiameter van 270 cm en verticaal vervoerd naar de plantlocatie alwaar geplant (zie tekening hierboven).

Voor aanvang van het werk dient er door u een clickmelding en proefsleuven gemaakt te worden.

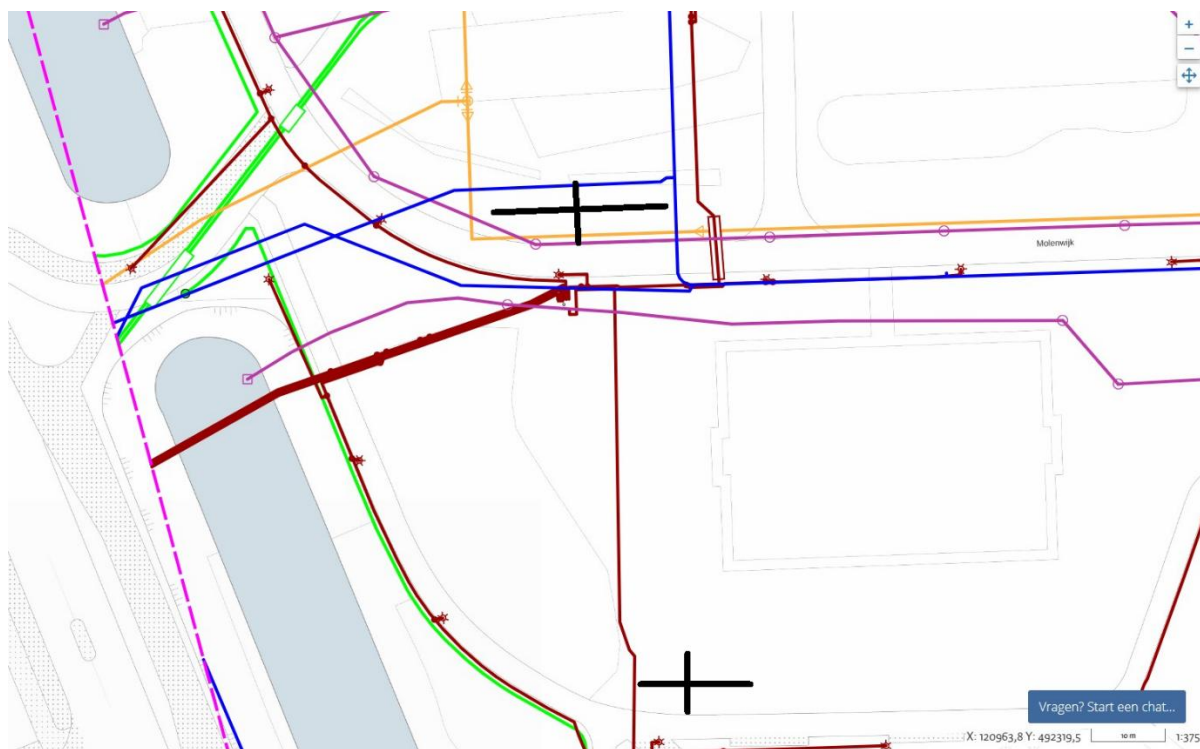

Op bijgevoegde uitsnede van de klik melding is op de nieuwe locaties van de 2 bomen, aangegeven met een zwart kruis, te zien dat er kabels en leidingen in de ondergrond lopen en daarom ook proefsleuven gegraven zouden moeten worden om inzichtelijk te krijgen of deze kabels en leidingen de verplantwerkzaamheden eventueel belemmeren. De verwachting is dat het graven van de proefsleuven maximaal in 1 dag uitgevoerd zullen zijn.

Vraag aan opdrachtgever – gemeente Amsterdam: Voor met name de nazorg (o.a. watergeven), wordt dit, na de verplantwerkzaamheden, door de gemeente opgepakt?

Verwachte werkzaamheden

- 1) Voorbereiding: Graven van 2 proefsleuven; Mechanisch graven van de proefsleuf (minikraan); Vastleggen bevindingen middels foto's en GPS-meting op x-, y- en z coördinaten; Afzetten werkzaamheden met schrikhek; Uitwerken van gelokaliseerde K&L in dossier
- 2) Verplanten bomen – 1 dagdeel. De verplantmachine is niet geschikt om de oude plantlocatie en eventuele rijsporen te herstellen.
- 3) *Verankeren van bomen, herstellen van oude plantlocatie en eventuele rijsporen*
- 4) *Nazorg bomen – wordt door gemeente opgevolgd?*

Plan van Aanpak – Verplaatsing bomen Tijdelijk JC Molenwijk



Verwachte kosten:

- 1) Voorbereiding: proefsleuven € 3.244 excl btw + werkvoorbereiding en projectleiding (nacalculatie)
- 2) Verplanten bomen € 1.466,- excl. btw.
- 3) *Verankeren & herstellen: € 2.500 (raming – nog nader te bepalen)*
5% onvoorzien: € 361

TOTAAL: € 7.576
