




Ik wil...

Tools

40m

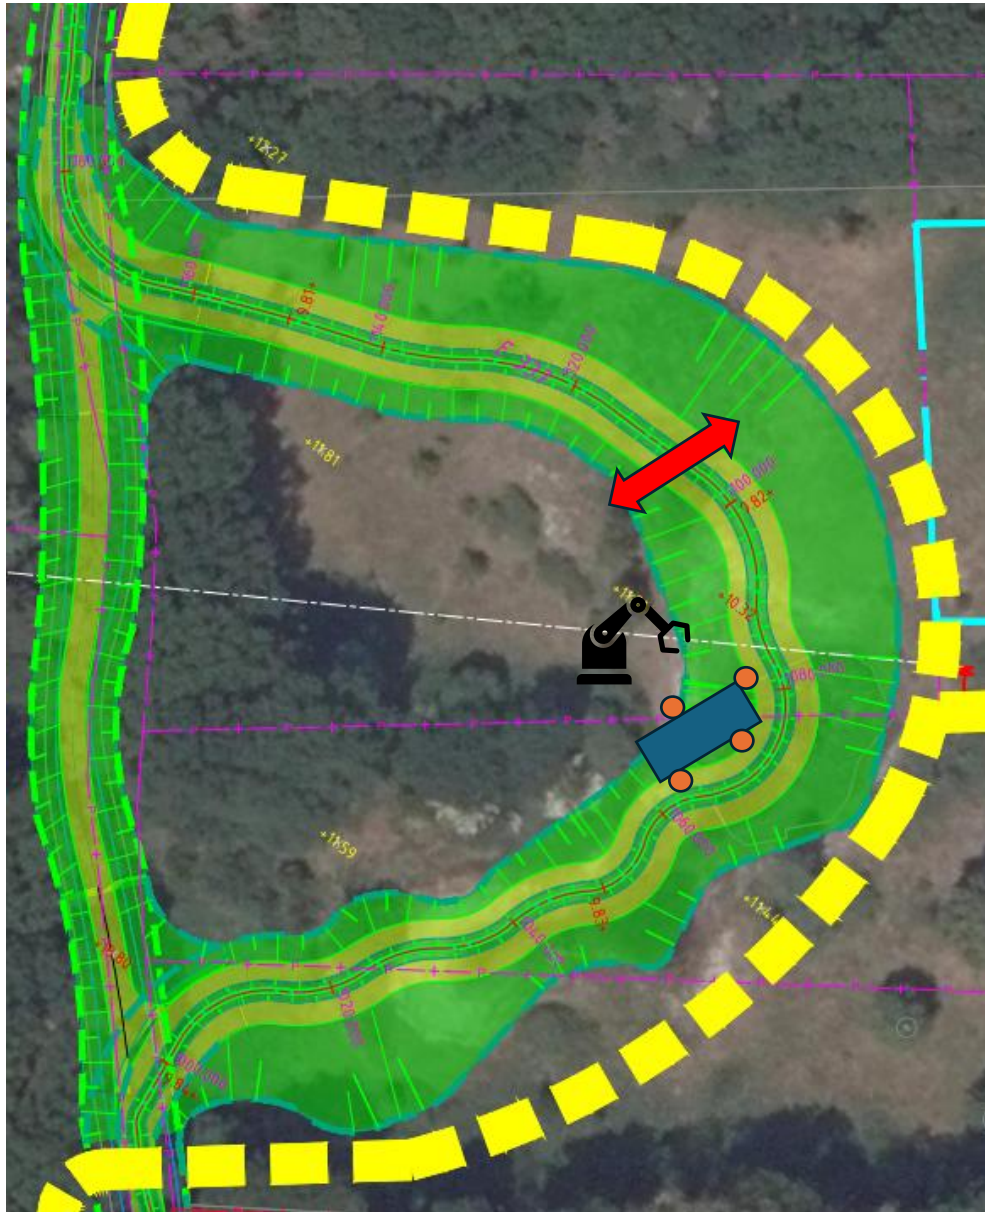

Aanleiding:

Afgelopen jaren heeft er beekherstel plaatsgevonden in de Oude Leij, nabij Bosperceel. Binnen het project was het de opgave om ook beekhout in te brengen. Echter kon hier vanwege beschikbaar hout en reeds gemaakte kosten geen invulling aangegeven worden tijdens de uitvoering. Met snoeiwerkzaamheden in de winter 2026 komt er voldoende groot materieel vrij, waardoor alsnog invulling gegeven kan worden aan de opgave.

Hieronder wordt de maatregel meer in detail beschreven.

Beschrijving uitvoering:

Het werk wordt uitgevoerd met een bandenkraan en tractor met kiepkar (vervoer stammen).

De boomstam(men) wordt (en) in de lengterichting (stroomrichting) van de waterloop geplaatst met minimaal 50cm in de oever verwerkt om achterloopsheid te voorkomen.

Middels minimaal 4 palen wordt de boomstam gestabiliseerd om deze op zijn plek te houden (wordt gespecificeerd in het veld).

Het doorstroomprofiel wordt voor maximaal 50% (zie tekening) vol gelegd met beschikbaar hout, zodat de overgedimensioneerde meander op een natuurlijke manier kan aanzanden achter het hout en meer structuur en variatie wordt aangebracht.

Planning:

Snoeiwerkzaamheden staan gepland in de week van 2 maart te Oosterhout, waarbij hout beschikbaar komt van voldoende volume en meteen na vrijgave verwerkt kan worden op locatie in Tilburg (meander Koningspoel).

Onder ecologische begeleiding en vrijgave van de waterschapsecoloog worden de werkzaamheden uitgevoerd door proces Onderhouden voor 15 maart (start broedvogelseizoen).
