




Vergraven watergang Limiettocht

Projectnummer: 91726

Corsanummer: 14.46208

(Ontwerp)projectplan
op basis van artikel 5.4 van de Waterwet

Projectnummer	Projectnaam
91726	Vergraven watergang Limiettocht
Opgesteld door: Klara Kesslerova	Vaststelling door
Datum:	C. de Booy P&P
12/8/14	Handtekening  C. de Booy



INHOUDSOPGAVE

Samenvatting.....	3
Inleiding	4
Projectomschrijving.....	6
Wetten, regels en kader	7
Project beschrijving.....	7
Wijze van uitvoering.....	8
Besluitvorming en procedure	8
Woordenlijst.....	8
Bijlage 1 Principeprofiel	
Bijlage 2 Percelen aanpassingen	
Bijlage 3 Afspraken aanpassingen	

Samenvatting


Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het peilbesluit van 2008 voor Polder de Noordplas. Hierbij zal in 2016 het peil met 18 cm worden opgezet. Tijdens een veldinventarisatie is gebleken dat het huidige doorstroomprofiel van de Limiettocht niet overeen komt met het in de legger vastgestelde profiel. Dit vormt een knelpunt bij het hydraulisch functioneren van Polder de Noordplas. Om dit te verhelpen dienen er een aantal maatregelen genomen te worden. De maatregelen waarop dit projectplan betrekking heeft zijn het vergraven van de watergang naar het gewenste doorstroomprofiel en het verflauwen van de oevers van de Limiettocht.

Inleiding

Aanleiding en doel van het project

Projectgebied

Polder De Noordplas ligt in de provincie Zuid-Holland tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder maakt deel uit van de gemeenten Boskoop, Rijnwoude, Zoetermeer, Zoeterwoude en Waddinxveen. De Polder ligt in het zuiden van het beheersgebied van Hoogheemraadschap Rijnland en is met ongeveer 4.480 ha één van de grootste polders in het beheer van het Hoogheemraadschap. Het projectgebied ligt in het zuidwesten van deze polder en ligt in het toekomstig peilvak WW-25b en WW-25aj.

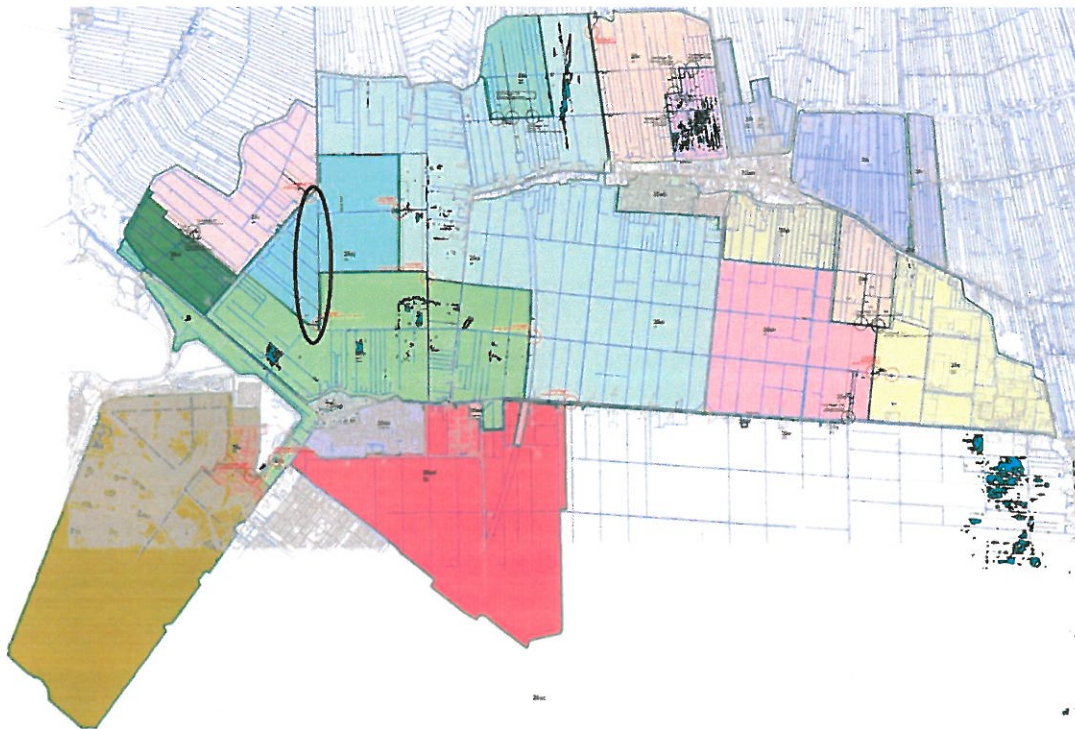

Afbeelding 1: Polder De Noordplas met plangebied

Dit projectplan heeft ook gevolgen voor de eigenaren van aanliggende percelen van de Limiettocht te Gelderswoude.



Afbeelding 2: de kadastrale percelen

Projectomschrijving

Door de instabiliteit in de ondergrond zijn de oevers langs de watergang Limiettocht de afgelopen jaren ernstig afgekalfd. Daarnaast is het reguliere baggerprogramma de afgelopen jaren uitgesteld wegens onduidelijkheid over de opbarstingsrisico's. Hierdoor is er een hydraulisch knelpunt ontstaan die er voor zorgt dat er onvoldoende watervoerend vermogen is in de Limiettocht. Dit heeft ook wateroverlast op grasland en landbouw grond als gevolg.

De maatregelen beschreven in dit plan zorgen ervoor dat de oeverafkalving wordt tegen gegaan en dat de afvoer van de watergang verbeterd wordt. Het project dient uitgevoerd te worden in het kader van de peilopzet van 18 cm in 2016 welke is vastgelegd in het peilbesluit van 2008.

De watergang Limiettocht is gelegen in Polder de Noordplas in het peilvak WW-25b met een zomerpeil peil van -6,32 N.A.P. en een winterpeil van -6,50 N.A.P. Deze watergang zal in toekomstig (2016) peilvak WW-25aj komen te liggen met een vast peil van -6,32 N.A.P.

De percelen zijn in eigendom van particuliere agrariërs. Langs de watergang is afwisselend akkerbouw en veeteelt.

Om het watervoerend vermogen van de watergang te handhaven zullen langs beide zijdes de oevers worden verflauwd. Daarnaast worden er grond werkzaamheden uitgevoerd om het gewenste doorstroomprofiel te creëren. De grond die hierbij vrijkomt zal ter plekke verwerkt worden voor het inrichten van de verflauwde oevers. Door middel van deze maatregelen zal de waterafvoer verbeteren en zal de wateroverlast op grasland en landbouwgrond verminderen.

Uit te voeren maatregelen:

- Grondwerkzaamheden betreffen het vergraven van de watergang naar het gewenste doorstroomprofiel. Hierbij wordt de waterbodem over een breedte van 3,5 m met gemiddeld 0,35 meter verdiept. De vrijkomende grond wordt op de kant verspreid met een dikte van maximaal 0,20 cm.
- Het ontgraven van de taluds aan de westzijde van de Limiettocht. De taluds zullen worden aangelegd variërend van 1:1,5 (akkerbouw) tot 1:2 (grasland). In overleg met de aanliggende perceeleigenaren is besloten welk talud voor welke percelen wordt aangelegd. In bijlage 1 staan de specificaties van het principeprofiel.
- Het aanbrengen van een grondstabiliserende constructie die zal dienen als vooroever bescherming. Deze constructie zal dienen als onderwaterconstructie in de vorm van een palenrij van onbehandeld vurenhout. Er zal geen bovenwater beschoeiing geplaatst worden. In overleg met de perceel eigenaren kan er besloten zijn om deze constructie in combinatie met een plasberm aan te leggen. De grond die vergraven wordt zal ter plekke verwerkt worden.
- In totaal zal er zo'n 1600 m worden vergraven en 450 m vooroeverbescherming aangebracht worden.

Wetten, regels en kader

Rijnlandse beleid

- Beleidsregels en algemene regels van Rijnland;
- Keur 2011;
- Legger van oppervlaktewater.

Project beschrijving

Het project voorziet in een aantal maatregelen die genomen moeten worden om het juiste watervoerend vermogen te realiseren. Dit in verband met de geplande peilopzet van 16 cm in 2016 welke is vastgelegd in het peilbesluit van 2008. Het project wordt opgezet in een pilotvorm om te beoordelen of dit een geschikte, snelle en efficiënte manier is om vergelijkbare projecten aan te pakken. In bijlage 2 zijn de betreffende percelen aangegeven.

Tijdens veldinventarisaties met de eigenaren van de aanliggende percelen is er gecommuniceerd op wat voor manier de oevers ingericht zouden moeten worden. Hierbij legde Rijnland de eigenaren een aantal keuzemogelijkheden voor. De keuze kon gemaakt worden tussen een verflauwd bovenwatertalud van 1:1,5 of 1:2. Naast verflauwing van het bovenwatertalud is bepaald in hoeverre een aanpassing aan het onderwatertalud noodzakelijk is. Indien een aanpassing noodzakelijk is, is eveneens door de perceeleigenaren een voorkeursoplossing aangegeven. De oplossingen bestaan uit het aanbrengen van onderwaterbeschoeiing, de aanleg van een plasberm, of anders. In bijlage 3 zijn de gekozen aanpassingen zichtbaar.

In bijlage 1 wordt het principeprofiel weergegeven van de westzijde van watergang Limiettocht. De oevers van de watergang aan de percelen van de heer Leune en van der Linde worden aangelegd met een plasberm. Het talud bij deze percelen wordt gegraven op 1:1,5 daarnaast zal er een onderwater grond stabiliserende constructie aangelegd worden in de vorm van een palenrij.

De oevers van de watergang aan de percelen van de heer Oppelaar worden verflauwd aangelegd met een bovenwatertalud van 1:2. Het onderwatertalud zal enkel aangelegd worden met een randje riet waarbij er op perceel D668 een drinkplaats voor het vee wordt aangelegd.

De oevers van de watergang aan de percelen van de heer Straathof worden verflauwd aangelegd met een bovenwatertalud van 1:2. Het onderwatertalud zal enkel aangelegd worden met een randje riet.

Eisen en randvoorwaarden

Voor het projectplan gelden de volgende eisen en randvoorwaarden:

- Tijdens de uitvoering moet de afvoercapaciteit gehandhaafd blijven.
- Tijdens de uitvoering mag het peil niet verlaagd worden.
- De nieuwe profielen van de watergang moeten voldoende watervoerend vermogen hebben.
- De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dit in verband met het gebruik van de percelen.

Uitgevoerde onderzoeken

Ten behoeve van deze pilot is op 14 juni 2014 een quickscan verricht naar de flora en fauna. Hieruit blijkt dat er geen bezwaar is voor de werkzaamheden op desbetreffende locaties tussen september en half maart. Als de werkzaamheden buiten deze maanden vallen moet er een aanvullend onderzoek gedaan worden naar de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient ook een waterbodemonderzoek verricht te worden. Dit zal uitgevoerd worden door de desbetreffende aannemer die de werkzaamheden zal gaan verrichten.

Wijze van uitvoering

Project

De werkzaamheden van het project worden gefaseerd uitgevoerd vanwege het gebruik van de verschillende percelen. De aannemer dient de werkzaamheden in overleg met de pachters van de percelen af te stemmen. De werkzaamheden mogen pas worden aangevangen en uitgevoerd wanneer er toestemming is van de toezichthouder (Het Hoogheemraadschap van Rijnland).

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de betreffende perceeleigenaren.

Vergunningen, ontheffingen

Voor de uitvoering van deze pilot zijn behalve het projectplan geen aanvullende vergunningen vereist. Een ontheffing i.h.k. van de flora- en faunawet is niet noodzakelijk. Het werken volgens de werkprotocollen volstaat.

Legger

De verbreiding van de watergangen leidt tot een leggeraanpassing.

Financiën

De kosten worden gedragen door het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud wordt na uitvoering van de werkzaamheden overgedragen aan de betreffende grondeigenaren.

Besluitvorming en procedure

Communicatie

Bekendmaking van het projectplan geschied door publicatie in het Waterschapsblad. Aan de direct betrokkenen wordt het projectplan gestuurd.

Woordenlijst

Beheer

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de

functies van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen en normen.

Beheersgebied In de legger gespecificeerd areaal, dat als waterkering wordt aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd.

Beschoeiing Wand bestemd om grond te keren.

Boezem Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden watergangen die van het buitenwater zijn afgesloten, waarop water uit laag gelegen polders wordt uitgeslagen en/of waaruit water op laag gelegen polders wordt afgelaten en van waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het buitenwater.

Boezempeil Waterstand in boezem.

Buitengewoon Onderhoud Ook vaak "groot" onderhoud genoemd: Onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten.

Fauna Dieren

Flora Planten

Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en vuil verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld dieren en mensen.

Keur Verordening van het hoogheemraadschap, waarin gebods- en verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door sancties kan worden afgedwongen.

Kwel Uittreden van grondwater onder invloed van een waterstandsverschil.

Oeverconstructie Grondkerende constructie ter instandhouding van de gronden gelegen aan de waterloop.

Onderhoud Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, afmeting en constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en overmatige plantengroei. Zie ook **buitengewoon** en **gewoon onderhoud**.


Polder Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde waterstand.

Talud Hellend vlak van een dijklichaam en/of watergang.

Waterhuishouding
van water in

Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer
een gebied verloopt.

Bijlage 1 Principeprofiel

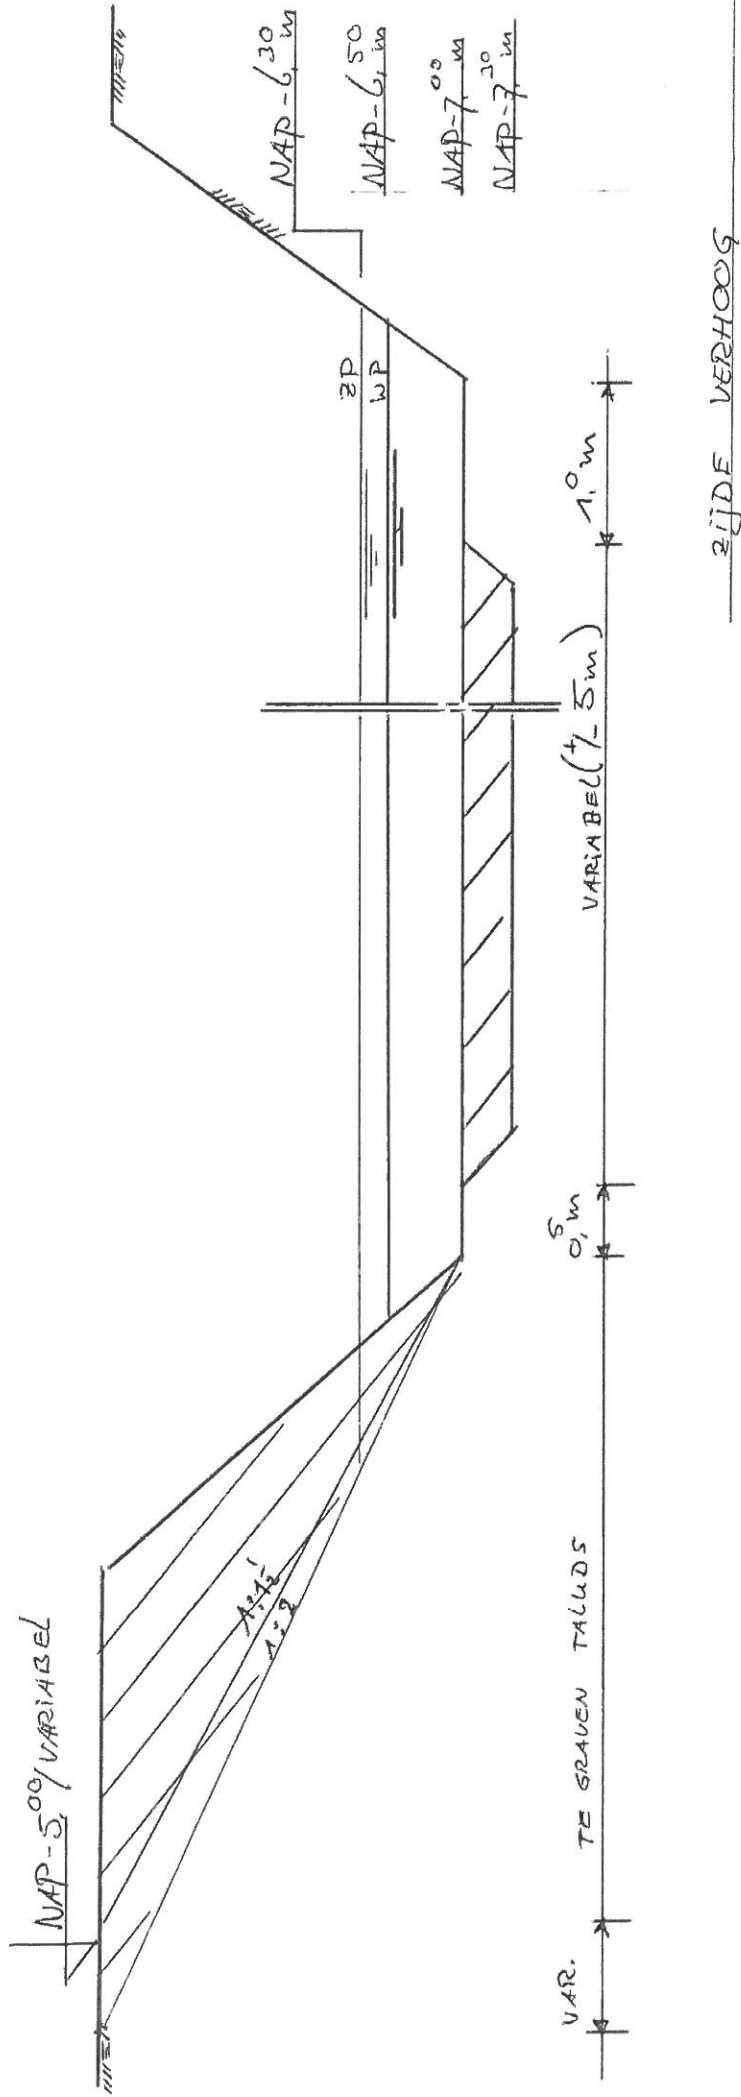

PRINCIPE PROFIEL GRONDWERK


19.05.2014

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Bijlage 2 Percelen aanpassingen

Bijlage taluds Limiettocht

offelaar

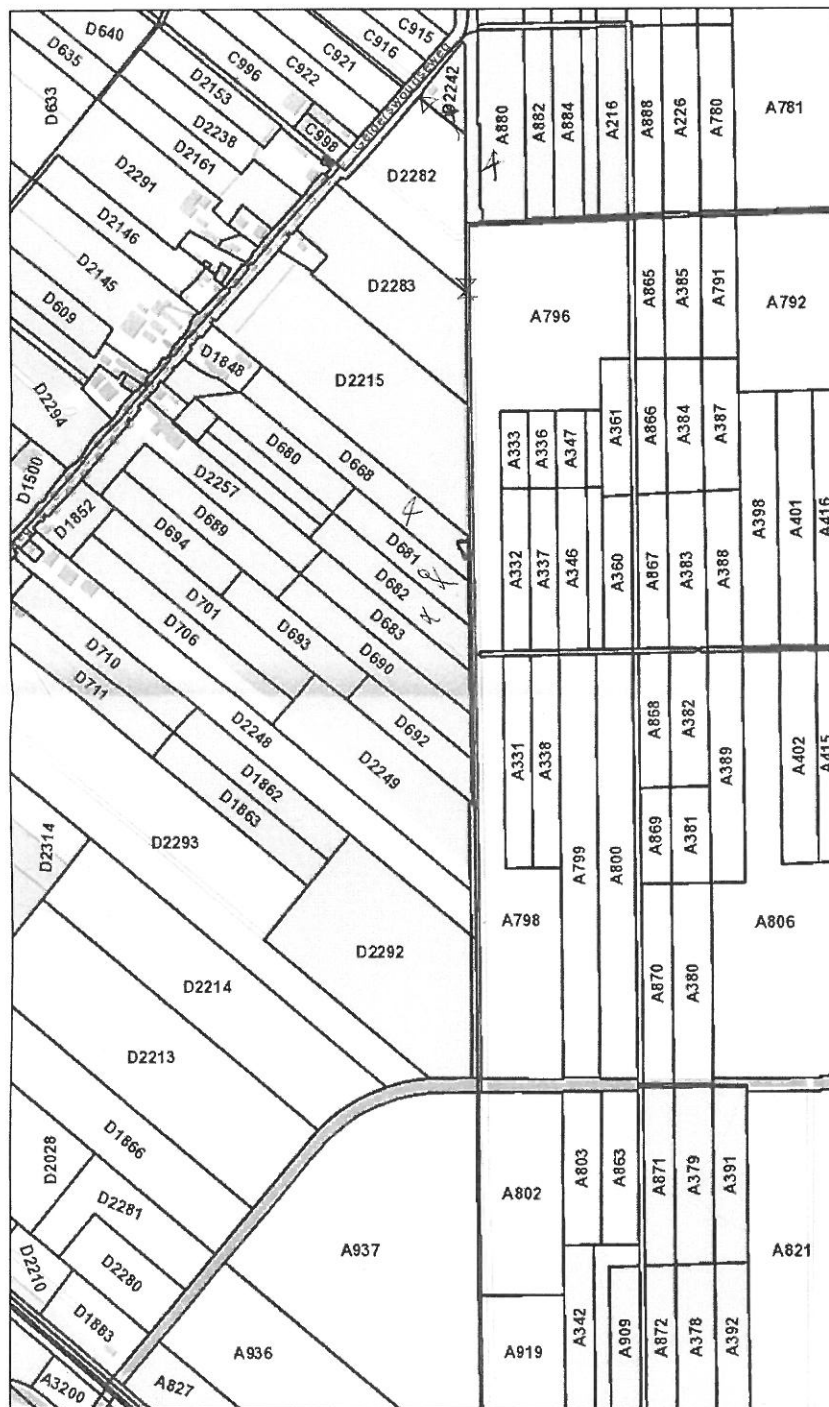

Legenda

-  rijnland
-  kadastraal perceel (teksten)
-  kadastraal perceel

Rijnland

Gooweb versie 4.1

Copyright © 2013 ESRI Nederland B.V., Grontmij Nederland B.V.


Topografische ondergronden (C) Topografische Dienst Kadaster, GBKN

Alle rechten voorbehouden

Auteur: R. Fontein


Datum: 22-04-2014

Schaal: 1:4.745

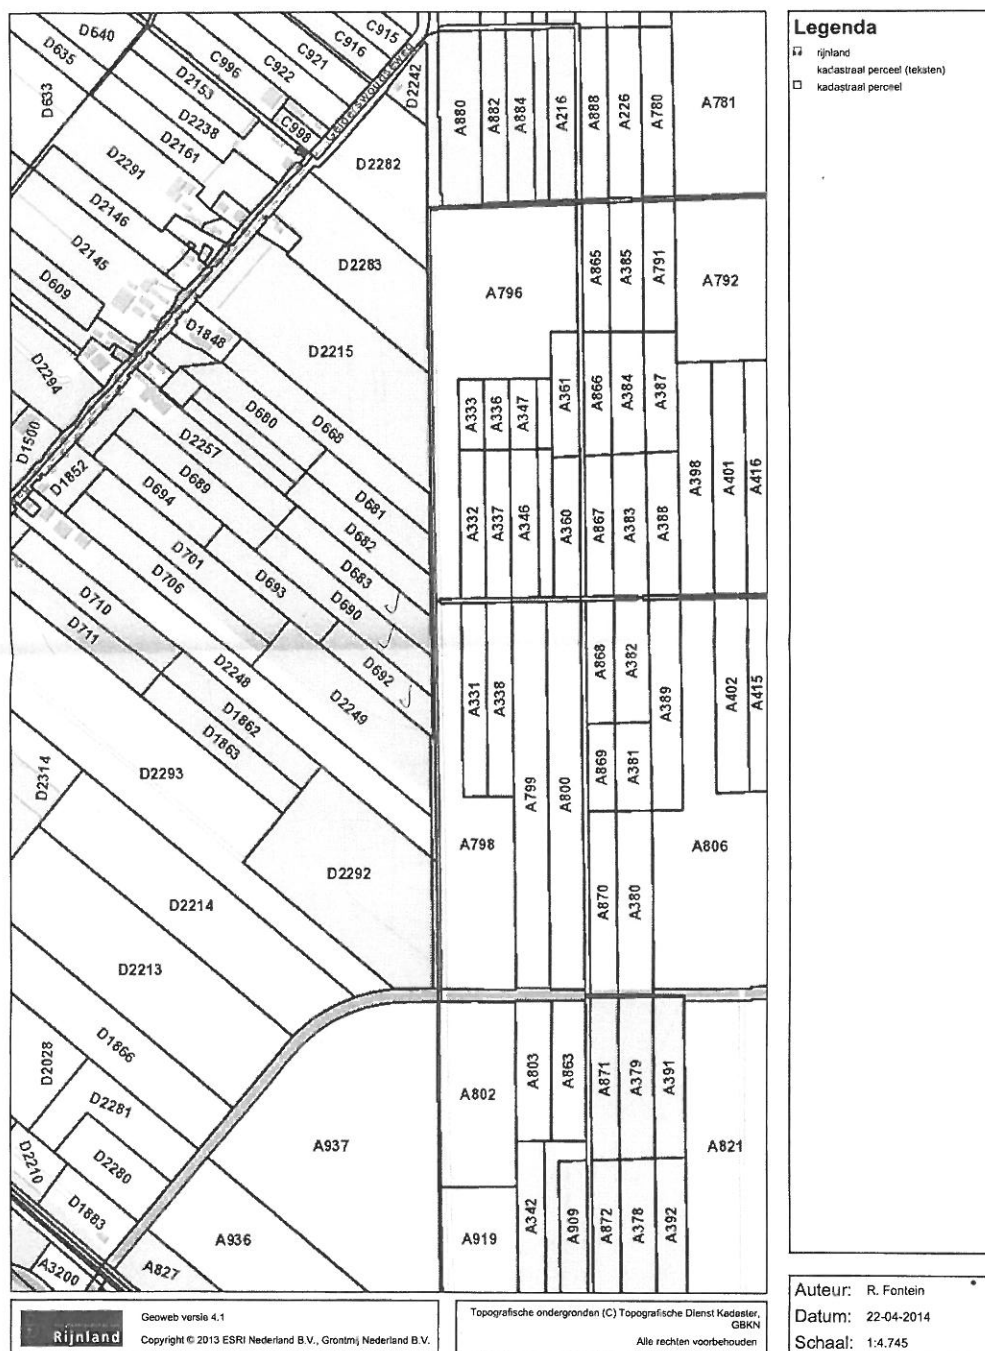

Bijlage taluds Limiettocht

straat

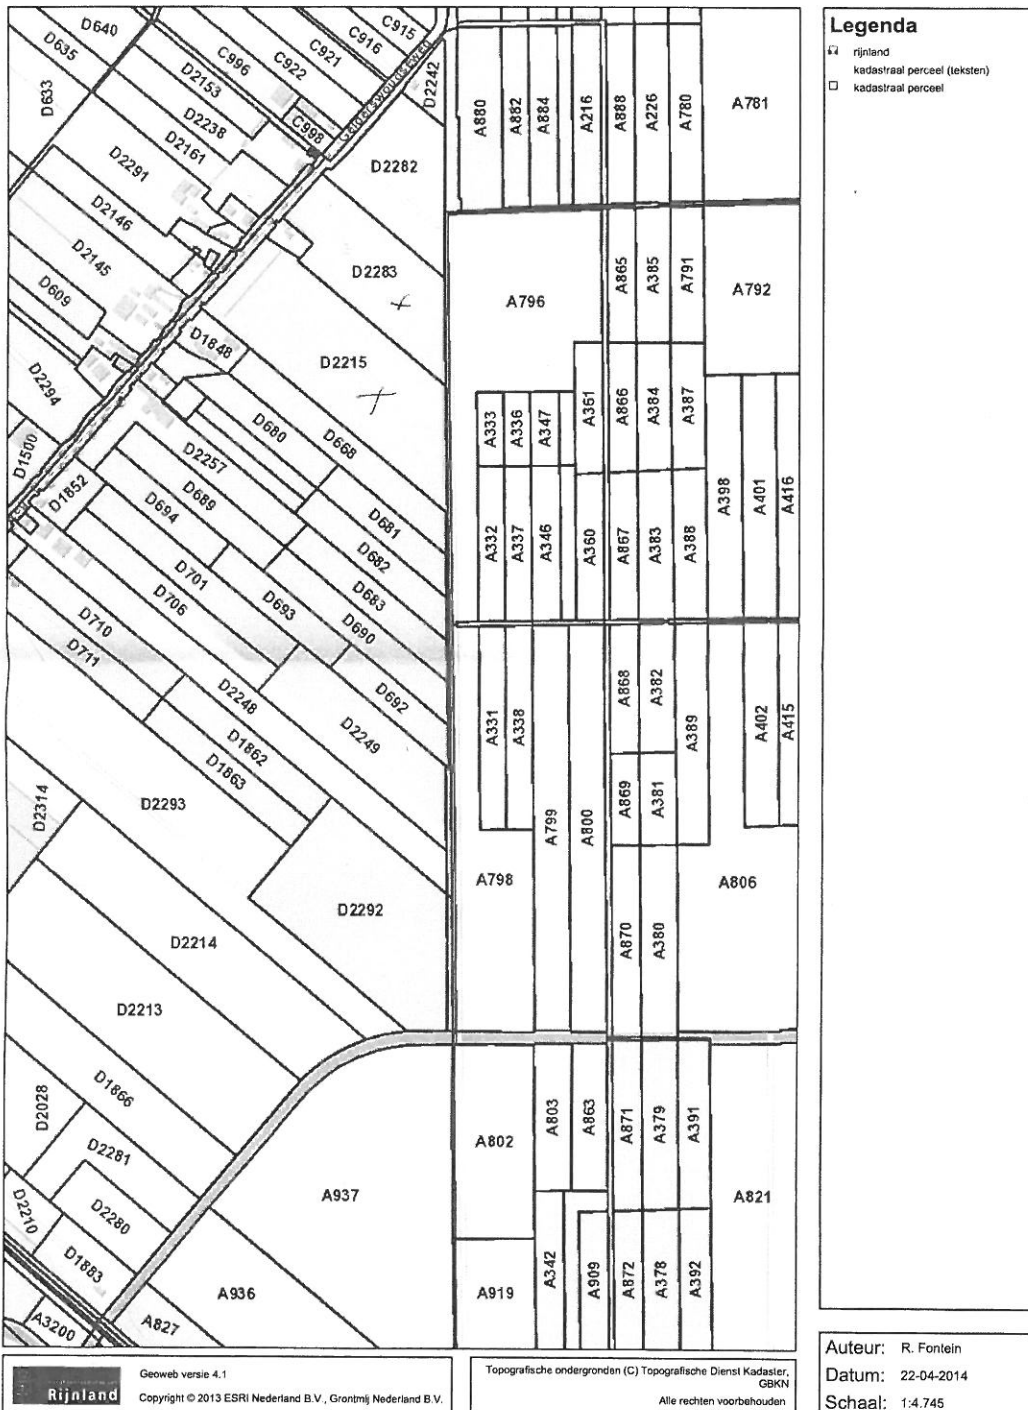

Bijlage 3 Afspraken aanpassingen

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum : 29-7-14		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezigen:	mv straatbaas v Bohemen R. Fortin		
Kopie zenden aan:	Aanwezigen		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☒ talud 1:2 kadastraal perceel nr. 02283, 02215 ☐ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☐ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☒ anders, namelijk... handje liet Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <i>H. J. Straasbaas v Bohemen</i> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum :		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezig:	K. Kesslerová K. Kesslerová		
Kopie zenden aan:	Aanwezig		


VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☐ talud 1:2 kadastraal perceel nr. ☒ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. 0692 0690 0683 Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☒ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☐ anders, namelijk.... Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <u>G. Kesslerová</u> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum : 24-4-14		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezig:	G. Offelaar R. Fontein		
Kopie zenden aan:	Aanwezig		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☒ talud 1:2 kadastraal perceel nr. D668, D681, D682 <i>Assa D2224</i> ☐ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☐ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☒ anders, namelijk <i>zandje riet en drinkplaats op linker strook perceel D668</i> Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <i>[Handwritten signature]</i> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project	

Bijlage 1 Principeprofiel

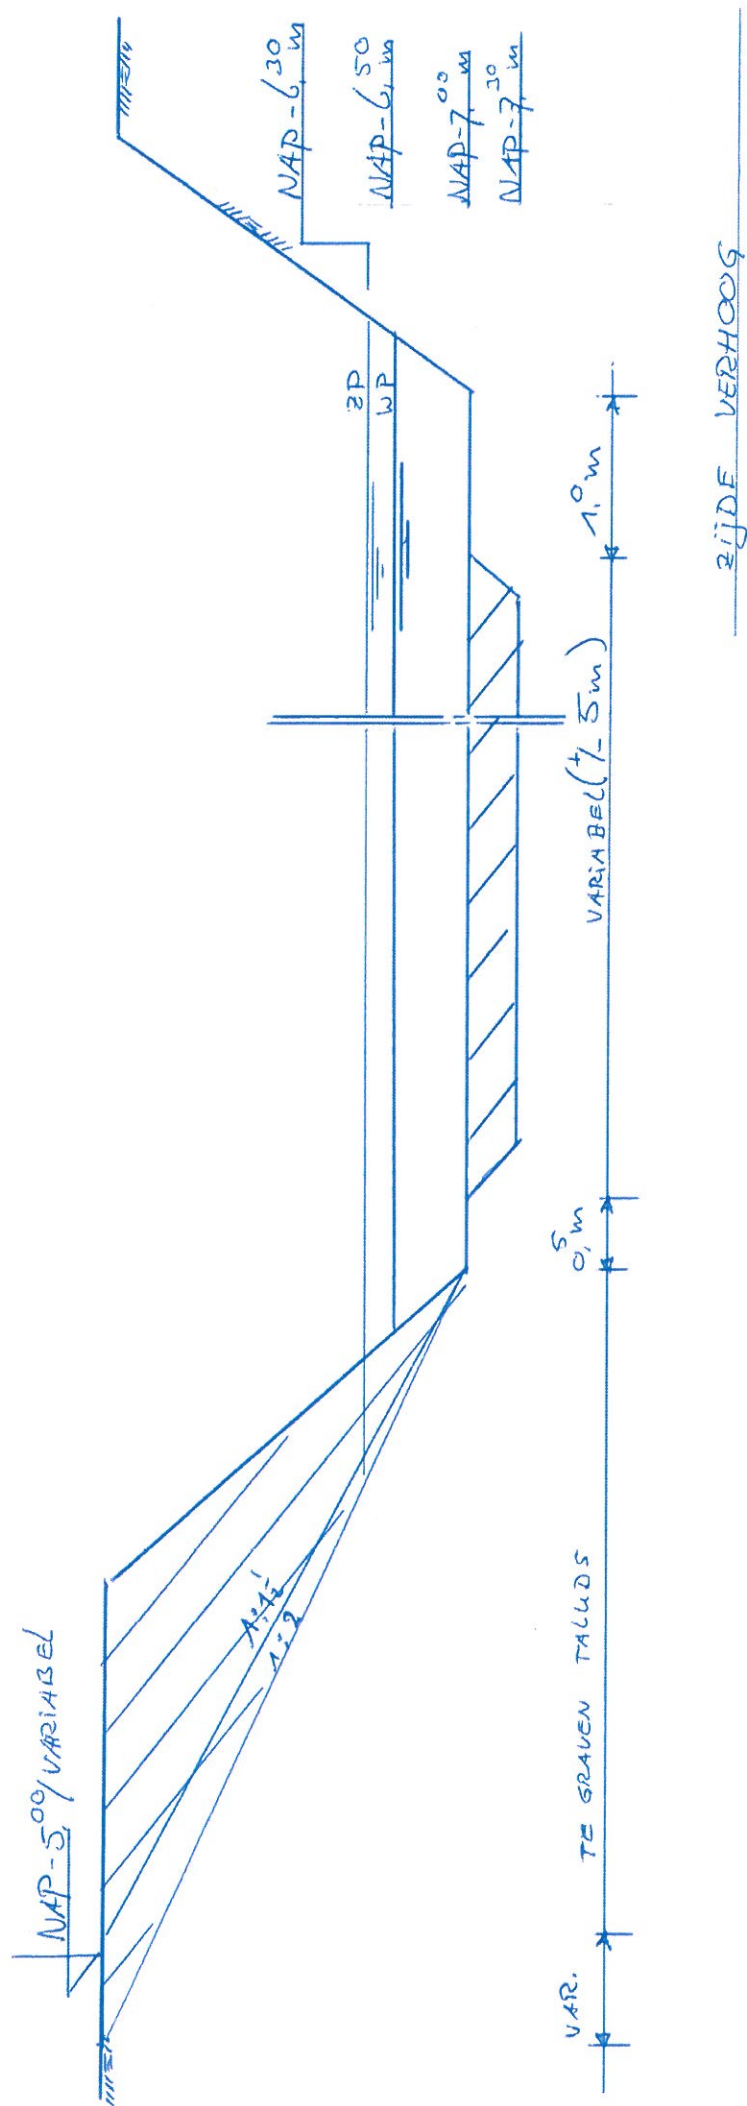

PRINCIPLE PROFILE GROWTH

19.05.2014

Bijlage 2 Percelen aanpassingen

Bijlage taluds Limiettocht *offelaar*



Bijlage taluds Limiettocht Leune



Bijlage taluds Limiettocht

straat hof



Bijlage 3 Afspraken aanpassingen

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum : 29-7-14		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezigen:	mv straatbaas v. Behrens R. Farkas		
Kopie zenden aan:	Aanwezigen		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☒ talud 1:2 kadastraal perceel nr. 02283, 02215 ☐ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☐ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☒ anders, namelijk... handje liet Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <i>M. J. Straatbaas v. Behrens</i> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum :		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezig:	<i>K. Kesslerová</i>		
Kopie zenden aan:	Aanwezig		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☐ talud 1:2 kadastraal perceel nr. ☒ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. <i>0692 0690 0683</i> Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☒ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☐ anders, namelijk.... Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <i>[Handwritten signature]</i> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum :		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezigen:	<i>K. Kesslerová</i>		
Kopie zenden aan:	Aanwezigen		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☐ talud 1:2 kadastraal perceel nr. ☒ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. <i>0692 0690 0683</i> Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☒ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☐ anders, namelijk.... Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: <i>G. L. L. L.</i> Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht

Betreft:	Veld inventarisatie verflauwing taluds Limiettocht		
Datum : 24-4-14		Registratienummer	
Kadastraal nr:		Projectnummer:	91726
Opgesteld door:	K. Kesslerová		
Aanwezigen:	G. Offelaar R. Fantein		
Kopie zenden aan:	Aanwezigen		

VERSLAG	
Met de grondeigenaren van de percelen gelegen aan de Limiettocht is d.d.3 april 2014 afgesproken dat er een veldinventarisatie plaats vindt waarbij vastgesteld wordt welke verflauwing van de oevers wenselijk is. Dit ten behoeve van de aanpassing van de doorstroomprofiel en baggeren van de Limiettocht.	
De grondeigenaren kunnen hun voorkeur aangeven tussen 2 mogelijkheden (de keuze van de grondeigenaar aanvinken): ☒ talud 1:2 kadastraal perceel nr. D.668, D.681, D.682 A.886 D.2224 ☐ talud 1:1,5 kadastraal perceel nr. Uitgangspunt; 1:1,5 bij akkerbouw, of een flauwer talud. 1: 2 bij veeteelt, of een flauwer talud. Op de bijgevoegde kaart is het tracé van de verflauwing van de bovenwater talud alsnog weergegeven. De kaart maakt een onderdeel van de gemaakte afspraken/keuzes. Naast de verflauwing van de bovenwatertalud is tijdens de veldinventarisatie door de medewerker van HHvR bepaald in hoeverre de aanpassing van het onderwatertalud noodzakelijk is. Dit ten behoeve van het baggeren. Indien aanpassing noodzakelijk is, wordt de voorkeursoplossing eveneens aangegeven (de keuze van HHvR aanvinken): ☐ onderwater beschoeiing ☐ plasberm ☒ anders, namelijk: randje riet en drinkplaats op linker strook perceel D.668 Akkoord grondeigenaar met inventarisatie: Dit document is ter inventarisatie ten behoeve van verdere uitwerking van het project.	

PROJECT vergraven watergang Limiettocht
