

Dhr. R. Wiltink
Fresiaweg 2
7021 WT Zelhem

Doetinchem, 28 oktober 2016

Kenmerk : **47 2810**
Behandeld door : Gijs Fronen

Betreft : **offerte Combi Dakkapel**

Geachte mijnheer Wiltink,

Refererend aan mijn bezoek, ontvangt u hiermede, geheel vrijblijvend, ons voorstel inzake de levering en montage van :

- **1 stuks Combi Dakkapel met de volgende specificaties :**

Type E :

-	uitwendige breedte	=	3200mm
-	inwendige breedte	=	2850mm
-	plafondhoogte	=	2000mm
-	vensterbankhoogte	=	850mm
-	dakhelling	=	30°
-	overstek	=	150mm rondom.
-	plaats	=	achterdak

Combi Dakkapel bv

Houtmolenstraat 10
7008 AR Doetinchem

T 0314 39 09 72
F 0314 39 02 83
www.combidakkapel.nl
info@combidakkapel.nl

Handelsonderneming COdak
IBAN NL44 INGB 0656 0347 69
KvK 09099002
BTW 806860601B01

De prefab Combi Dakkapel is als volgt samengesteld :**Dakopbouw :**

- binnenzijde wordt geheel afgewerkt met melamine verlijmde spaanplaat
- dampremmende folie.
- de isolatie bestaat uit 120mm steenwol. Isolatie & brandwerendheid
- conform huidige bouw eisen (Rc totaal = 3.5).
- draagconstructie van gordingen.
- dakplaat van 18mm melamine plaat
- **dakbedekking van EPDM, dit is een rubber bedekking met een verwachte levensduur van 50 jaar. Resitrix type SK van Phoenix.**
- zinken kraal met afdeklijst.
- afwatering d.m.v. onder uitloop, links buiten
(afwatering tot op de dakpannen)

Zij – wangen :

- binnenzijde wordt geheel afgewerkt met melamine verlijmde spaanplaat
- dampremmende folie
- buitenzijde wordt afgewerkt met Keralit rabatdelen, kleur antraciet, horizontaal monteren.
- De isolatie bestaat uit 120mm steenwol.
- Isolatie & brandwerendheid conform bouw eisen (Rc steenwol = 3.5).
- aansluiting op de dakpannen met bladlood, 15 ponds

Boeiboord :

- buitenzijde wordt afgewerkt met 6mm Trespa, kleur gebr. wit, verlijmen.

Plafondje overstek :

- buitenzijde wordt afgewerkt met 6mm Trespa, kleur gebr. wit, verlijmen.

Frontjes :

- buitenzijde wordt afgewerkt met Keralit rabatdelen, kleur antraciet, horizontaal monteren.

Kozijn :

- kunststof kozijn fabr. VEKA blok kozijnprofiel / NL 104.
- incl. HR++ beglazing / U waarde = 1.1.

- 1x draai – kiepraam incl. meerstanden kiep.
- 2x vast glasdeel.

- Kleur kozijn : glad gebr. wit.
- Kleur ramen : glad gebr. wit.
- Kleur binnenzijde : glad gebr. wit.

Montage :

- transport van de dakkapel naar de woning.
- het verwijderen van de dakpannen t.p.v. de dakkapel
- het verwijderen van het dakbeschot (excl. asbest)
- gordingen en slapers monteren t.b.v. de dakkapel en het overig dakvlak
 - op basis van een gordingkap.
 - ravelingen monteren, afm 170 x 70mm.
- het monteren van de Combi Dakkapel m.b.v. 'n telescoopkraan.
- rechter binnenzijde plaatsen op het spantbeen.
- aansluitingen afschuimen, dakpannen aanleggen –en loodslabbe aankloppen.
- nokvorst detail herstellen
- binnenzijde dakkapel vanaf de aansluitnaden werkt u verder af.
- afval voert u af.

Een Combi Dakkapel is altijd aan de binnenzijde volledig geïsoleerd en beplaat.

Een Combi Dakkapel is dus geen "casco" dakkapel.

Combi Dakkapel bv

Houtmolenstraat 10
7008 AR Doetinchem

T 0314 39 09 72
F 0314 39 02 83
www.combidakkapel.nl
info@combidakkapel.nl

Handelsonderneming COdak
IBAN NL44 INGB 0656 0347 69
KvK 09099002
BTW 806860601B01

-4-

Prijs leveren en monteren : € 4.300,--

Meerwerk optie :

koof incl. loze leiding : € 70,--

De reeds opgenomen opties :

blok profiel kozijn	: incl.
groter dakoverstek incl. zinken onder uitlopen	: incl.
ravelingen monteren	: incl.
trespa delen verlijmen	: incl.
Keralit rabatdelen fronten / zij wangen	: incl.
binnenzijde incl. volledige beplating	: incl.
volledig brandveilig geïsoleerd	: incl.
hoogwaardige EPDM dakbedekking	: incl.
HR++ beglazing	: incl.
meerstanden kiep op alle ramen	: incl.
bouwaanvraag uitwerken, excl. leges en statica	: incl.
(indien nodig c.q. gevraagd)	

Alle prijzen zijn incl. BTW en geldig tot 1 maand na offerte – datum. Wijzigingen door u aangebracht zullen worden verrekend.

Maatvoering :

Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om, in overleg met U, kleine maattoleranties toe te passen.

Combi Dakkapel bv

Houtmolenstraat 10
7008 AR Doetinchem

T 0314 39 09 72
F 0314 39 02 83
www.combidakkapel.nl
info@combidakkapel.nl

Handelsonderneming CODAK
IBAN NL44 INGB 0656 0347 69
KvK 09099002
BTW 806860601B01

-5-

Onvoorziene werkzaamheden :

Alle werkzaamheden welke niet in deze offerte zijn omschreven , en / of verborgen gebreken, zullen separaat worden verrekend.
(bijv. slechte dakpannen, leidingwerk). Kit, plamuur, stuc –en schilderwerk valt buiten dit voorstel.

Afvalstoffen :

Uitkomende chemische en/of schadelijke bestanddelen worden niet door ons afgevoerd, waarbij asbest tevens niet door ons mag worden verwijderd.

Levertijd :

Vrij op te nemen uren, e/o extra uren bij uitloop
v/d werkzaamheden, kunnen niet worden verhaald.

Betaling :

Bij aanvang montage/plaatsing 1^e termijn, bij oplevering 2^e termijn.

Garantie :

15 jaar : casco / constructie.
10 jaar : epdm / beglazing / gevelbekleding / kunststof kozijn.
2 jaar : hang –en sluitwerk


Leveringsvoorwaarden :

Zie achterzijde voorblad.

Wij vertrouwen erop U hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan, en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Combi Dakkapel B.V.



Gijs Fronen

Combi Dakkapel bv


Houtmolenstraat 10
7008 AR Doetinchem

T 0314 39 09 72
F 0314 39 02 83
www.combidakkapel.nl
info@combidakkapel.nl

Bijlage : vooraanzicht / doorsnede

Handelsonderneming CODAK
IBAN NL44 INGB 0656 0347 69
KvK 09099002
BTW 806860601B01

Vooraanzicht type E

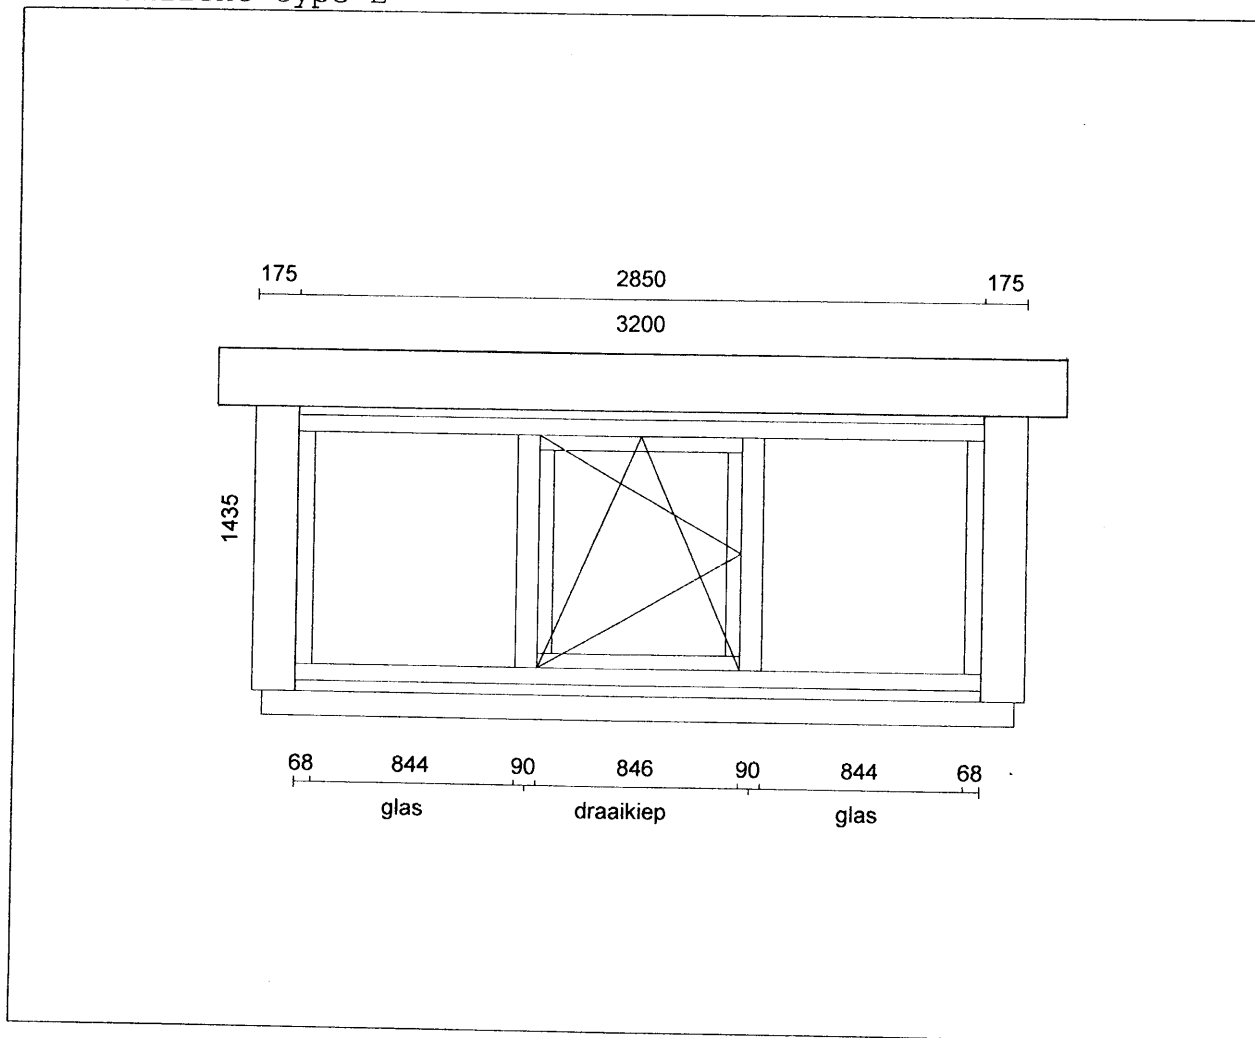

Totaal: 1 stuks

opbouw dakplaat:

- melamine verlijmde spaanplaat 10mm
- dampremmende laag
- gordingen 34 x 145, hoh 400 mm
- minerale wol 120 mm
- dakbeschot triplex 15 mm (ext. 1 verlijmd)
- EPDM dakbedekking

opbouw zijwang:

- Binnenbeplating van spaanplaat 10mm
- dampremmende laag
- stijl- en regelwerk van vurehout 30 x 120 mm
- minerale wol 120 mm
- halfhardboard 9 mm
- regelwerk op stijlen

Kunststof kozijn, montage met rubber profiel en ankerstrippen (glas 4-12-5 mm)

Dwarsdoorsnede type E

