


- PEIL -0,60 NAP
PEIL -0,70 NAP
PEIL -0,47 NAP

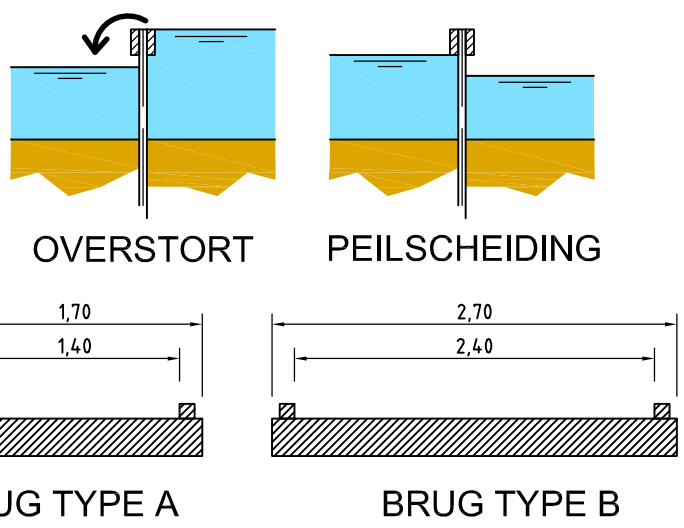

BRUG	AFM. BEST. L x B	AFM. NIEUW L x B	ACTIE	MAATREGELEN
03-003	2,6 x 3,2	-	GEEN	
03-006	5,0 x 3,2	-	GEEN	
03-007	5,0 x 3,2	-	Opknappen	Nieuwe damwanden onder en naast dek aanbrengen Proef met slijllaag op KLP dekdelen. Optie: nieuwe dekdelen toepassen
03-008	5,0 x 2,6	-	Opknappen	Reinigen Ophalen straatwerk
03-010	5,0 x 3,2	-	Opknappen	Damwand onder dek vernieuwen
03-011	4,2 x 3,5	-	Opknappen	Radkoeders aanbrengen
03-012	4,0 x 2,8	TYPE A 4,0 x 1,7	Vernieuwen	Brug ca 3m noordelijk verleggen. Houten brug Opleg 3,9 x 1,7gen op doorgaande damwandschermen.
03-014	4,0 x 2,6	-	Opknappen	Kleine reparaties
03-015	4,0 x 2,6	-	VERVALT	Bestaande constructie slopen en dam met dukker 300mm aanbrengen
03-016	4,9 x 2,6	TYPE B 4,9 x 2,7	Opknappen	Nieuw dek Nieuwe langsliggers verhoogd Verder opknappen met vrijkomend materiaal Vleugels vernieuwen
03-017	5,0 x 2,5	TYPE A 5,0 x 1,7	Opknappen	Nieuw dek Verder opknappen met vrijkomend materiaal Vleugels vernieuwen
03-018	3,9 x 2,8	TYPE B 3,9 x 2,7	Opknappen	Nieuw dek Verder opknappen met vrijkomend materiaal Vleugels vernieuwen
03-019	3,9 x 2,8	TYPE B 3,9 x 2,7	Opknappen	Brug 03-026 hergebruiken en verstevigen Nieuwe grondkeringen / vleugels.
03-020	6,0 x 2,2	CONFORM BESTAAND	Opknappen	Kunststof dekdelen voorzien van nieuwe slijllaag (proef) Onderdelen vernieuwen. In het werk te bepalen
03-021	-	-	VERVALT	Volledig slopen. Materiaal deels geschikt voor hergebruik Natuurvriendelijke oevers aanbrengen Aansluitend pad verwijderen
03-022	4,0 x 2,8	-	Geen actie	Zeer goede staat. Niets aan doen.
03-023	4,2 x 2,6	-	VERVALT	Bestaande brug slopen. Betonnen landhoofden laten zitten.
03-024	6,0 x 3,3	CONFORM BESTAAND	Opknappen	Onderdelen vernieuwen. In het werk te bepalen.
03-026	3,9 x 2,8	-	VERVALT	Volledig verwijderen inclusief betonnen landhoofden. Natuurvriendelijke oevers aanbrengen Aansluitend pad verwijderen

DUIKER STUW KERING	DOOR WIE	MAATREGELEN
1	HDSR	Nieuwe overstort
2	-	In orde. Geen actie
3	v. Leeuwen	Dukker aanbrengen rond 200 met 5cm lucht
4	v. Leeuwen	Dukker aanbrengen rond 300 met 5cm lucht
5	v. Leeuwen	Overstort aanbrengen
6	v. Leeuwen	Peilscheiding aanbrengen
7	v. Leeuwen	Overstort aanbrengen
8	-	Vervallen
9	-	Vervallen
10	v. Leeuwen	Dukker verwijderen en nieuwe dukker rond 300 aanbrengen ten westen van bestaande dukker. Aenvullen met bims
11	-	Vervallen
12	v. Leeuwen	Sloot dempen
13	v. Leeuwen	Sloot graven. Dukker rond 300 aanbrengen

- SCOOP BREDIUSBOERDERIJ
ONDERHOUDSROUTES
BESTAANDE DUIKERS 26 ST

VERSIE 15-05-2018
