
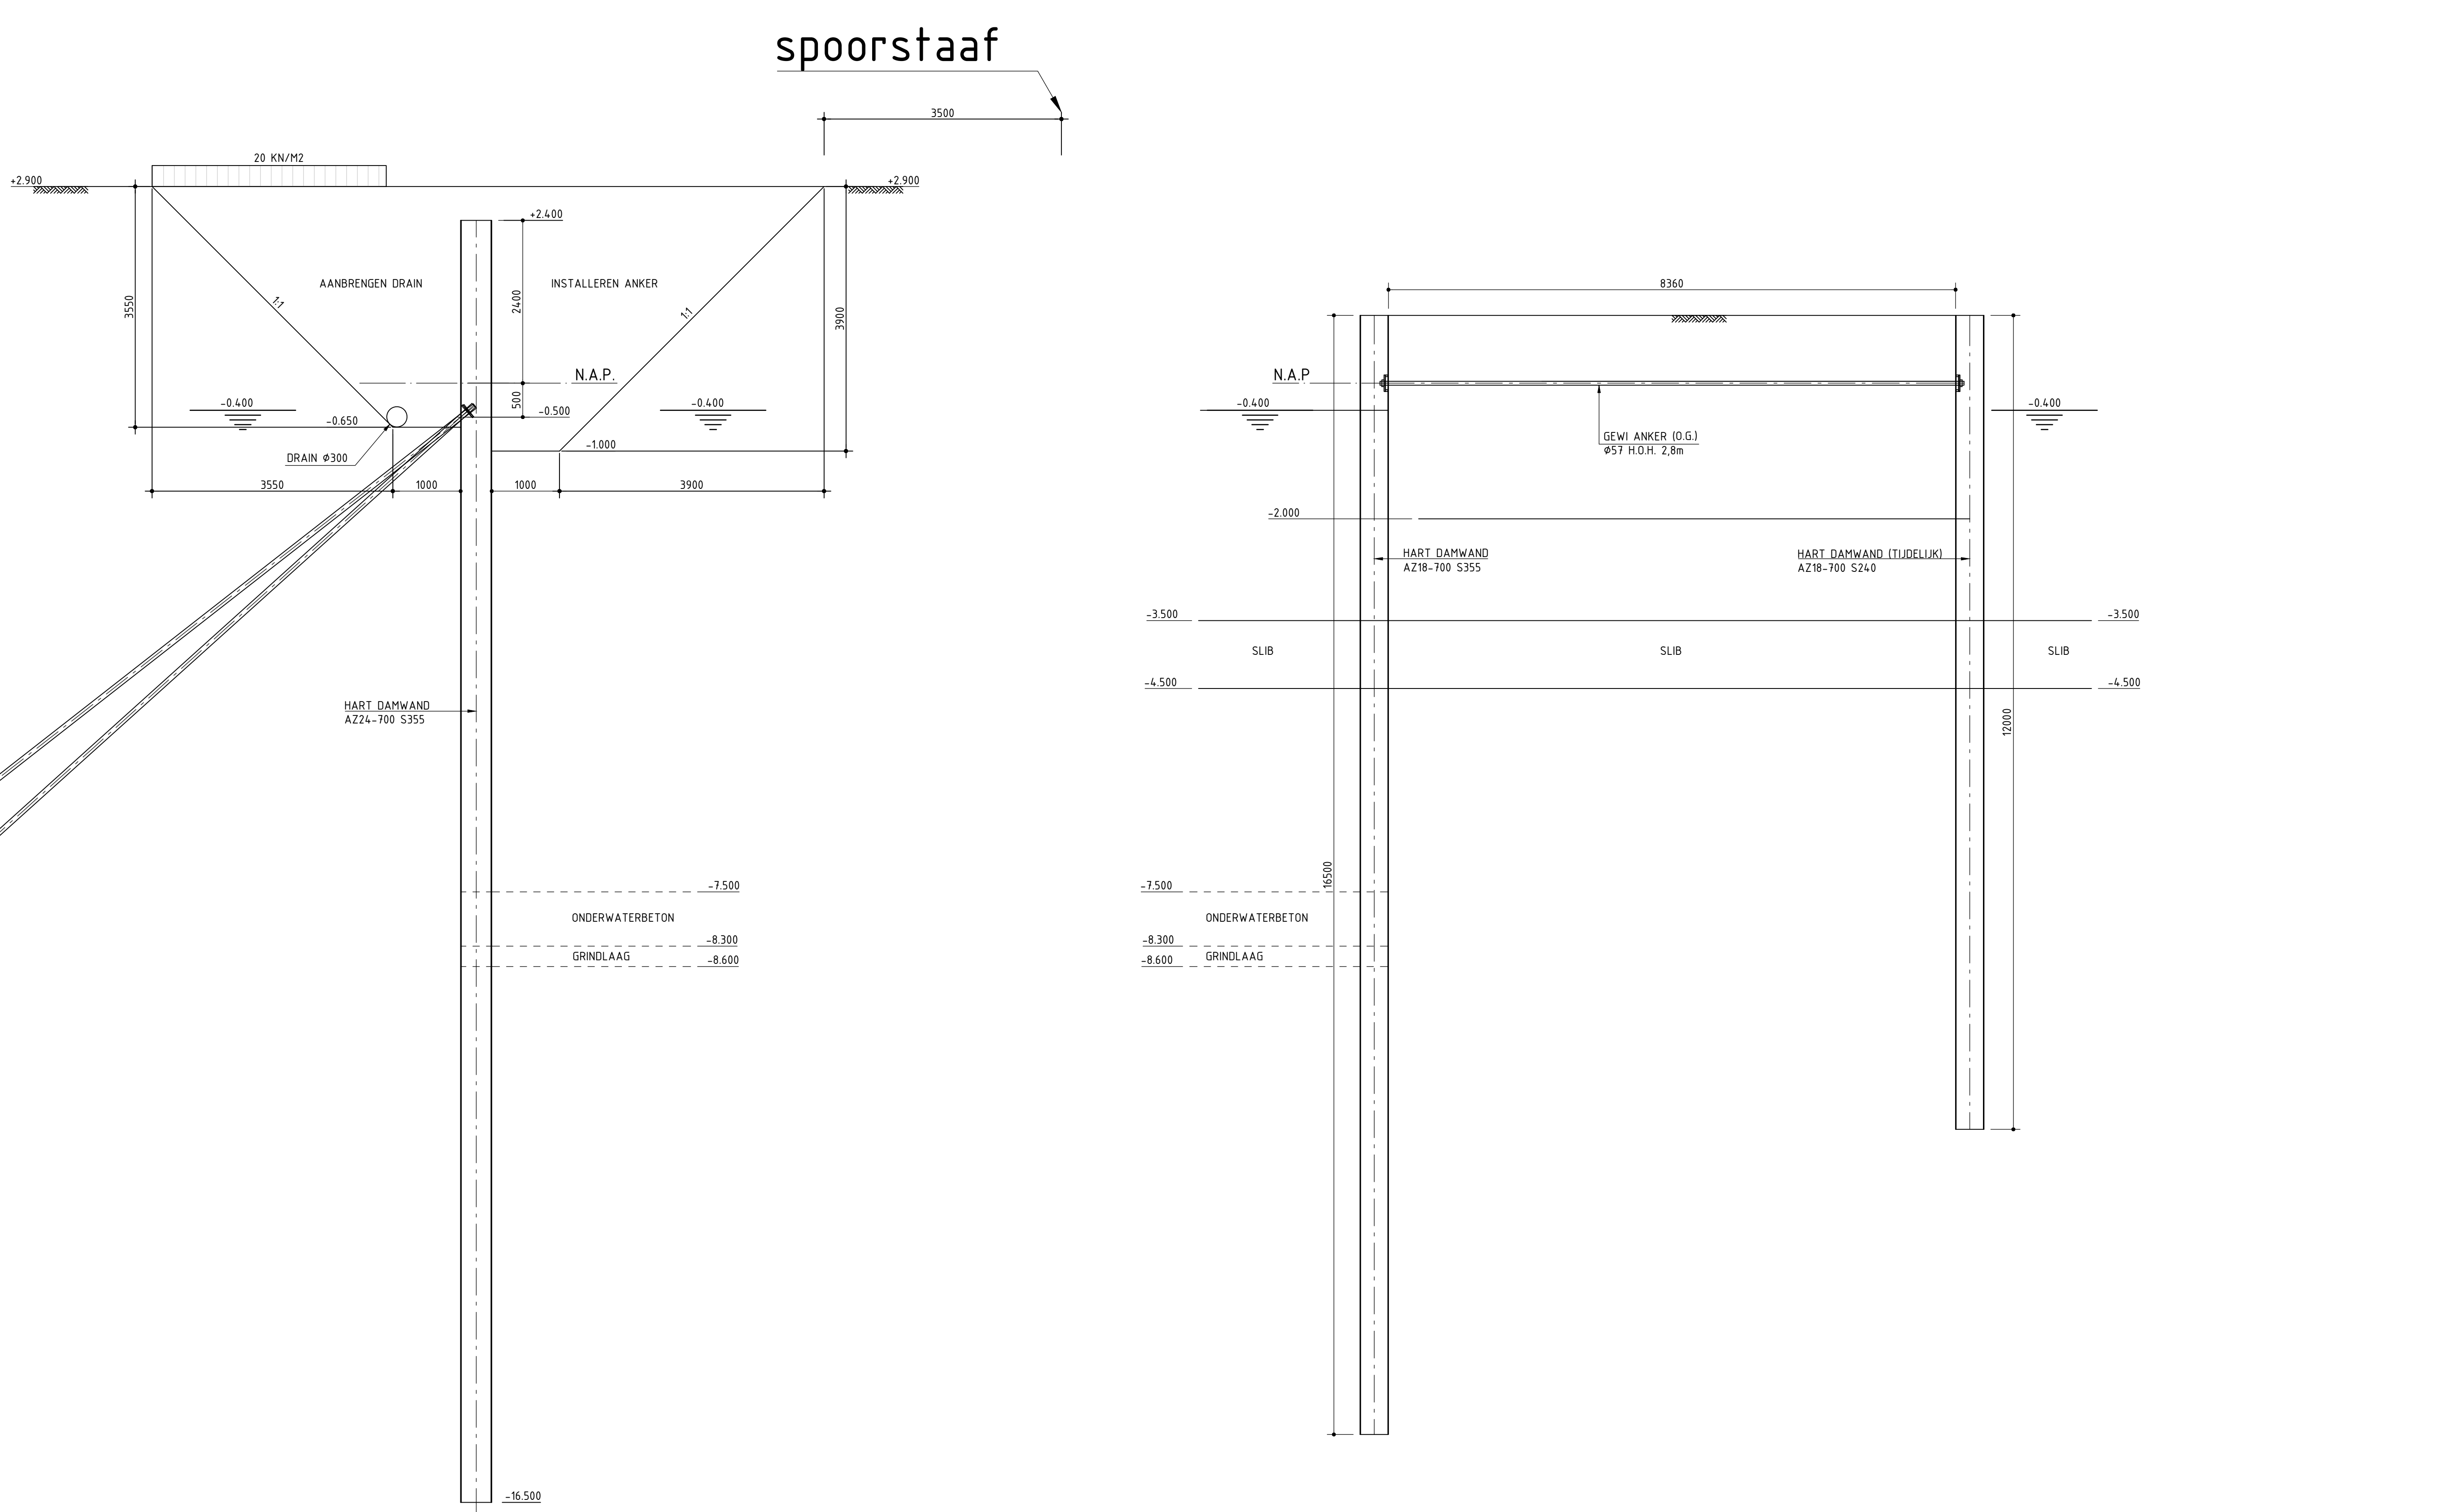


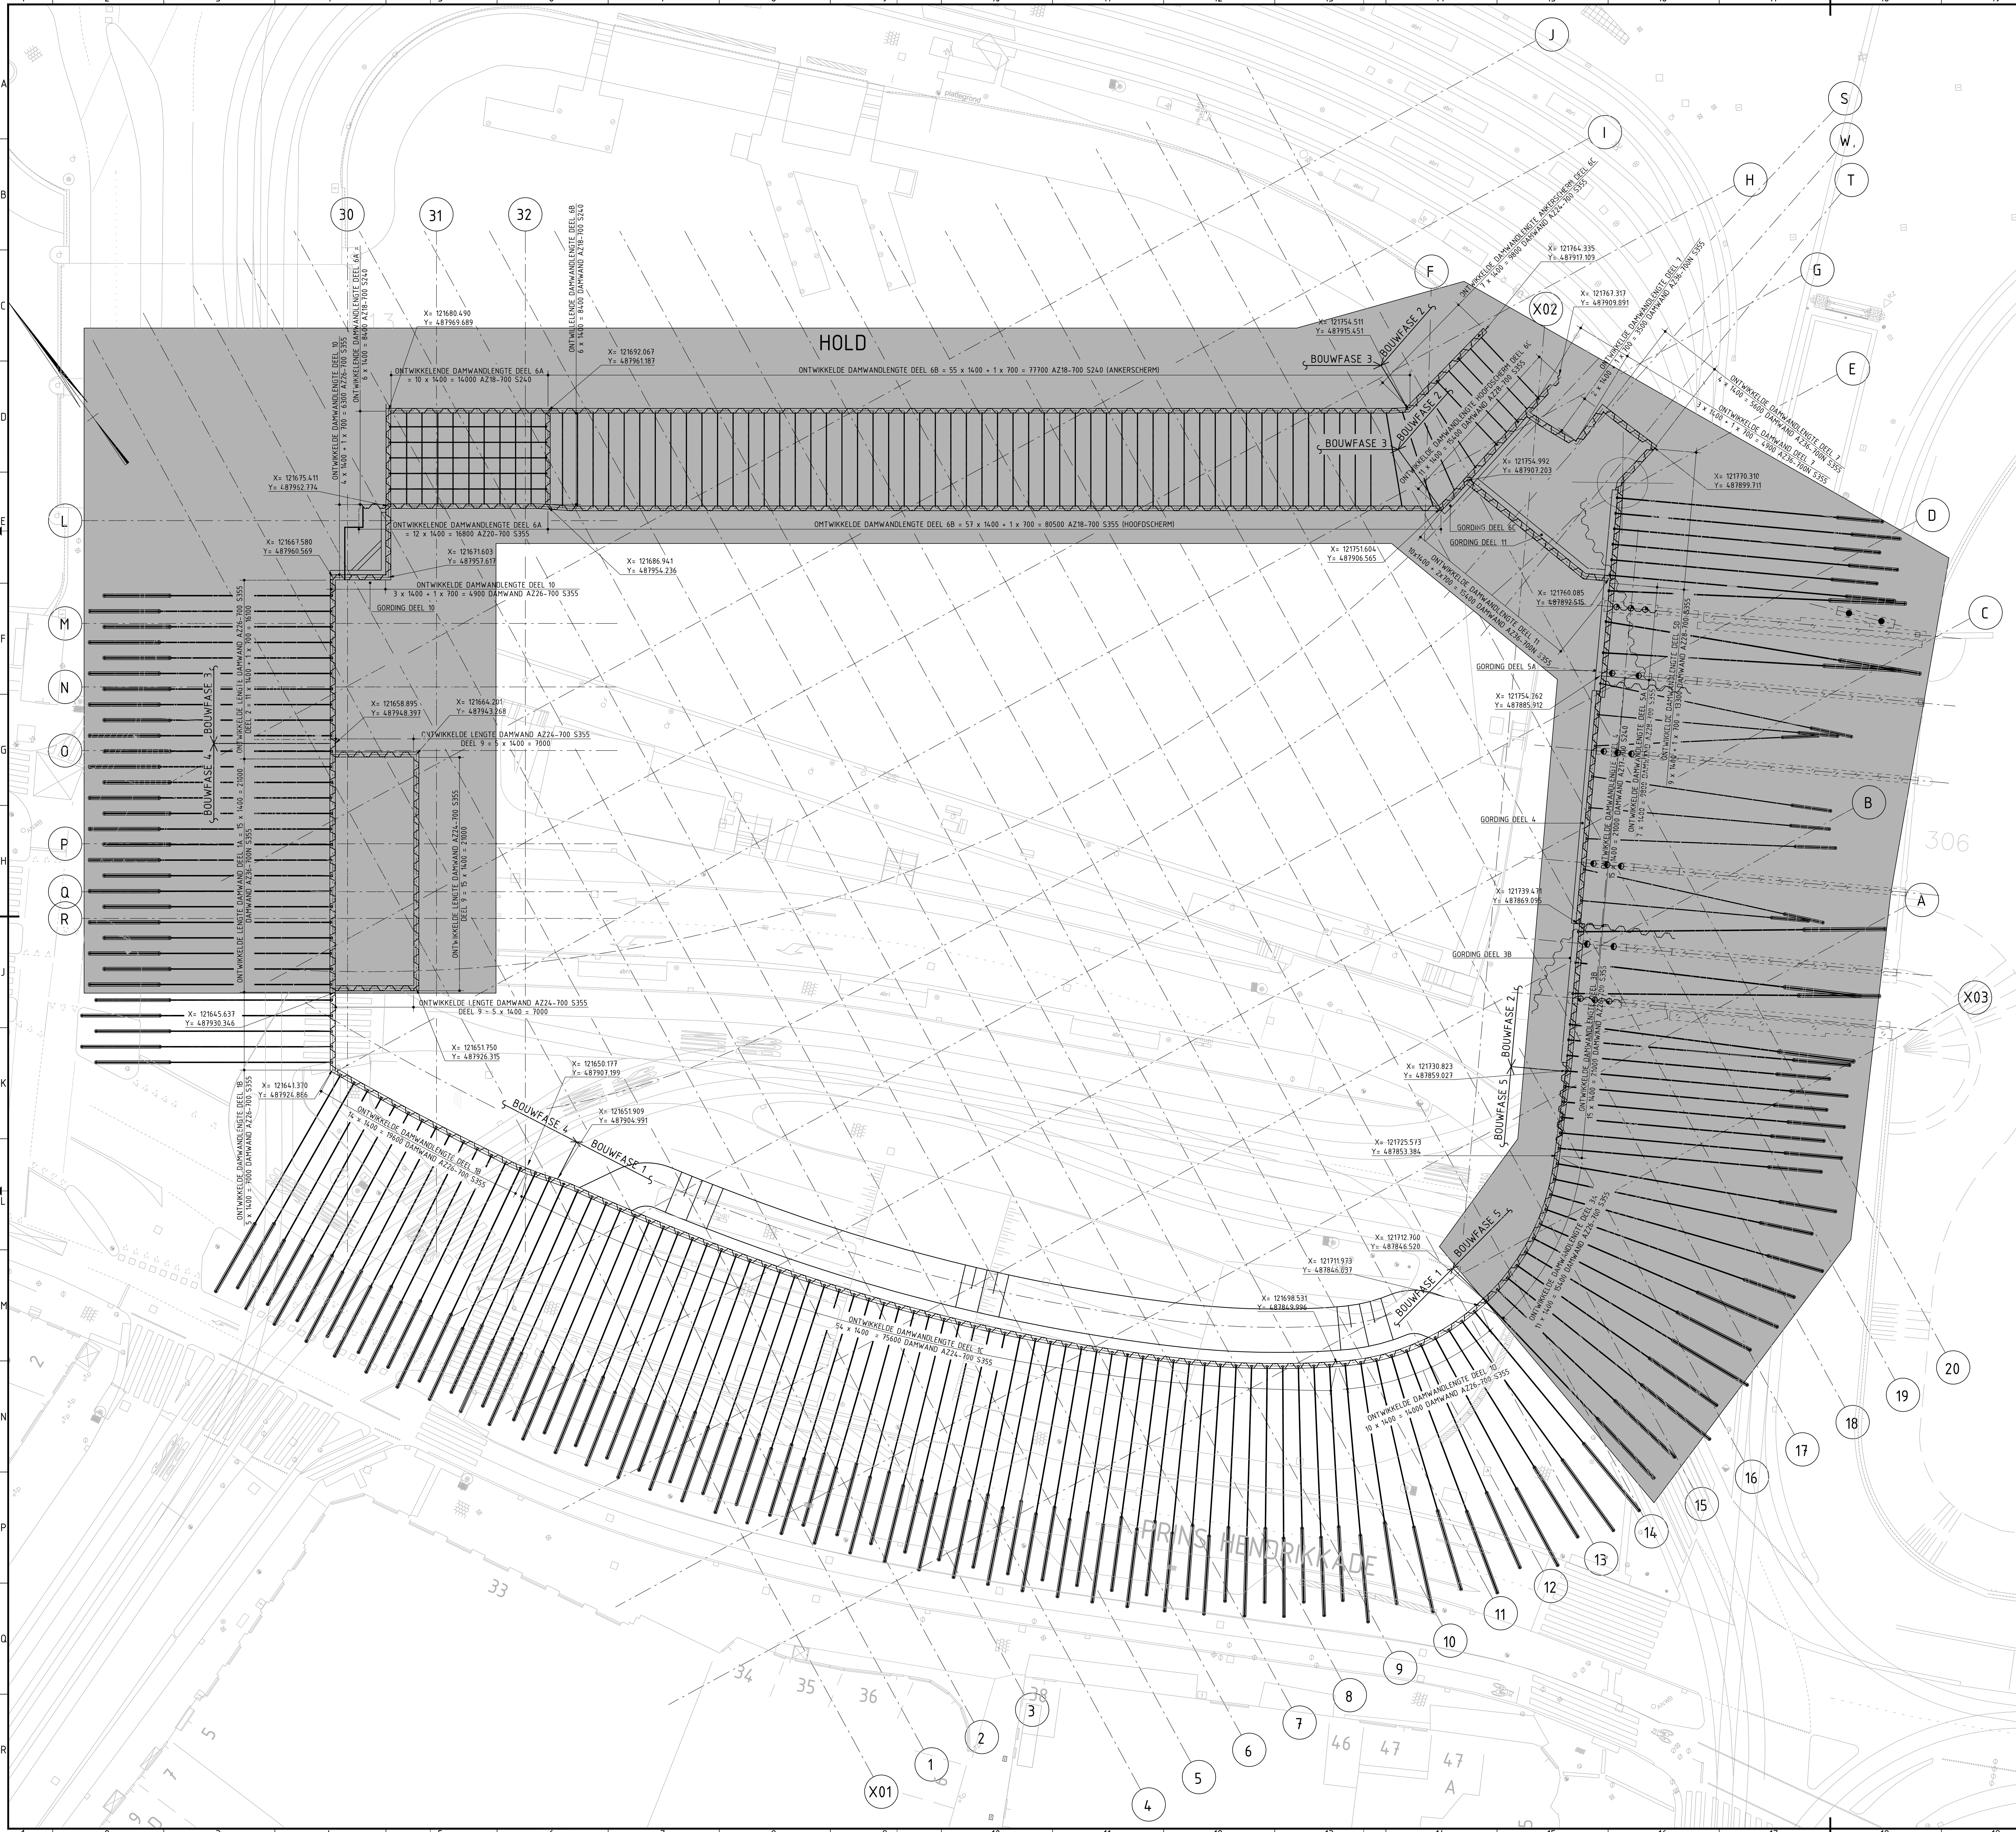

DOORSNEDE T.P.V. BOUWKUIP 1C
SCHAAL 1:50

DOORSNEDE T.P.V. BOUWKUIP 6B
SCHAAL 1:50

ALGEMENE FASERING:

1. INSTALLEREN DAMWANDEN
2. ONTGRAVEN T.B.V. DAMWANDVERANKERING
3. DAMWANDVERANKERING INSTALLEREN EN VOORSpannen
4. BOUWKUIP ONTGRAVEN IN DEN NATTE
5. INSTALLEREN ANKERPALEN (VANAF HET WATER)
6. AANBRENGEN DRAINAGESYSTEEM
7. AANBRENGEN GRINDLAAG
8. STORTEN ONDERWATERBETON
9. DROOGZETTEN BOUWKUIP
10. BOUWEN PHP GEBOUW

ALGEMENE RANDVOORWAARDEN:

A. BOVENBELASTING DAMWAND: 20 KPA VANAF 0 M UIT ZIKANT DAMWAND (NIET OP DAMWAND)

B. BOVENBELASTING KISTDAM DOORSNEDEN 6A EN 6B IN DE FASEN ZONDER ONDERWATERBETON: 20 KPA

C. BOVENBELASTING KISTDAM DOORSNEDEN 6A EN 6B IN DE FASEN MET ONDERWATERBETON: 50 KPA

D. BOVENBELASTING KISTDAM DOORSNEDE 6C IN ALLE FASEN: 20 KPA

E. OP ALLE DAMWANDANKERS DIEN EEN CONTROLEPROEF TE WORDEN UITGEVOERD

F. I.V.M. ZWEL BOUWKUIPBODEM DIEN EEN WACHTTIJD VAN MINIMAAL 15 Å 20 DAGEN AANGEHOUDEN TE WORDEN

G. VOOR INSTALLEREN VAN DE ANKERPALEN DIEN DE BOUWKUIP VOLLEDIG ONTGRAVEN TE ZIJN

DAMWANDENSTAAT					
DEEL TYPE	DAMWANDTYPE	AANTAL (babbie dampl.)	AANTAL (onele dampl.)	LENGTE (m)	INWEEDEPTE (m)
DEEL 1A	A236-700, S355	15		20,4	-18,000
DEEL 1B	A236-700, S355	19		20,9	-18,500
DEEL 1C	A236-700, S355	54		18,9	-16,500
DEEL 1D	A236-700, S355	10		19,9	-17,000
DEEL 2	A236-700, S355	11	1	19,9	-17,500
DEEL 3A	A236-700, S355	11		21,4	-18,500
DEEL 3B	A236-700, S355	15		21,4	-18,500
DEEL 4	A236-700, S355	15		14,0	-14,000
DEEL 5A	A236-700, S355	7		24,4	-21,500
DEEL 5B	A236-700, S355	9	1	24,4	-21,500
DEEL 6A HOOFD	A236-700, S355	12		17,5	-16,500
DEEL 6A ANKER	A236-700, S355	10		13,0	-12,000
DEEL 6B HOOFD	A236-700, S355	57	1	16,5	-15,500
DEEL 6B ANKER	A236-700, S355	55	1	12,8	-11,000
DEEL 6C KOP	A236-700, S355	6		16,5	-15,500
DEEL 6C HOOFD	A236-700, S355	12		22,8	-21,000
DEEL 6C ANKER	A236-700, S355	7		15,5	-14,500
DEEL 6E KOP	A236-700, S355	6		15,5	-14,500
DEEL 7	A236-700, S355	9	2	24,0	-23,000
DEEL 9	A236-700, S355	25		14,0	-15,500
DEEL 10	A236-700, S355	7	2	16,0	-15,000
DEEL 11	A236-700, S355	11		25,85	-23,000

OPMERKINGEN:

- maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- hoogten in meters f.t.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- hoeken in het 300-gradenstelsel
- coördinaten in meters f.t.v. Rijksdriehoekstelsel

BIJHORENDE TEKENINGEN:

DEA-00235/00254	DEA-PHP-CON-TEK-00-3010/2025	FUNDERINGSPLAN PHP-GEBOUW BLAD 1/20
DEA-00255	DEA-PHP-CON-TEK-00-3030	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 1A-2-9
DEA-00256	DEA-PHP-CON-TEK-00-3031	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 1B
DEA-00257	DEA-PHP-CON-TEK-00-3032	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 1C
DEA-00258	DEA-PHP-CON-TEK-00-3033	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 1D
DEA-00259	DEA-PHP-CON-TEK-00-3034	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 3A
DEA-00260	DEA-PHP-CON-TEK-00-3035	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 3B
DEA-00261	DEA-PHP-CON-TEK-00-3036	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 4
DEA-00262	DEA-PHP-CON-TEK-00-3037	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 5
DEA-00263	DEA-PHP-CON-TEK-00-3040	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 6A
DEA-00265	DEA-PHP-CON-TEK-00-3041	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 6B
DEA-00267	DEA-PHP-CON-TEK-00-3042	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 6C
DEA-00269	DEA-PHP-CON-TEK-00-3043	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 7
DEA-00270	DEA-PHP-CON-TEK-00-3044	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 8
DEA-00271	DEA-PHP-CON-TEK-00-3045	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 9
DEA-00272	DEA-PHP-CON-TEK-00-3046	DAMWAND BOUWKUIP PHP-GEBOUW DEEL 11

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam	Opdrachtnemer MAX BÖGL Project & Real Estate	Opsteller IV-Infra
Project DE ENTREE AMSTERDAM		
Doc-naam: Overzicht bouwkuip PHP-gebouw		
Tekeningnr.: DEA-PHP-CON-TEK-00-3049		Revisie: A
Documentnummer: DEA-002173	Doc-status: SG-PP-06-05-03	Issue: Ontwerpen UD
Opgesteld: 01/01/2025	Definitief: 01/01/2025	Werkvoortgang: 1 / 1
Gecontroleerd: 01/01/2025	Definitief: 01/01/2025	Formaat: A3 (1000 x 1485)
Vrijgegeven: 01/01/2025	Definitief: 01/01/2025	Schaal: 1:250
