

ONTWERP-PROJECTPLAN WEGRECONSTRUCTIE KOENDERSEWEG EN TE REALISEREN WATERCOMPENSATIE BRUININXDEELSEKADE LEERDAM ex art. 5.4 Waterwet

Datum: Januari 2019
Kenmerk: 2019011255
Onderwerp: Ontwerp-projectplan wegreconstructie en watercompensatie Koenderseweg

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland besluit, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet, het onderhavige ontwerp-projectplan tot de wegreconstructie & watercompensatie Koenderseweg te Leerdam vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit ontwerp-projectplan.

1. Projectbeschrijving

Op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. Het plan dient tenminste een beschrijving te bevatten van het betrokken werk en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, alsmede een beschrijving van de te treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk, aldus artikel 5.4, lid 2, Waterwet.

1.1 Algemeen

In het wegdek van de Koenderseweg Leerdam is tussen huisnummer 20 en de Achterdijk aan de oostkant ernstige dwarsonvlakheid te zien. Deze schade wordt veroorzaakt door het afschuiven van de berm. We willen daarom maatregelen treffen om het wegdek adequaat te herstellen en de afschuiving in het vervolg te voorkomen.


1.2 Maatregelen

De maatregelen bestaan uit het aanbrengen van 735 m³ houten beschoeiing in de A-watgang en het graven van ongeveer 40m³ watercompensatie binnen peilgebied VHL007-P. Een en ander conform tekening 1910-001.

De watercompensatie wordt aangebracht in perceel LMD00H353, dat eigendom is van het waterschap.

Vervolgens wordt over een breedte van 2m de bestaande wegfundering verwijderd en opnieuw aangebracht. Vervolgens worden de asfaltlagen tussen de Achterdijk en de Nieuwe Geer over de hele breedte vervangen.

De beschoeiing wordt geplaatst binnen respectievelijk perceel ZDR00E32 en LMD00H158 die beiden eigendom zijn van het Waterschap. Er hoeft dus voor de beschoeiing geen grond aangekocht te worden. Zie hiervoor ook onderstaand kaartje van het projectgebied.

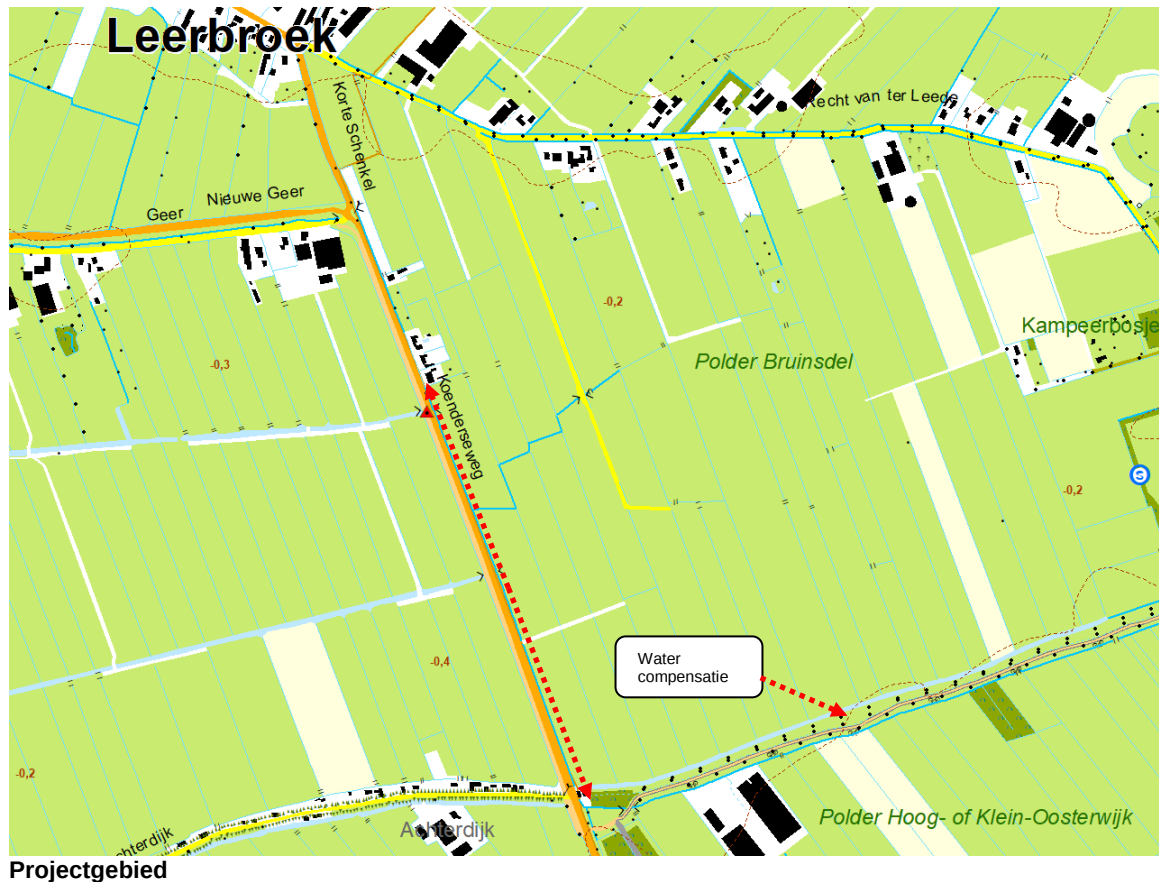

1.3 Te treffen voorzieningen

Ter plaatse van kunstwerk nr. 354 ligt een betonnen duiker in de watergang. De beschoeiing daar zal zodanig worden geplaatst, dat hierop aangesloten wordt.

Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Dit verzoek moet worden ingediend bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel

1.4. Werkwijze

De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. Fase 1 bestaat uit het aanbrengen van de beschoeiing en het graven van de watercompensatie. Fase 2 bestaat uit de reconstructie van het wegdek.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

- a) Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden, zoals een flora-en fauna-scan en landmeetkundige werkzaamheden.
- b) Het maaien van de bermen
- c) Het toepassen van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes.
- d) Het leveren en realiseren van ongeveer 735 m¹ houten beschoeiing.
- e) Het uitzetten en aanbrengen van ongeveer 40 m² watercompensatie.
- f) Het mechanisch verwijderen van de wegconstructie
- g) Het verwijderen en aanbrengen van fundering, bestaande uit menggranulaat, asfaltcementstabilisatie (agrac) en licht ophoogmateriaal. (argex, yali-bims of gelijkwaardig)
- h) Het aanbrengen van kunststof wapening en wegendoek ten behoeve van de fundering.
- i) Het gefaseerd mechanisch aanbrengen van asfaltlagen.
- j) Het aanbrengen van markering bestaande uit kantlijnen.
- k) Het aanvullen van de berm
- l) Afrondende werkzaamheden, zoals herplaatsen wegmeubilair.

2. Toetsing Waterwet

De toepassing van de Waterwet is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

Het ontwerp van de beschoeiing is getoetst aan de algemene regel WT-3. Conclusie: deze voldoet.

De beschoeiing wordt geplaatst in of net buiten het waterstaatswerk A-watgang. Hiervoor dient de legger te worden gewijzigd en ligt dit plan ter inzage conform de uniforme voorbereidingsprocedure van afd. 3.4. van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

Watercompensatie:

Binnen het werkgebied zal ongeveer 40 m² wateroppervlakte gedempt worden. De bestaande watgang zal bij perceel LMD00H173 worden verbreed, waardoor er 38m² nieuw wateroppervlak wordt gecreëerd.

2b. Chemische en ecologische kwaliteit

Grondstoffen

Grond

De kwaliteit van de grond die vrijkomt bij het profileren van het sloot-talud en het graven is op basis van de bodemkwaliteitskaart vastgesteld op achtergrondwaarde en wordt aangemerkt als onverdacht. De grond wordt binnen het werkvak toegepast of daarbuiten tijdelijk in depot gezet.

Baggerspecie:

Ter plaatse van de watercompensatie bevindt zich bagger in de watergang. Op basis van historische gegevens is de inschatting dat er geen extra maatregelen nodig zijn.

AGRAC

De te verwijderen agrac-laag wordt beschouwd als teerhoudend en zal niet worden hergebruikt en worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

Menggranulaat

De kwaliteit van het te ontgraven hydraulisch menggranulaat zal worden vastgesteld in een milieu hygiënisch bewijsmiddel (partijkeuring AP04).

Wet Natuurbescherming

Het projectgebied ligt buiten de Natura 2000- gebieden. Wel komen er volgens de Nationale Database Flora en Fauna enkele beschermende soorten voor. Hier wordt een ecologisch werkprotocol voor opgesteld en een quickscan uitgevoerd.

2c. Gevolgen maatschappelijke functies watersysteem

Bij het plaatsen van de beschoeiing zal de A-watergang met ongeveer 20cm worden versmald, de oppervlakte wordt binnen het peilgebied gecompenseerd.

Conclusie

Als gevolg van de aanleg van de beschoeiing en de wegreconstructie wordt watercompensatie toegepast waardoor er geen negatieve gevolgen te verwachten zijn voor de onderwerpen als genoemd onder artikel 2.1.van de Waterwet.

4. Beheer en onderhoud

De Koenderseweg en de nieuwe beschoeiing alsmede de A-watgang worden beheerd door Waterschap Rivierenland.

5. Procedure en zienswijze*

Het projectplan wordt op grond van de Inspraakverordening van het waterschap voorbereid via de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat eerst een ontwerp ter inzage wordt gelegd waarop zienswijzen kunnen worden gegeven. Na ontvangst van de zienswijzen wordt het projectplan definitief vastgesteld en wederom bekendgemaakt.

Belanghebbenden en ingezetenen van het waterschap kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit ontwerp-projectplan hun zienswijze over dit ontwerp kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Mondeling kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij de heer J.D. van Straten via telefoonnummer 0344-649481. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

6. Contactpersoon

De heer J.D. van Straten en de heer J.E.H. Bakker treden namens Waterschap Rivierenland op als contactpersoon.

Hoogachtend namens het college van dijkgraaf en heemraden
Van Waterschap Rivierenland

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J.M. van Bavel', with a long horizontal stroke extending to the right.

J.M. van Bavel.

