


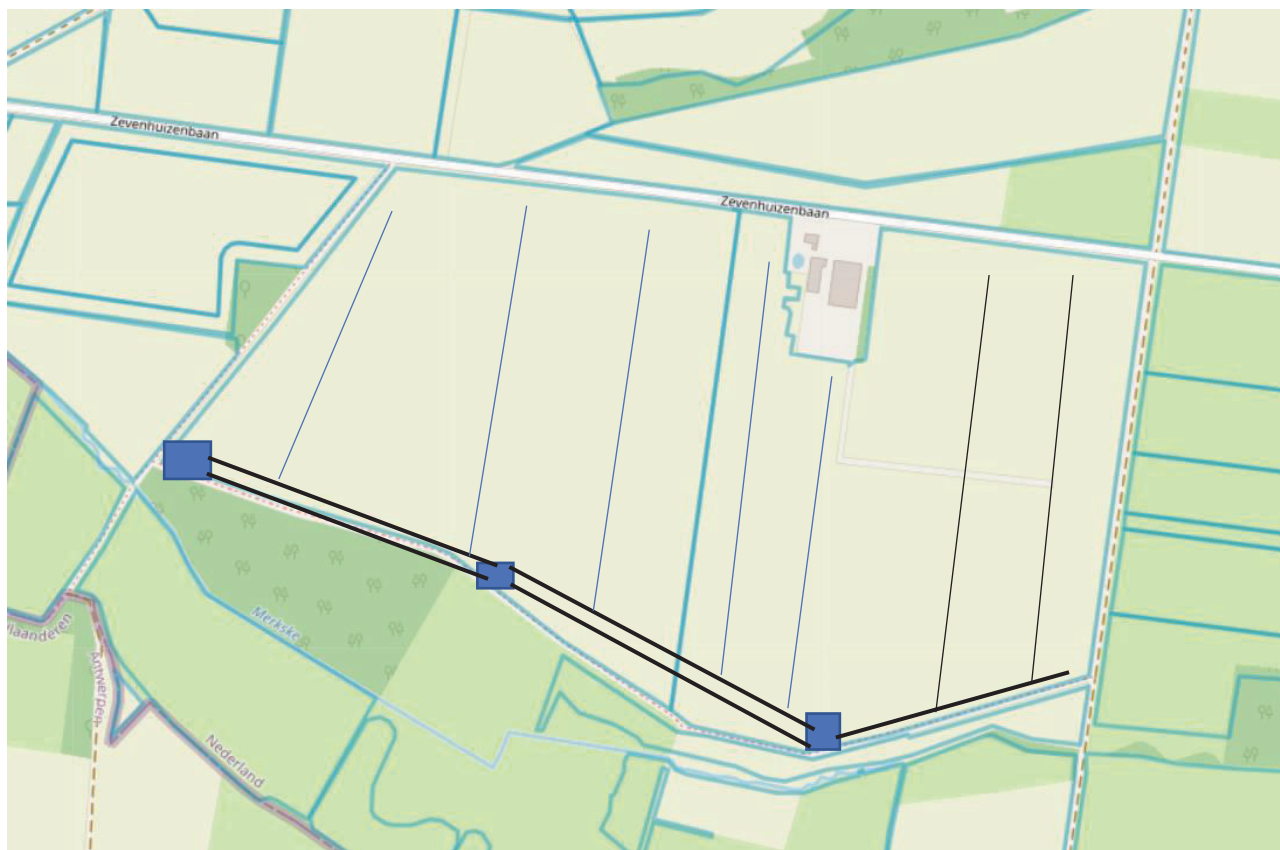

In totaal komen er 3 putten waarop elk een hoofdleiding voor de drains van een deel van de percelen wordt aangesloten. Daarnaast worden de putten onderling verbonden door een extra leiding.

De verbinding met de afvoersloot zit bij de linkerput op de tekening. De afvoersloot loopt daar aan de westzijde van het perceel.

De afstand van de drains wordt 6 m. Op een klein deel van het linker perceel worden enkele drains op 5 m gelegd i.v.m. plaatselijke leemplekken in dit perceel.

Draindiepte 80 cm.

Uitvoering werkzaamheden:

- Rechterperceel gezien vanaf de weg: ca. half april
- Linerperceel augustus na oogst tarwe.

- Drains in perceel (voorbeelden) – drains komen op 6 m.
- Hoofdleidingen



Putten tussen de hoofdleidingen en voor afvoer naar sloot.

“Peilwijziging”:

Het betreft een vervanging van de huidige drainage. Het peil wordt derhalve niet echt gewijzigd. Zeker niet dieper. Delen van het jaar zal het peil hoger gehouden worden om een betere vochtvoorziening van de gewassen te krijgen en minder te hoeven beregenen.
