


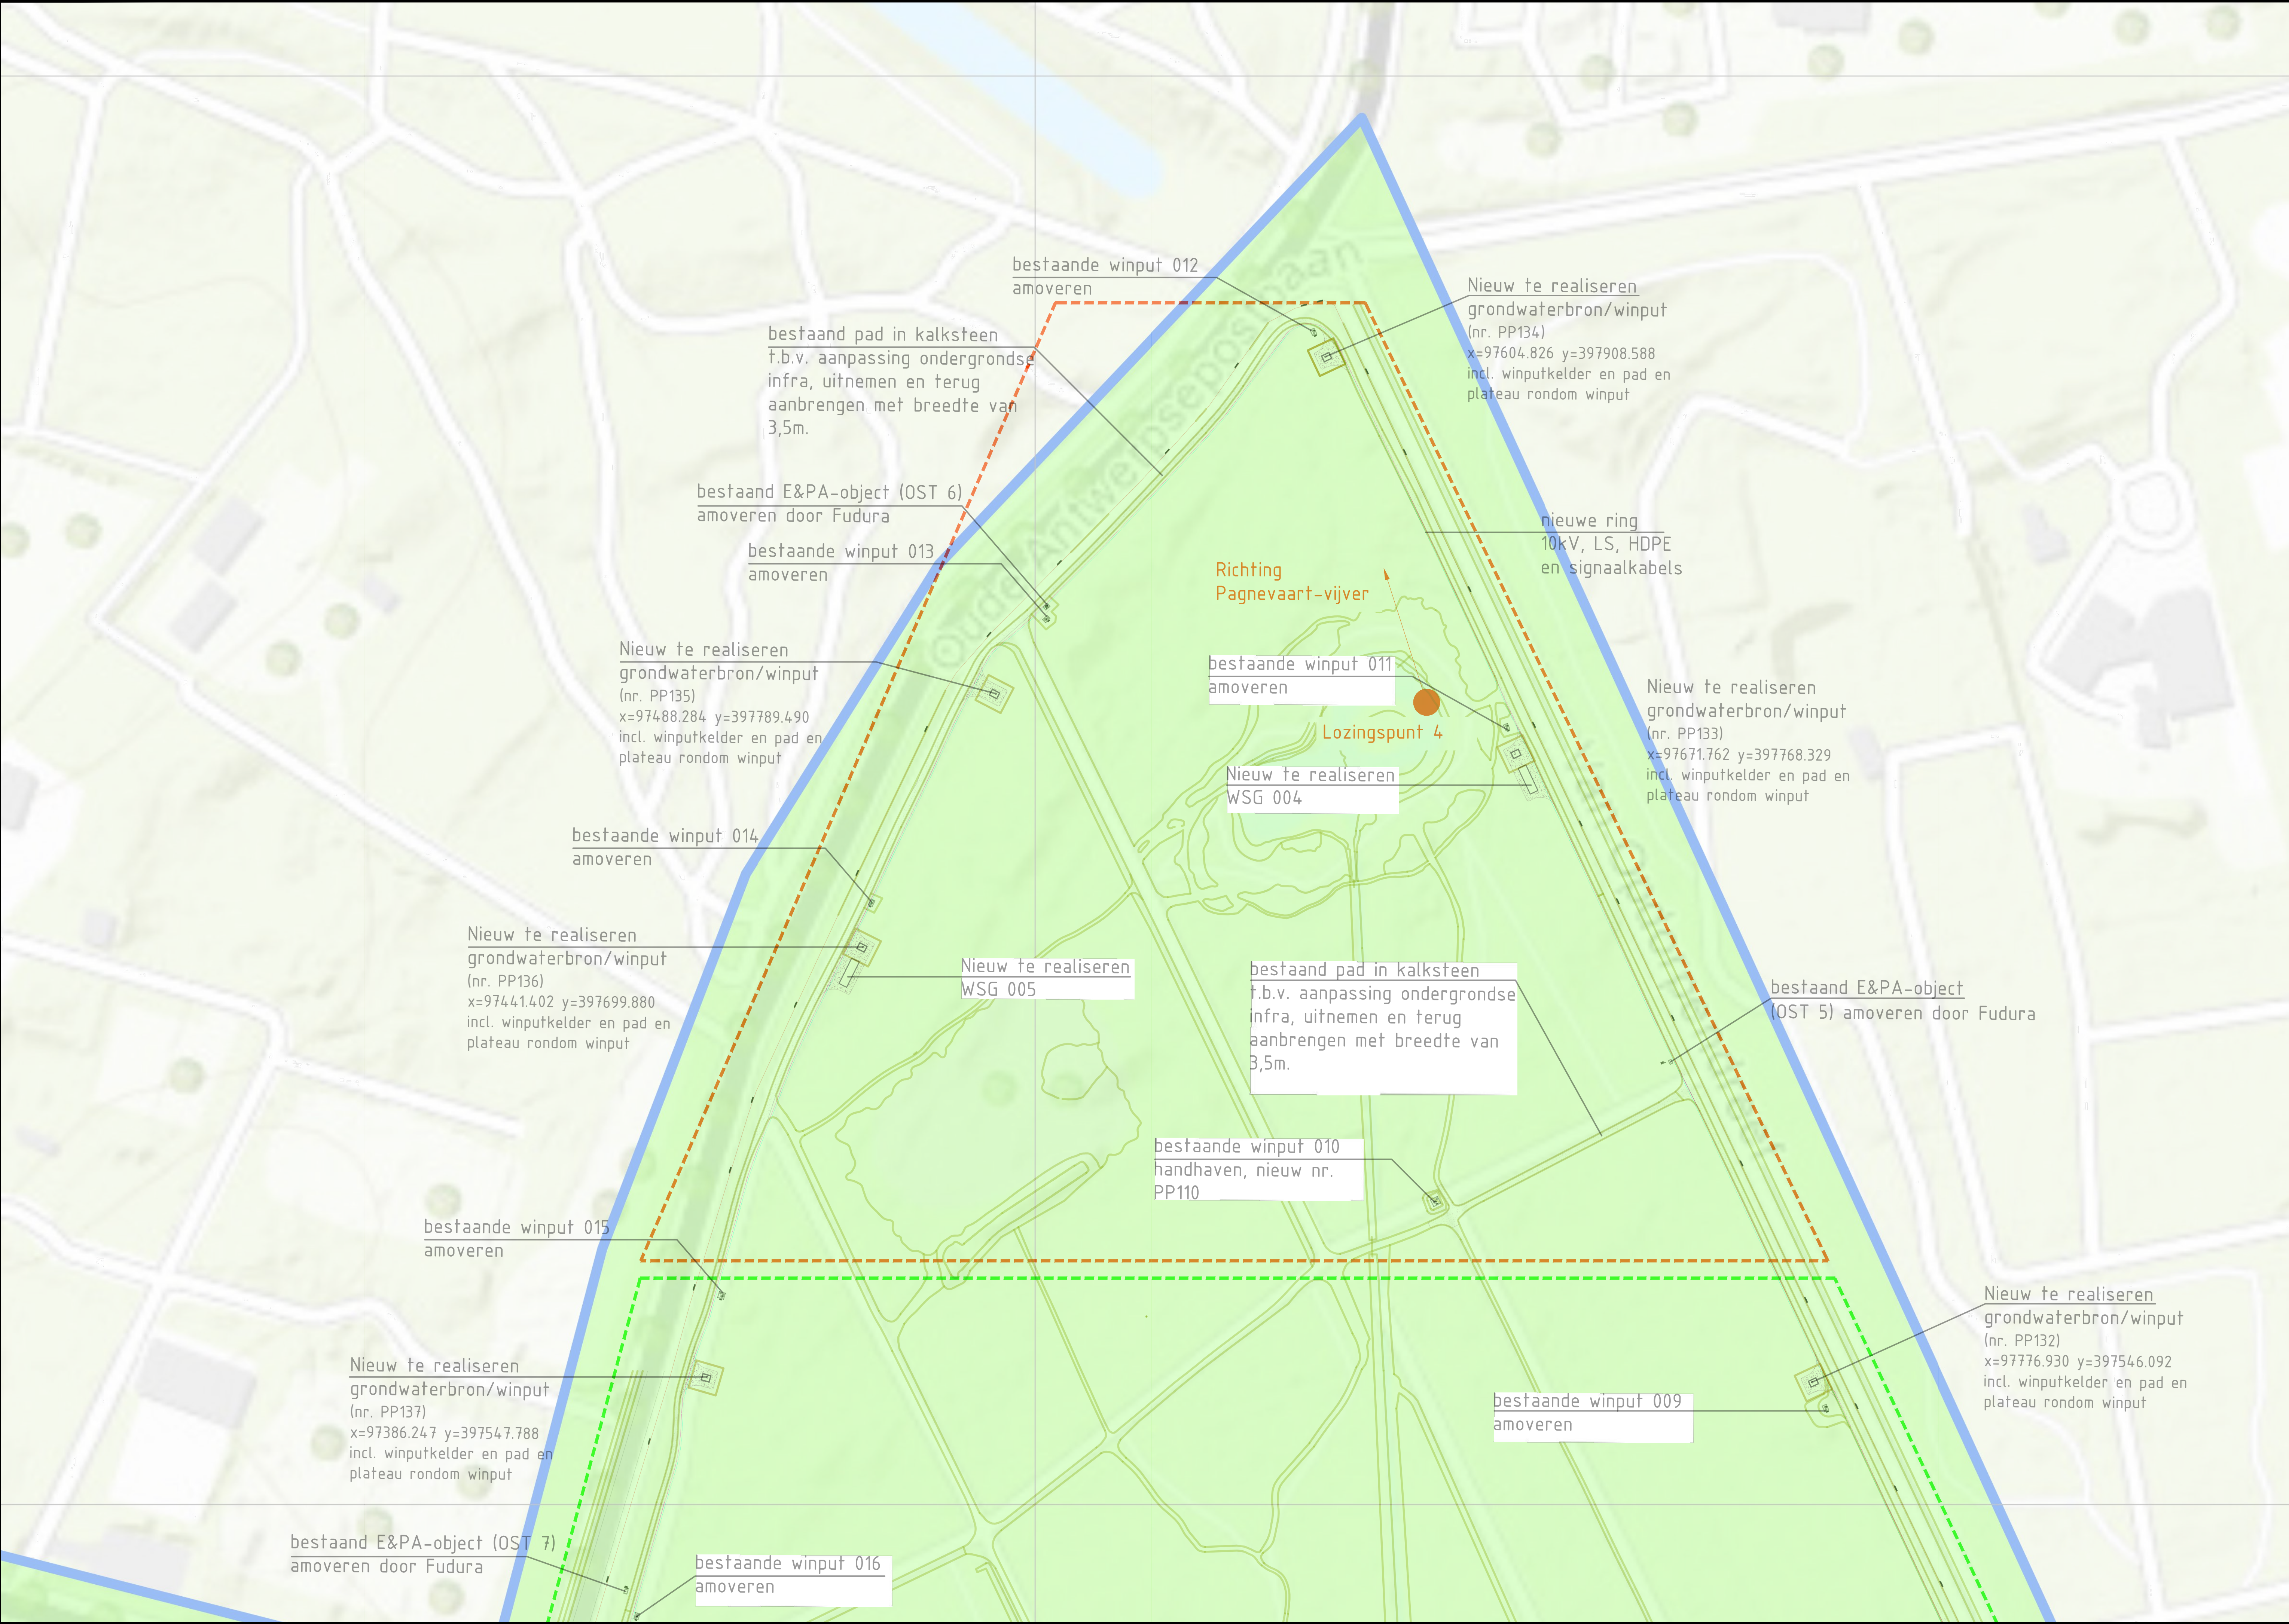

LOZINGSDEBIETEN EN LOZINGSPUNTEN									
LOCATIE	SOORT	DISCIPLINE	ONDERDEEL	DEBIET (m³)	MAX M³/U	GEM M³/U	GEM M³/DAG		
LOZINGSPUNT 4	LEEGLOOP LEIDING	INFRA	AFSLUITER NABIJ PP110	140	80	80	80		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	INFRA	AFSLUITER NABIJ PP110	550	80	80	550		
LOZINGSPUNT 4	BOORWATER	WINNING	BRON PP133	1903	30	22	519		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	WINNING	BRON PP133	28492	225	147	3600		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	BEDRIJFSVOERING	PUTCONSTRUCTIE PP133	11680	80	80	1920		
LOZINGSPUNT 4	LEEGLOOP LEIDING	INFRA	AFSLUITER NABIJ PP112	600	80	80	600		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	INFRA	AFSLUITER NABIJ PP112	150	80	80	150		
LOZINGSPUNT 4	BOORWATER	WINNING	BRON PP134	1903	30	22	519		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	WINNING	BRON PP134	28492	225	147	3600		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	BEDRIJFSVOERING	PUTCONSTRUCTIE PP134	11680	80	80	1920		
LOZINGSPUNT 4	BOORWATER	WINNING	BRON PP135	1903	30	22	519		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	WINNING	BRON PP135	28492	225	147	3600		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	BEDRIJFSVOERING	PUTCONSTRUCTIE PP135	11680	80	80	1920		
LOZINGSPUNT 4	BOORWATER	WINNING	BRON PP136	1903	30	22	519		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	WINNING	BRON PP136	28492	225	147	3600		
LOZINGSPUNT 4	SPIUWATER	BEDRIJFSVOERING	PUTCONSTRUCTIE PP136	11680	80	80	1920		
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	BOUW, WTB, E&A	DIVERSE	8263	40	40	1000		
SUBTOTAAL LOZINGSPUNT 4				178003		255	122		
TOTAAL				718011					
MAAIVELD				VISUEEL VERONTR. BOORWATER	WINNING	ALLE NIEUWE BRONNEN			
MAXIMALE LOZINGSDEBIET PER OBJECT IS 15x ONTWERPDEBIET NIEUWE BRON (150M³/u) = 225M³/u									
MAXIMALE MAATGEVENDE LOZINGSDEBIET IS GELIJKTUDIGHEID BOREN (30M³/u) EN ONTWIKKELEN (225M³/u) = 255M³/u									

BEMALINGSDEBIETEN							
LOCATIE	SOORT	ONDERDEEL	DEBIET (m³)	DUUR (d)	DEBIET (m³/u)	DUUR (d)	TOTAAL DEBIET (m³)
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	PUTCONSTRUCTIE PP133	5.8	5	3.7	9	1489
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	PUTCONSTRUCTIE PP134	6.7	5	4.6	9	1790
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	AFSLUITER NABIJ PP 134	5.8	5	N.V.T	N.V.T	692
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	PUTCONSTRUCTIE PP135	4.7	5	2.7	9	1134
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	PUTCONSTRUCTIE PP136	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	WSG 5	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T	N.V.T
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	AMOVEREN PP011	7.8	5	N.V.T	N.V.T	938
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	AMOVEREN PP012	7.8	5	N.V.T	N.V.T	938
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	AMOVEREN PP013	6.3	5	N.V.T	N.V.T	756
LOZINGSPUNT 4	BEMALINGSWATER	AMOVEREN PP014	4.7	5	N.V.T	N.V.T	562
SUBTOTAAL 4							8299
TOTAAL							38651

MAXIMALE ONTTREKKINGS- EN LOZINGSDEBIET BIJ GELIJKTUDIGHEID		GEMIDDELD LOZINGSDEBIET PER DAG (m³/dag)	
MEERDERE OBJECTEN		Totaal 38651 M³ IN 150 DAGEN = 260m³/d	
LOZINGSPUNT 1 = 5M³/u		LOZINGSPUNT 1 (1934m³/114d) = 67m³/d	
LOZINGSPUNT 2 = 29M³/u		LOZINGSPUNT 2 (5212m³/33d) = 160m³/d	
LOZINGSPUNT 3A = 40M³/u		LOZINGSPUNT 3A (24206m³/114d) = 341m³/d	
LOZINGSPUNT 4 = 30M³/u		LOZINGSPUNT 4 (8299m³/32d) = 260m³/d	

A

C

B

Naam		Datum		Opmerkingen: BLAD 3 VAN 3	
Getekend: SECTIE B&C		26-09-2024			
Gezien:					
Projectnummer: F-525-2023-006		Schaal: 1:1000			
WATERPRODUCTIEBEDRIJF SEPPE					
TERREIN					
SPUILOCATIES; BLAD C					
brabantWater		Maafvoering in mm Pelen in mm 1 o.v. NAP		Formaat GBKN	
				Tekeningsnummer: C-111-801-00008	
