# Concept planning aanleg bovenafdichting Dak van Drenthe

| Id | Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum | Voorafgaanc taken | Resourcenamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **FASE 1 TRISOPLAST (ca. 10 Hectare)** | **133 dagen** | **woe 22-2-23** | **don 31-8-23** | | |
| 2 | **Besteksvoorbereiding Trisoplast** | **45 dagen** | **woe 22-2-23** | **woe 26-4-23** | | |
| 3 | Bestek + ontwerp | 4 wkn | woe 22-2-23 | din 21-3-23 | | |
| 4 | Goedkeuring bestek | 5 wkn | woe 22-3-23 | woe 26-4-23 | 3 | |
| 5 | **Aanvoer bodemas** | **30 dagen** | **woe 15-3-23** | **woe 26-4-23** | | |
| 6 | Aanvoer bodemas (ca. 45000 ton) | 6 wkn | woe 15-3-23 | woe 26-4-23 | | |
| 7 | Onderzoek SAR waarde (NTA 8888) | 3 wkn | woe 5-4-23 | woe 26-4-23 | 12GB-3 wk | |
| 8 | **Inkoop folie** | **40 dagen** | **woe 1-3-23** | **woe 26-4-23** | | |
| 9 | Levertijd folie | 8 wkn | woe 1-3-23 | woe 26-4-23 | 12GB-8 wk | |
| 10 | **Realisatie bovenafdichting Trisoplast (ca. 9 Ha)** | **108 dagen** | **woe 29-3-23** | **don 31-8-23** | | |
| 11 | Voorbereidend grondwerk incl. verwerken bodemas | 4 wkn | woe 29-3-23 | woe 26-4-23 | 12GB-4 wk | |
| 12 | Aanleg Trisoplast | 13 wkn | vri 28-4-23 | maa 31-7-23 | 6 | |
| 13 | Aanleg folie | 13 wkn | maa 1-5-23 | din 1-8-23 | 12GB+1 da | |
| 14 | Aanleg drainagemat | 13 wkn | maa 1-5-23 | din 1-8-23 | 13GB | |
| 15 | Aanbrengen afdekgrond | 16 wkn | vri 28-4-23 | maa 21-8-23 | 12GB | |
| 16 | Aanbrengen onderbouw fietspad | 13 wkn | woe 10-5-23 | don 10-8-23 | 15GB+1 wk | |
| 17 | Aanbrengen leidingwerk waterafvoer | 13 wkn | woe 10-5-23 | don 10-8-23 | 16GB | |
| 18 | Inzaaien | 2 dagen | din 22-8-23 | woe 23-8-23 | 15 | |
| 19 | Aanbrengen asfalt fietspad + afwerking waterafvoer | 3 wkn | vri 11-8-23 | don 31-8-23 | 16 | |
| 20 | **FASE 2 HYDROSTAB (ca. 7 Hectare)** | **461 dagen** | **maa 23-1-23** | **don 21-11-24** | | |
| 21 | **Vooronderzoeken Hydrostab** | **120 dagen** | **maa 20-3-23** | **don 7-9-23** | | |
| 22 | Geschiktheidsonderzoek aanvullende grondstoffen | 30 dagen | maa 20-3-23 | din 2-5-23 | | |
| 23 | Vooronderzoek aanvullende mengsels | 60 dagen | woe 3-5-23 | don 27-7-23 | 22 | |
| 24 | Presentatie halftijdsresultaten | 1 dag | vri 16-6-23 | vri 16-6-23 | 23GB+30 d | |
| 25 | Beoordeling door RUD | 6 wkn | vri 28-7-23 | don 7-9-23 | 23 | |
| 26 | **Onderzoek herbruikbaarheid Hydrostab** | **95 dagen** | **maa 23-1-23** | **don 8-6-23** | | |
| 27 | Opstellen plan van aanpak/theoretische onderbouwi | 21 dagen | maa 23-1-23 | maa 20-2-23 | | |
| 28 | Laboratoriumonderzoek | 60 dagen | maa 30-1-23 | maa 24-4-23 | | |
| 29 | Rapportage halftijdse resultaten | 1 dag | maa 13-3-23 | maa 13-3-23 | 28BE-30 da | |
| 30 | Beoordeling door RUD | 6 wkn | din 25-4-23 | don 8-6-23 | 28 | |
| 31 | **Revisie/ombouw menginstalatie** | **40 dagen** | **maa 27-3-23** | **woe 24-5-23** | | |
| 32 | Revisie/ombouw menginstallatie | 2 mndn | maa 27-3-23 | woe 24-5-23 | | |
| 33 | **Aanleg proefveld** | **115 dagen** | **don 25-5-23** | **don 2-11-23** | | |
| 34 | Opbouw menginstallatie | 2 wkn | don 25-5-23 | don 8-6-23 | 32 | |
| 35 | Aanleg proefveld | 1 wk | vri 9-6-23 | don 15-6-23 | 34 | |
| 36 | Onderzoeken | 60 dagen | vri 16-6-23 | don 7-9-23 | 35 | |
| 37 | Presentatie halftijds resultaten | 1 dag | vri 18-8-23 | vri 18-8-23 | 36GB+45 d | |
| 38 | STOPPUNT Besluitvorming GS | 8 wkn | vri 8-9-23 | don 2-11-23 | 36 | |
| 39 | **Goedkeuring bestekswijzigingen** | **20 dagen** | **vri 16-6-23** | **don 13-7-23** | | |
| 40 | Aanpassing bestek, protocol etc. | 2 wkn | vri 16-6-23 | don 29-6-23 | 35 | |
| 41 | Beoordeling door RUD | 2 wkn | vri 30-6-23 | don 13-7-23 | 40 | |
| 42 | **Realisatie bovenafdichting Hydrostab (6 Ha)** | **185 dagen** | **maa 4-3-24** | **don 21-11-24** | | |
| 43 | Voorbereidende werkzaamheden | 8 wkn | maa 4-3-24 | din 30-4-24 | | |
| 44 | Opbouw menginstallatie | 2 wkn | woe 17-4-24 | din 30-4-24 | 45GB-2 wk | |
| 45 | Aanleg Hydrostab | 20 wkn | woe 1-5-24 | don 19-9-24 | 43 | |
| 46 | Aanleg folie | 21 wkn | woe 1-5-24 | don 26-9-24 | 45GB | |
| 47 | Aanleg drainagelaag | 21 wkn | woe 1-5-24 | don 26-9-24 | 46GB | |
| 48 | Aanbrengen afdeklaag | 23 wkn | woe 1-5-24 | don 10-10-24 | 47GB | |
| 49 | Aanleg leidingwerk waterafvoer | 23 wkn | vri 24-5-24 | don 31-10-24 | 48BE-20 wl | |
| 50 | Inzaaien, opruimen etc. | 3 wkn | vri 1-11-24 | don 21-11-24 | 49 | |

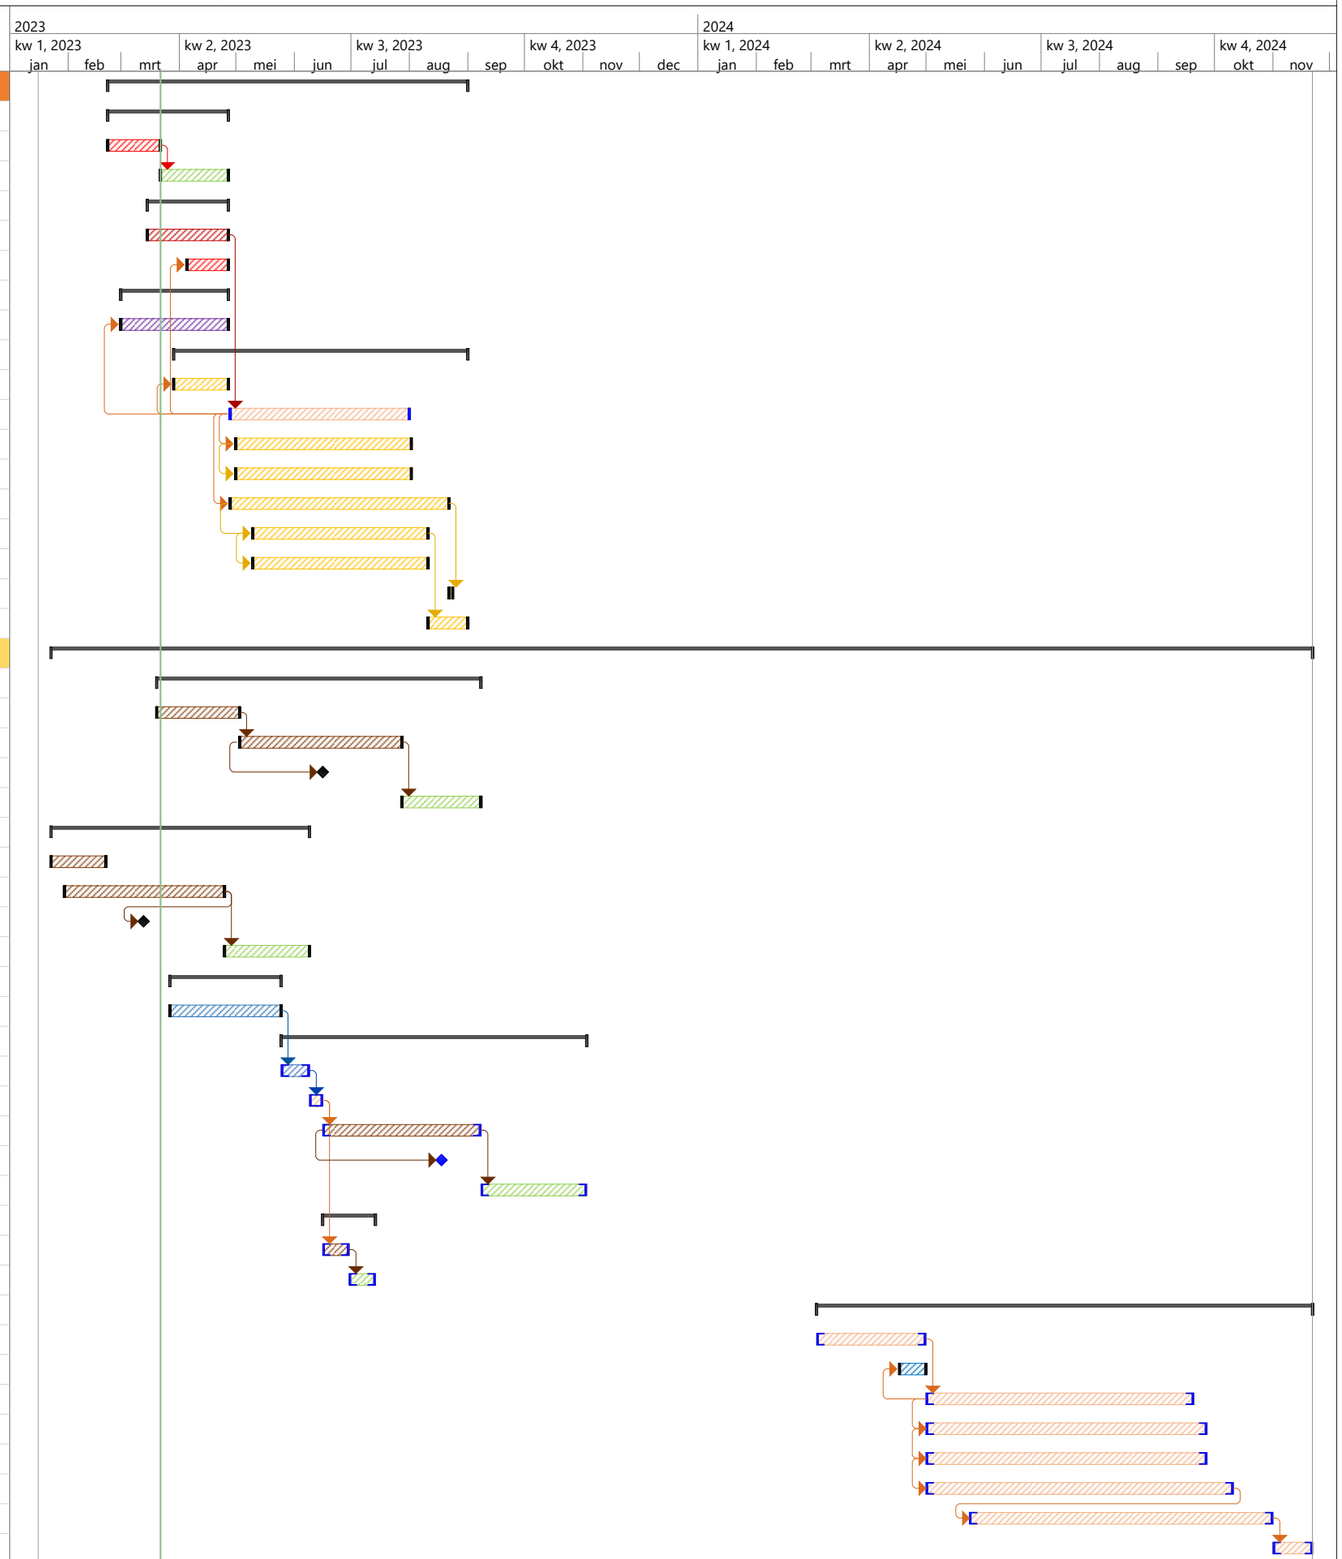


Auteur: R. Heijnen

Uitgangspunten weekproductie Hydrostab 4500 m2-4000 ton / week
Weekproductie Trisoplast 2000 m2/dag

Datum: 22-3-2023
Versie 18
