EQUINIX

project Equinix

The things we create are the things that define us

© 2025 Equinix, Inc.

Ontgronding fase 1


Inzicht in de ontgrondingswerkzaamheden voor fase 1

Deelaspect Ontgrondingen	Volume
Vijver	2.506 m^3
Kabels en leidingen	31.280 m^3
Wegen	4.008 m^3
Gebouwen	9.233 m^3
Totaal	*47.027 m^3*

dGmR


© 2025 Equinix, Inc. -

Vijver - regenwater opvang (fase 1)

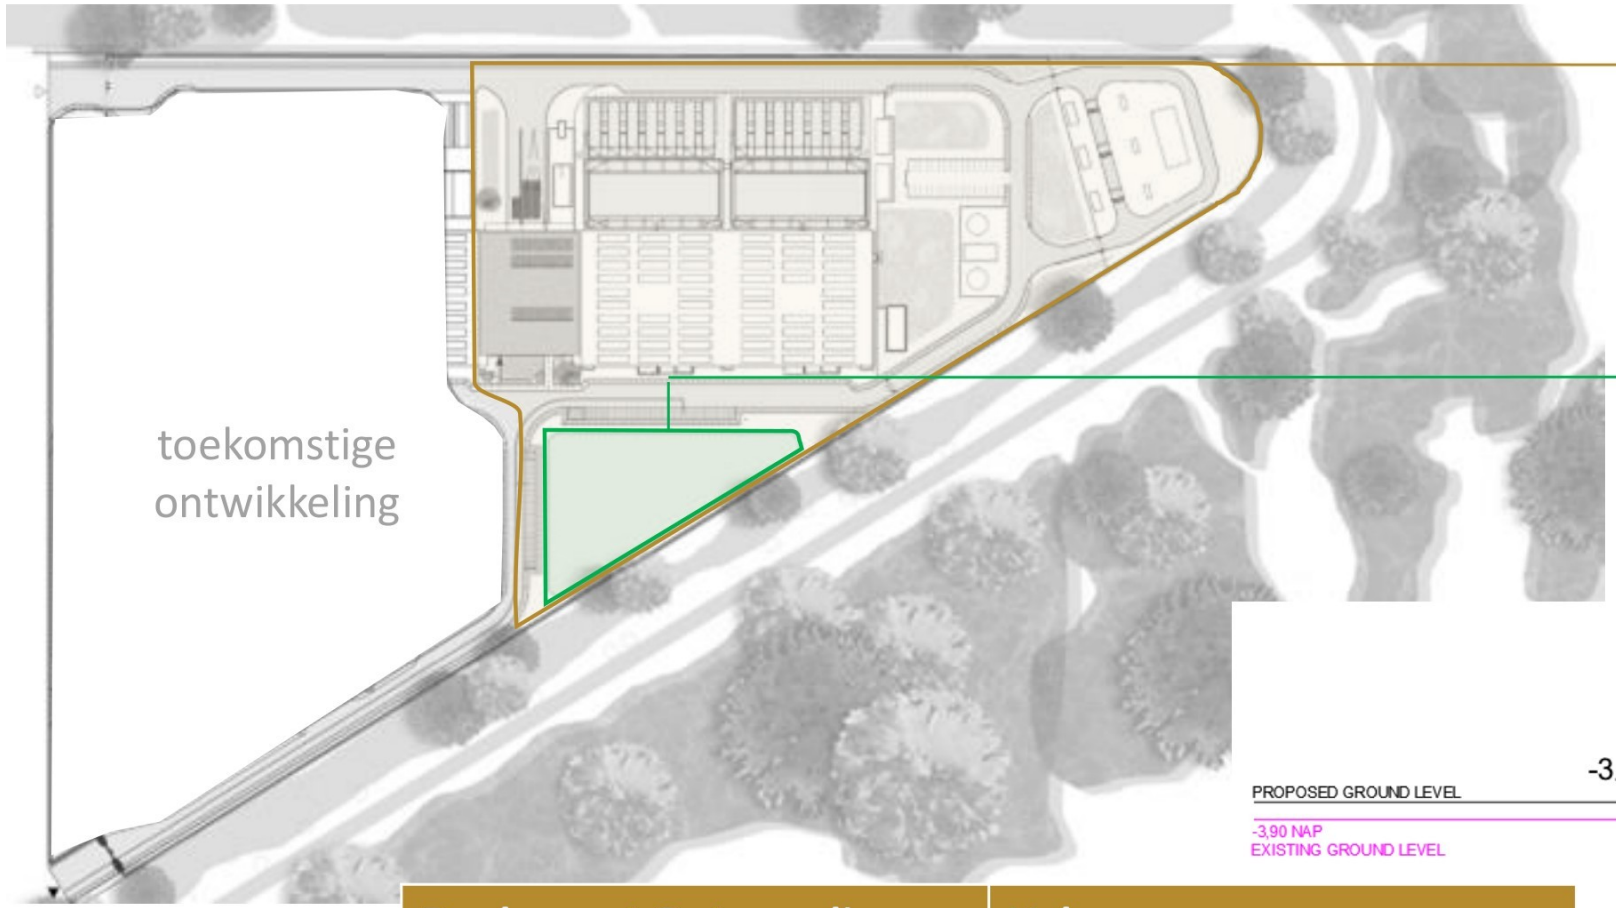

Projectgebied fase 1
- Totaal 56.634 m^2
- Verhard 41.624 m^2 *(73%)*
- Landschap 15.010 m^2 *(27%)*


Vijver voor opvang regenwater
- 3.500 m^2 oppervlak *(>5%)*
- 6.300 m^3 inhoud
- 0,8 m onder bestaand maaiveld

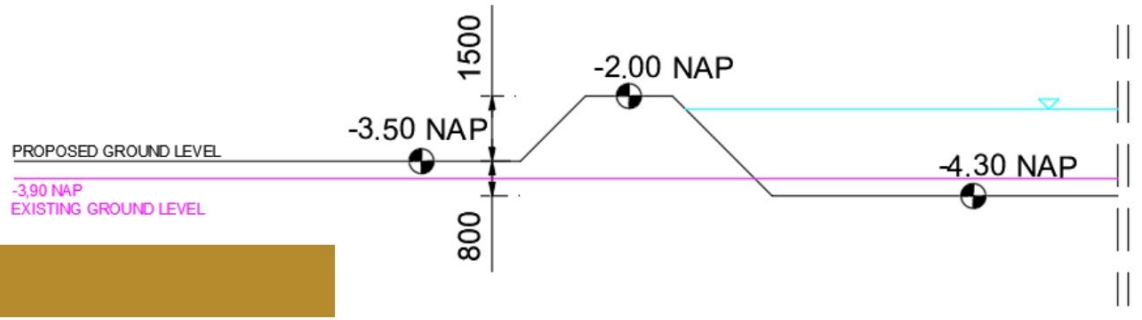

Deelaspect Ontgrondingen	Volume
Vijver	2.506 m_3

© 2025 Equinix, Inc. -

Kabels en leidingen

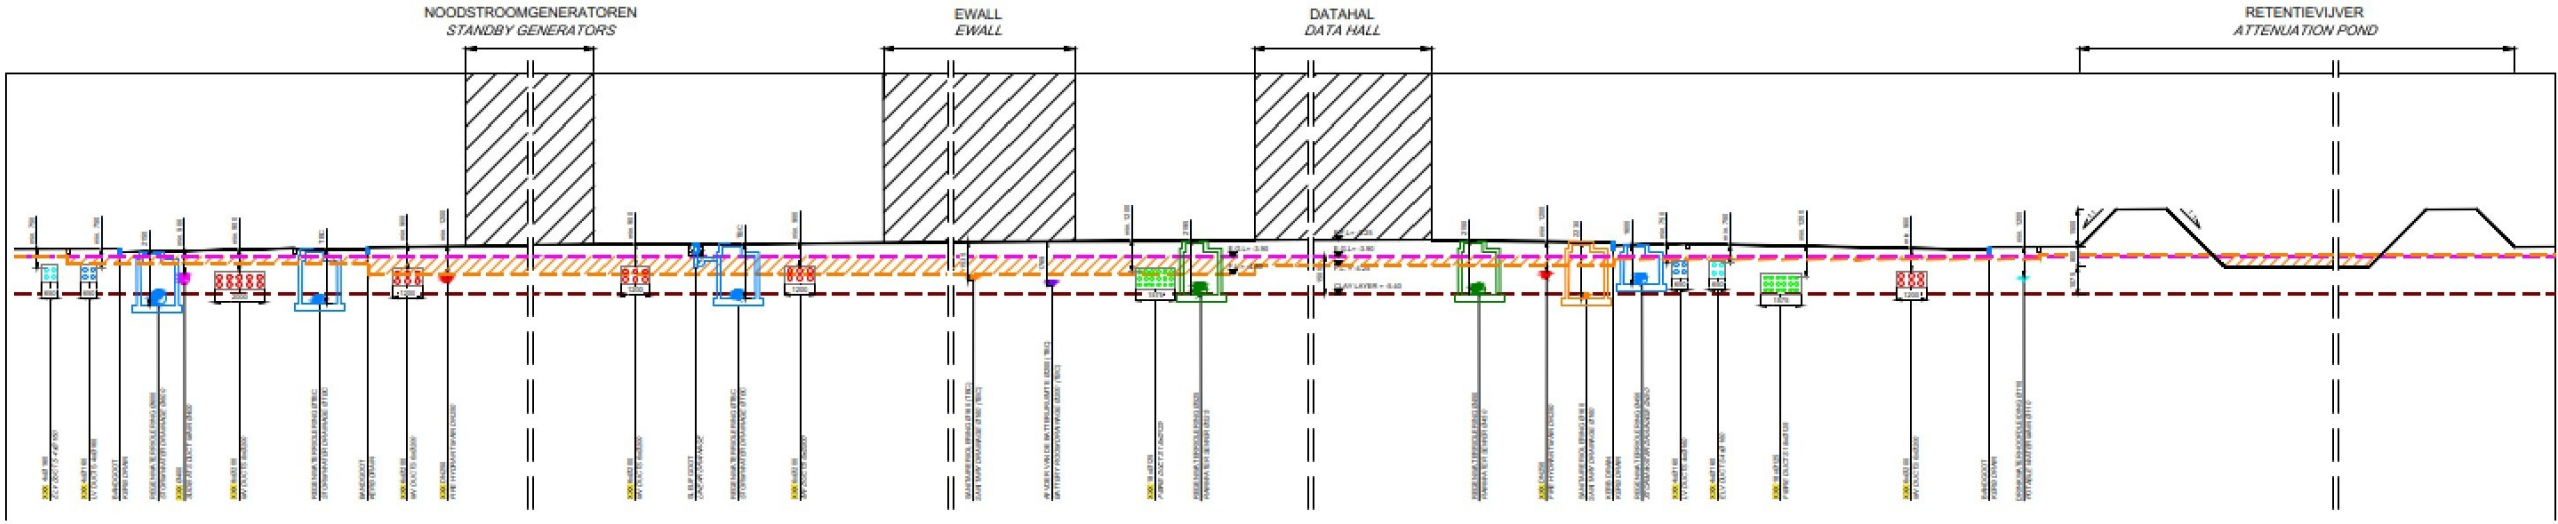

F.F.L — VOORGESTELDE AFWERKING VLOER/ BEGANE GROND

E.G.L — BESTAANDE BEGANE NIVEAU


F.L — SNIJ NIVEAU


diepst gelegen installaties zijn zwaartekrachtleidingen (riolering, hemelwater, regenwater) met pompstations aan het uiteinde - circa 3,6-5,0 meter diep.

Deelaspect Ontgrondingen	Volume
Kabels en leidingen	31.280 m^3

© 2025 Equinix, Inc. -

Wegen

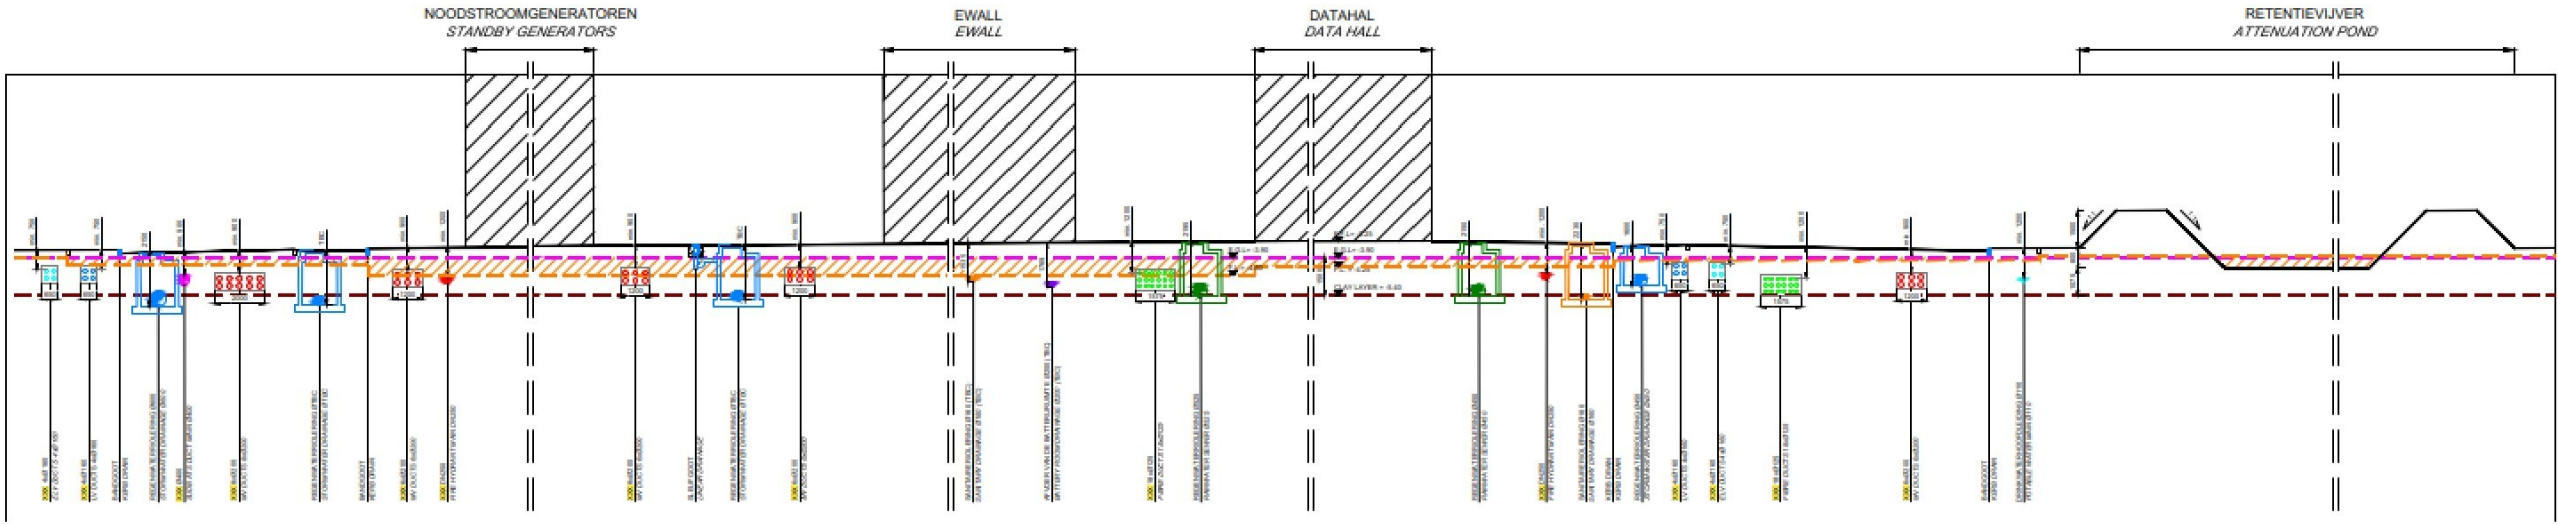

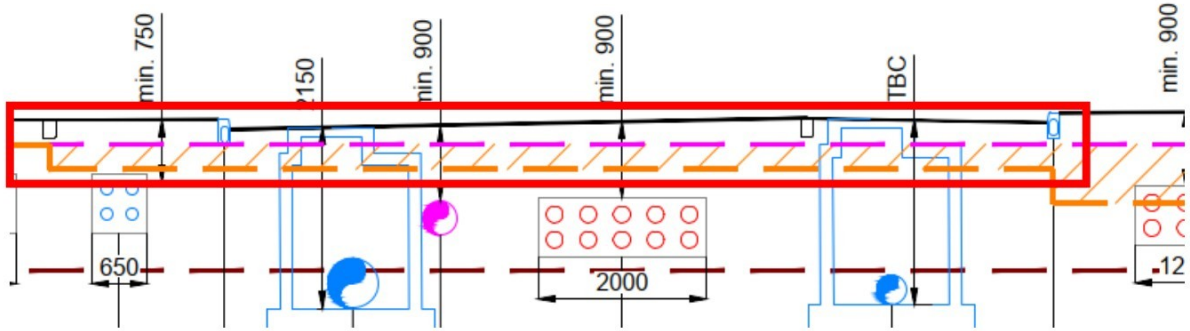




Deelaspect Ontgrondingen	Volume
Wegen	4.008 m^3

© 2025 Equinix, Inc. -

Gebouwen

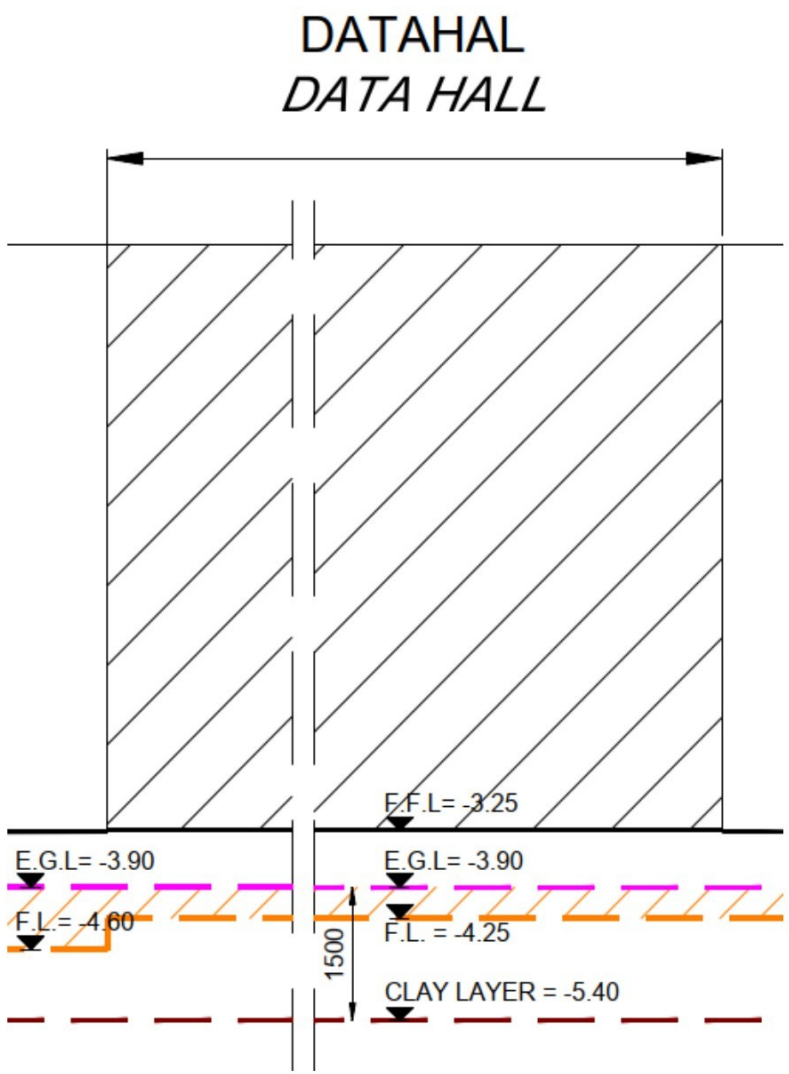

Projectgebied fase 1

- Admin Building 2.228 m^2
- Data Hall 7.005 m^2



Deelaspect Ontgrondingen	Volume
Gebouwen	3 232 m^3

© 2025 Equinix, Inc. -



EQUINIX
