Groen gearceerd: Fase 1a, aanleg nieuwe parallelweg + fietspad
Tijdens deze fase is er ongehinderde doorstroming van al het verkeer. Verkeer wordt afgewikkeld volgens de huidige situatie over de bestaande infrastructuur. Langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo v.v. via omleiding 1.
Uitvoering week 28 t/m 43 (2016)

Blauw gearceerd: Fase 1b, aanleg tijdelijke rotonde en aansluiting bypass op N34
Tijdens deze fase beperkte hinder verkeer onder begeleiding van verkeersregelaars. Fietsers/voetgangers via nieuw fietspad, het overige verkeer wordt afgewikkeld volgens de huidige situatie over de bestaande infrastructuur. Langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo v.v. via omleiding 1.
Uitvoering week 36 t/m 40 (2016)

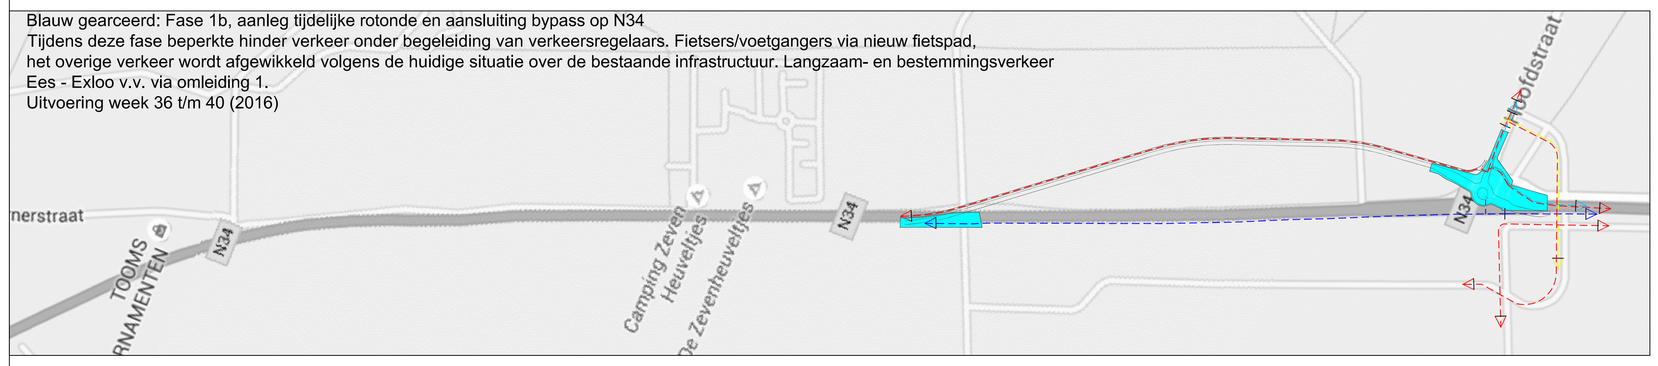

Oranje gearceerd: Fase 2a, Aanleg nieuwe N34 en kunstwerk
Tijdens deze fase doorgaand verkeer via tijdelijke bypass met turborotonde fietsers/voetgangers via nieuwe fietspad. Langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo v.v. via omleiding 1.
Uitvoering week 29 t/m week 15 (2017)
Vanaf week 40 wordt de tijdelijke bypass met turborotonde opengesteld voor het verkeer

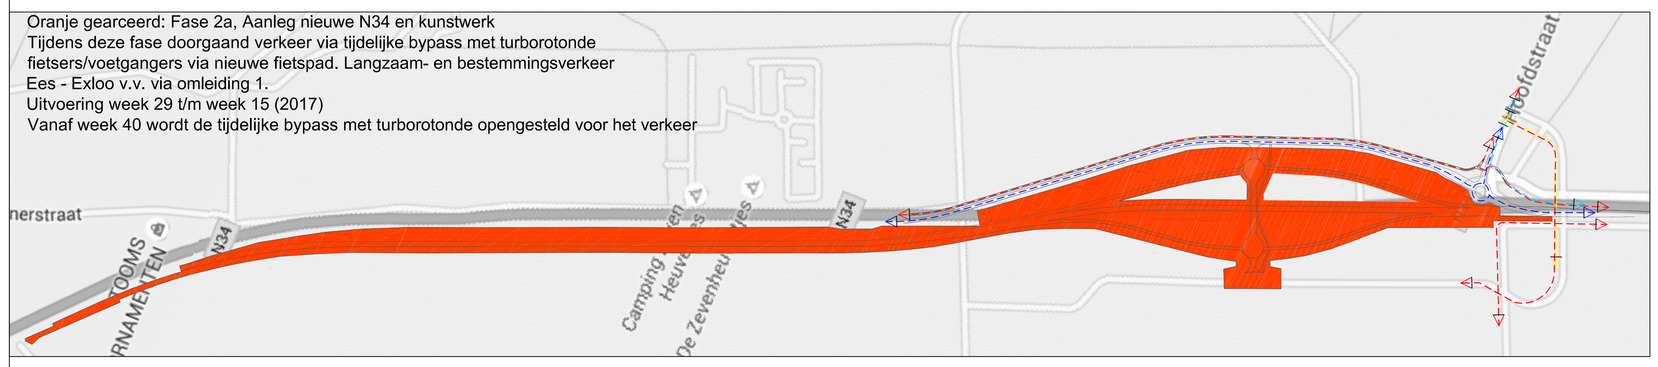

Oranje gearceerd: Fase 2b, Aansluiting parallelweg - kluifrotonde - Odoornerstraat
Tijdens deze fase doorgaand verkeer via tijdelijke bypass met turborotonde fietsers/voetgangers via nieuwe fietspad. Langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo v.v. via omleiding 1.
Uitvoering week 14 (2017)

Geel gearceerd: Fase 3a, sloop tunnelmoot oost en toerit tunnel west. Verkeer t.p.v. de te slopen tunnelmoot (Borgerderweg oostzijde N34) is bereikbaar d.m.v. een tijdelijke brug. Fietsers / voetgangers via nieuw fietspad (nabij kluifrotondes). Langzaam en bestemmingsverkeer via nieuwe kluifrotondes.
uitvoering week 14 t/m 17 (2017)

Geel gearceerd: Fase 3b, sloop tunnelmoot west en verwijderen verharding Borgerderweg.
Tijdens deze fase is er geen hinder voor het verkeer. Langzaam en bestemmingsverkeer via nieuwe kluifrotondes.
Uitvoering week 17 t/m 19 (2017)

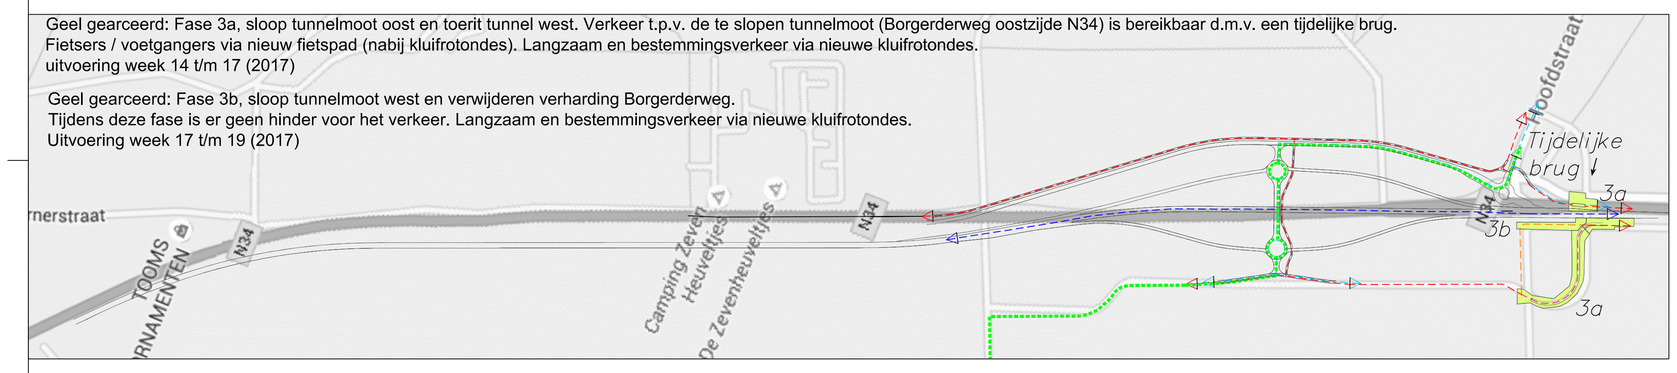

Donkerblauw gearceerd: Fase 4, Sloop tunnelmoot N34/parallelweg en aansluitingen nieuwe N34
Tijdens deze fase is er een weekendafsluiting van de N34, hiervoor wordt het verkeer omgeleid volgens omleiding 2.
Fietsers/voetgangers/langzaam verkeer hebben geen hinder
Uitvoering in het weekend van 12 t/m 15 mei 2017

Donkerblauw gearceerd: Fase 4 aansluiting N34. Weekend afgesloten.

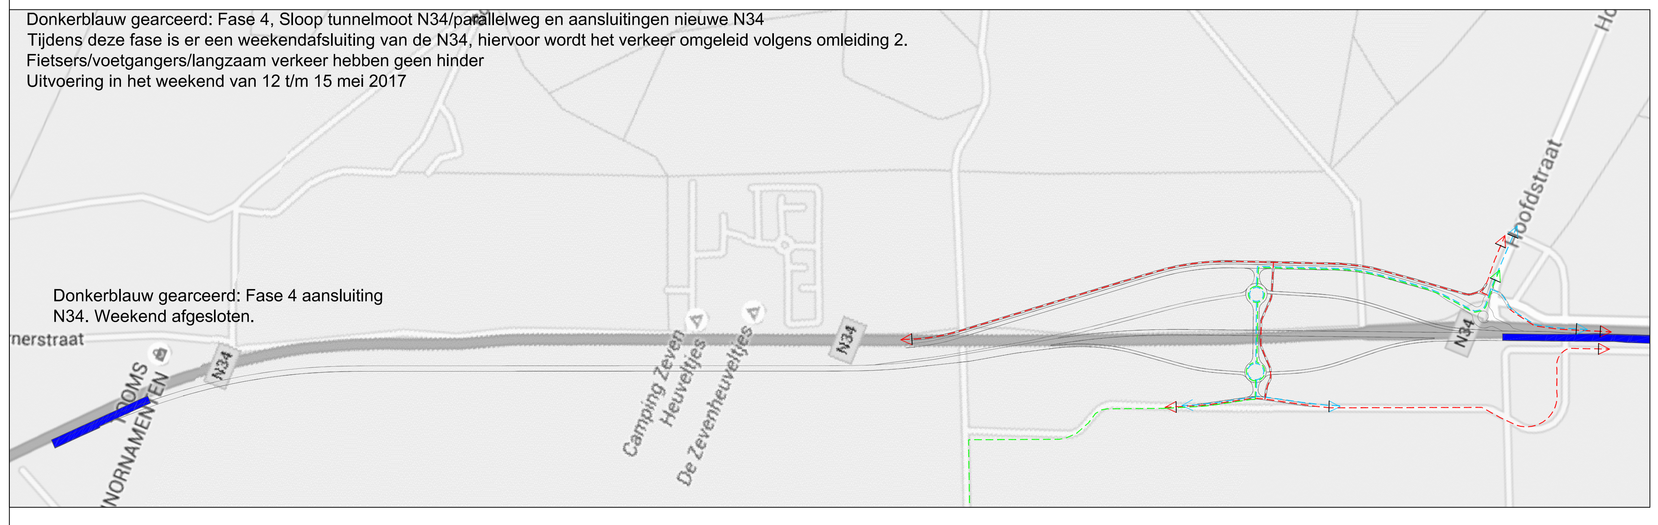

- Route fietsers/voetgangers
- Route langzaam en bestemmingsverkeer
- Omleidingsroute 1a langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo via landbouw tunnel
- Omleidingsroute 1b langzaam- en bestemmingsverkeer Ees - Exloo via nieuwe kluifrotondes
- Route verkeer N34
- Route fietsers/voetgangers tijdens fase 3a
- Route fietsers/voetgangers tijdens fase 3b
- Omleiding 2 t.b.v. weekendafsluiting N34

Omleiding 2

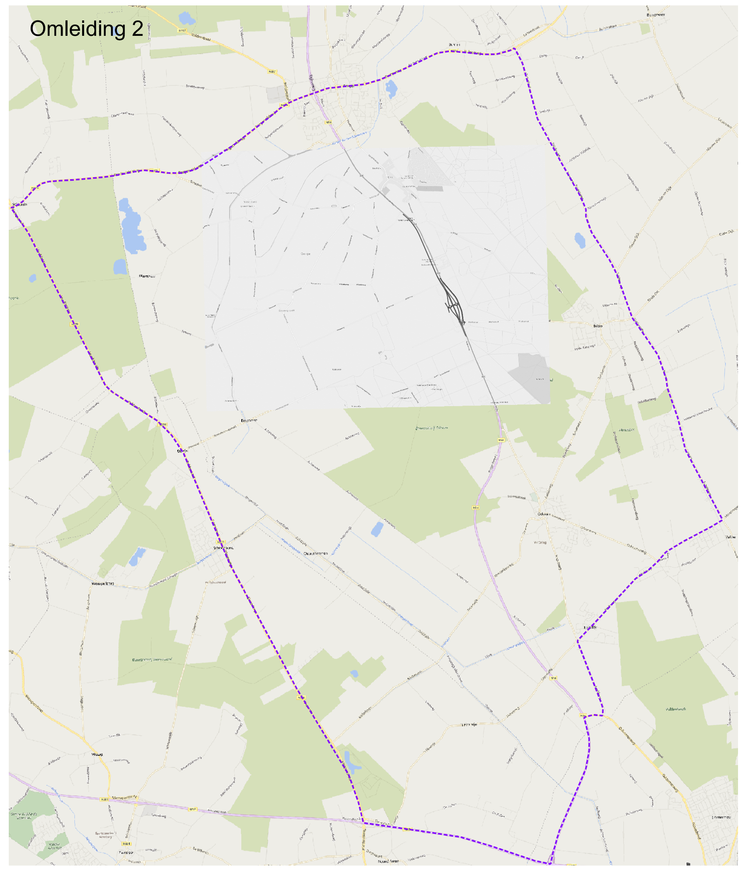

Omleiding 1A (via landbouwtunnel)

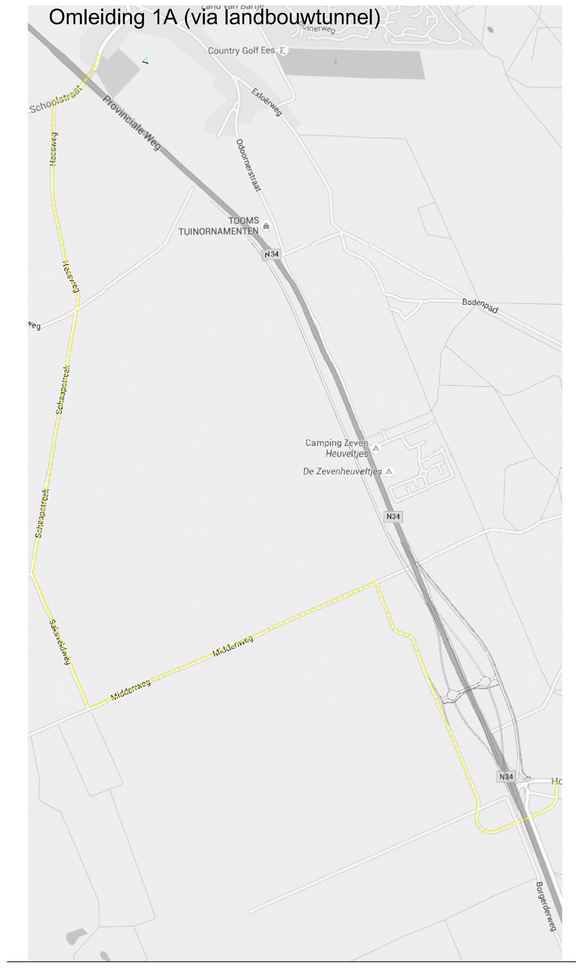

Omleiding 1B - (via kluifrotonde)

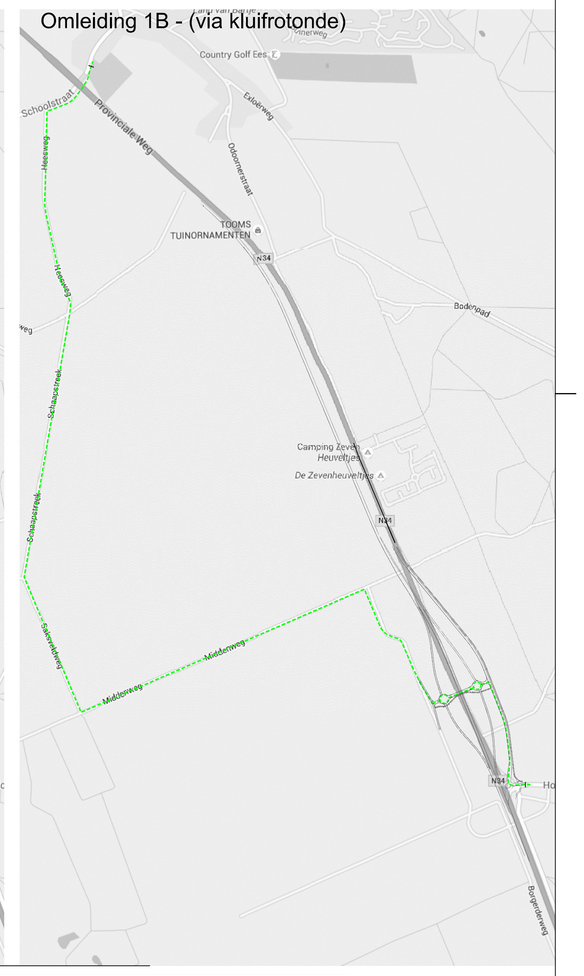

Lichtgroen gearceerd: Fase 5a, Aansluiting Ees, versmallen en nieuwe deklaag parallelweg/fietspad
Tijdens het aanbrengen van de deklaag voor het fietspad wordt een fietstaxi ingezet voor voetgangers en fietsers
uitvoering week 20 t/m 23 (2017)

Paars gearceerd: Fase 5b, Versmallen af te waarderen huidige N34, verwijderen verhardingen.
Deze fase wordt gerealiseerd zonder stremmingen voor alle verkeersstromen.
Tijdens het aanbrengen van de deklaag worden verkeersregelaaras ingezet.
uitvoering week 22 en 23 (2017)

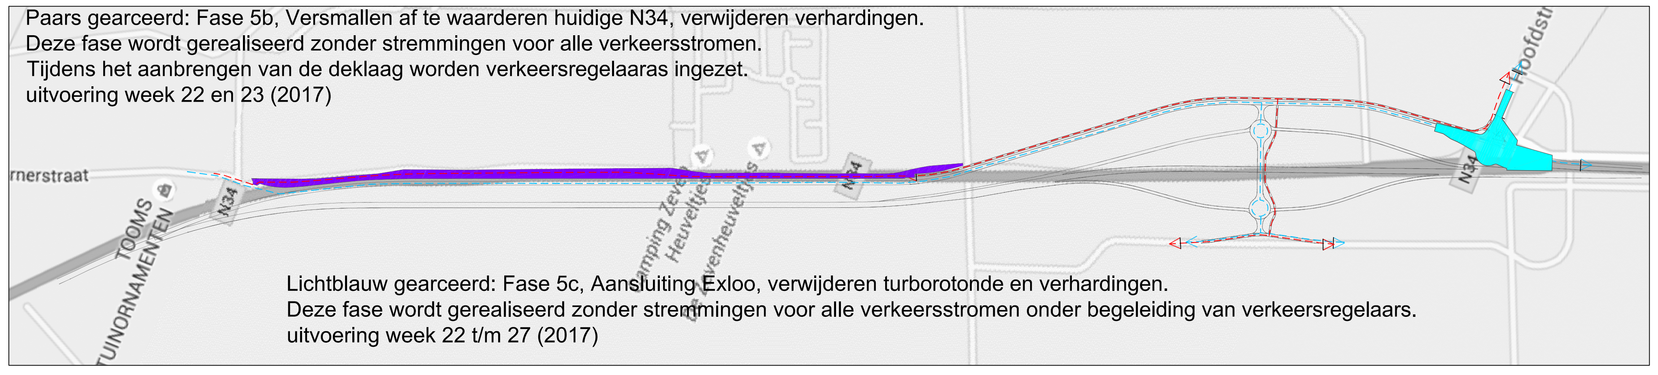

Lichtblauw gearceerd: Fase 5c, Aansluiting Exloo, verwijderen turborotonde en verhardingen.
Deze fase wordt gerealiseerd zonder stremmingen voor alle verkeersstromen onder begeleiding van verkeersregelaars.
uitvoering week 22 t/m 27 (2017)

SCHAGEN INFRA

Schagen Infra B.V.
Postbus 619
8000 AP Zwolle

Hanzeweg 21
8061 RC Zwolle

T 038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl

Wijz.	Datum	Omschrijving	Wijz.	Datum	Omschrijving
A	5-7-2016	Verkeersroutes	C		
B			D		

Opdrachtgever	Provincie Drenthe
Project	N34 aansluiting Exloo
Onderdeel	Schematische weergave verkeersroutes tijdens bouw

Datum	Get.88R	Schaal n.v.t.	Formaat A0	Projectnr.	Tekening 1	Bladnr. 1

Samen maken we morgen.

ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP
