3 003 926 KAZERNESTRAAT		
Veldwaarde	Zekeringswaarde	Groepsnummer
	250 gFF	770180
	160 gFF	770032

3 003 926 KAZERNESTRAAT MUIDEN

Aansluiting (laadpaal) overzetten op LS 770180
Montage door van Gelder

Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770032
NTL: EM 770032 Montage door van Gelder

A Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770180
UTN: 4x150Al (VMvK) 770181
Z UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770032

Alle Aansluitingen op 50Cu LS 770032
overzetten op bestaande 4x150Al LS 770180
Montage door van Gelder

A Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770180
UTN: 4x150Al (VMvK) 770181
Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770013
Best: 4x95Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 779128
Best: 4x95Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 779002
Z Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770033

3 003 895 HOOGINGSTRAAT MUIDEN

Alle Aansluitingen op 50Cu LS 770032
overzetten op bestaande 4x150Al LS 770180
Montage door van Gelder

A Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770180
UTN: 4x150Al (VMvK) 770181
Best: MB
Z UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770032

Aansluiting overzetten op LS 770033
montage door van Gelder
Voor week 7

3 017 866 A 770047 MUIDEN

LS kast 770047 verwijderen
NTL: EM 770030
NTL: EM 770033
NTL: EM 770013

A UTN: 4x50Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770038
UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770039
UTN: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770037
Z UTN: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770092

Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770092 wordt LS 770038
NTL: VM 770038
Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770039
NTL: VM 770039
NTL: VM 770038
NTL: VM 770039

A Best: 4x50Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770038
Z Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770037 wordt LS 770039

Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770092 wordt LS 770038
NTL: VM 770038
NTL: 4x150 AL 770038

NTL: 4x150 AL 770039
NTL: AM 770039
Best: 4x50Cu+2x10Cu+2x2.5Cu (GPLKh) 770039

NTL: EM 05SB55
Best: 4x150Al+2x2.5Cu (VG-VMvKh-as) 770092 wordt LS 05SB55

A Best: 3x95Cu+1x70Cu+2x10Cu+2x2.5 (GPLKh) 770092 wordt LS 05SB55
NTL: 4x150 AL 770038
Z NTL: 4x150 AL 770039

A Best: 3x95Cu+1x70Cu+2x10Cu+2x2.5 (GPLKh) 770092 wordt LS 05SB55
NTL: 4x150 AL 770038
Z NTL: 4x150 AL 770039

NTL: VM 05SB55

NTP: MS-station met OV Zuidpolderweg 1 nb 0 102 663

NTL: VM 770092
Best: 3x95Cu+1x70Cu+2x10Cu+2x2.5 (GPLKh) 770092

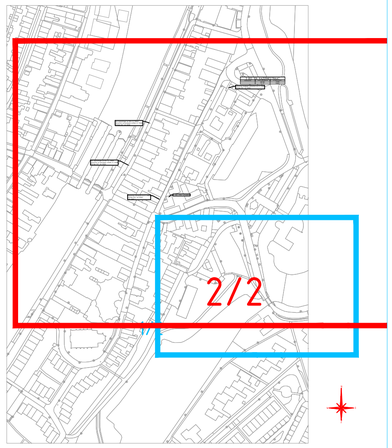

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V===
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.
- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/HS (UTN/IBBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)
- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Nutsaansluiting
- Krimpdop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

KL TGP AVP KAZERNESTRT 14b LT8 Muiden

Beheerkaart :	
Datum :	26-5-2021
Status :	Voorbereiding
Schaal :	1:500
Discipline :	E-LS
Blad nr: 2/2	Formaat: A1
CS nr:	3133000
RegioRandmeren,Veluwe,G&V - IPR	
Case nr:	248336

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Gooise Meren			
Get. : Dennis Koggel		Datum: 16-11-2021	
Wijz. A :		Datum:	Par.:
Wijz. B :		Datum:	Par.:
Wijz. C :		Datum:	Par.:
Engineer : Dennis Koggel		Tel. nr : 06-54933259	
