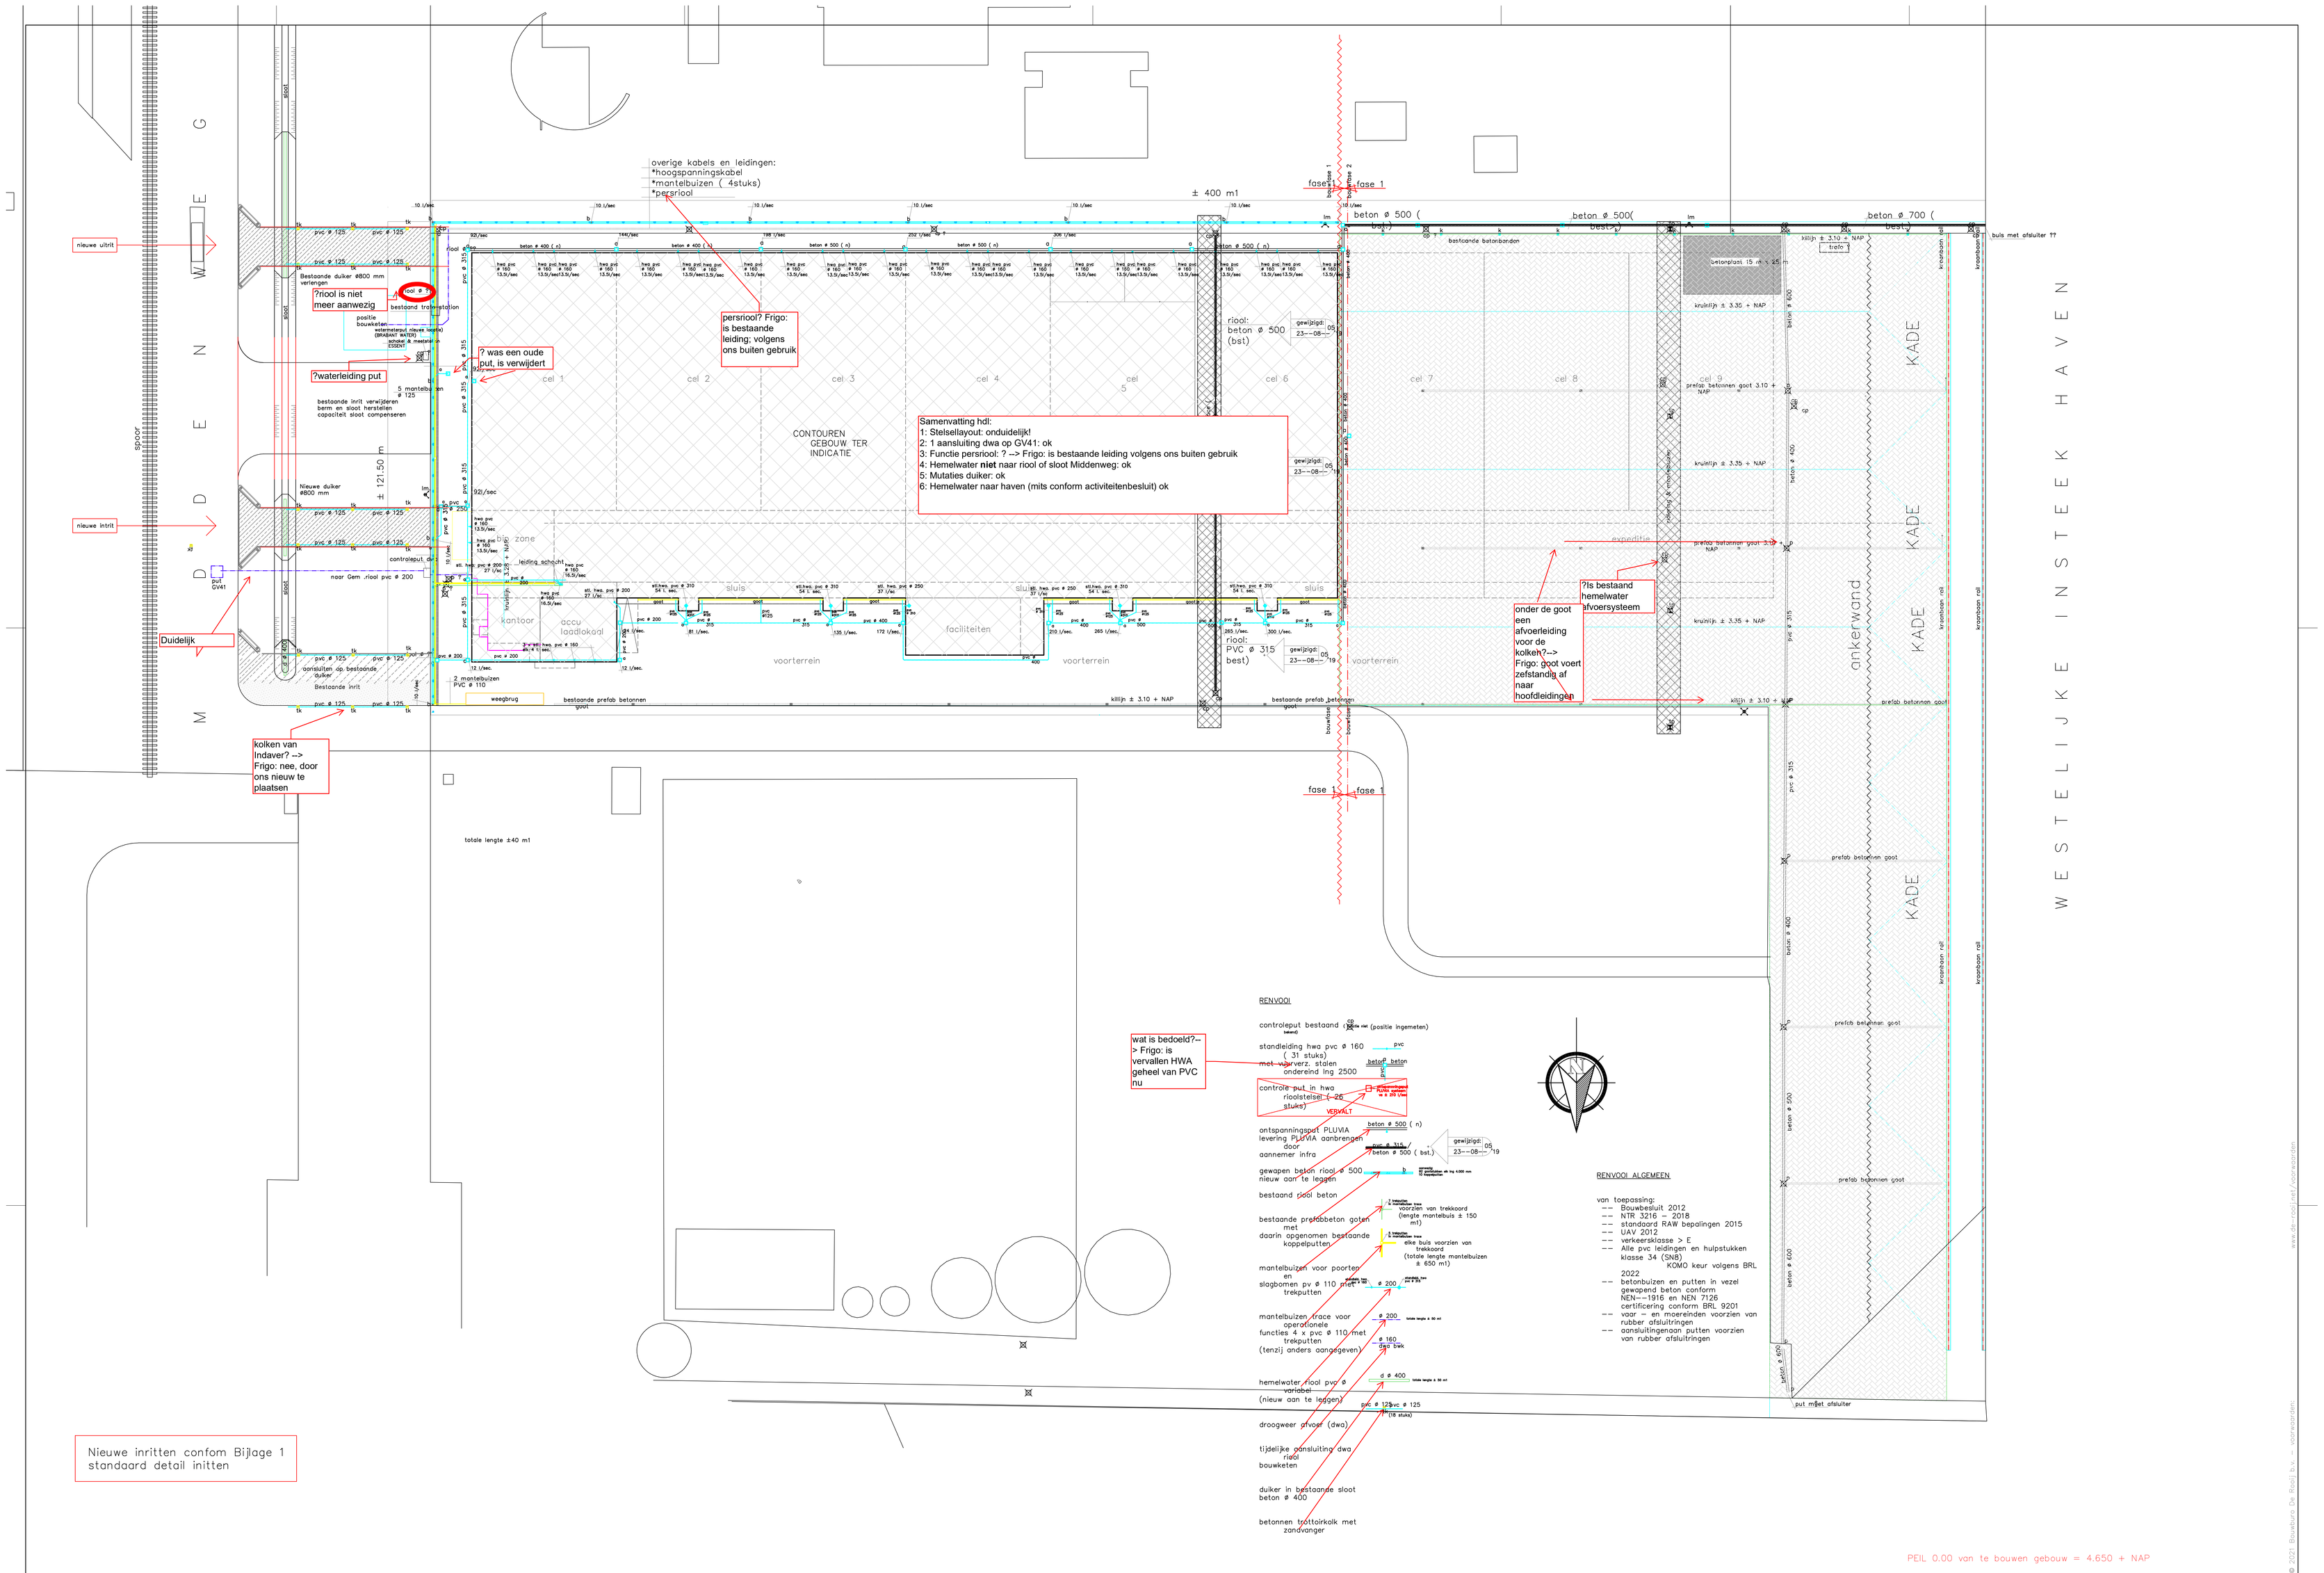
overige kabels en leidingen:
*hoogspanningskabel
*mantelbuizen (4stuks)
*persriool
persriool? Frigo: is bestaande leiding; volgens ons buiten gebruik
?riool is niet meer aanwezig
? was een oude put, is verwijdert
?waterleiding put
nieuwe uitrit
nieuwe intrit
Duidelijk
kolken van Indaver? --> Frigo: nee, door ons nieuw te plaatsen
Samenvatting hdl:
1: Stelsellayout: onduidelijk!
2: 1 aansluiting dwa op GV41: ok
3: Functie persriool: ? --> Frigo: is bestaande leiding volgens ons buiten gebruik
4: Hemelwater niet naar riool of sloot Middenweg: ok
5: Mutaties duiker: ok
6: Hemelwater naar haven (mits conform activiteitenbesluit) ok
?Is bestaand hemelwater afvoersysteem
onder de goot een afvoerleiding voor de kolken?--> Frigo: goot voert zefstandig af naar hoofdleidingen
CONTOUREN GEBOUW TER INDICATIE
cel 1
cel 2
cel 3
cel 4
cel 5
cel 6
cel 7
cel 8
cel 9
kantoor
accu laadlokaal
faciliteiten
voorterrein
sluis
KADE
ankerwand
WESTELIJKE INSTEEK HAVEN
MIDDENWEG
spoor
totale lengte ±40 m1
RENVOOI
controleput bestaand
standleiding hwa pvc ø 160 (31 stuks)
met voorverz. stalen ondereind lng 2500
wat is bedoeld?--> Frigo: is vervallen HWA geheel van PVC nu
controle put in hwa rioolstelsel (-26 stuks)
VERVALT
ontspanningsput PLUVIA levering PLUVIA aanbrengen door aannemer infra
gewapen beton riool ø 500 nieuw aan te leggen
bestaand riool beton
bestaande prefabbeton goten met daarin opgenomen bestaande koppelputten
mantelbuizen voor poorten en slagbomen pv ø 110 met trekputten
mantelbuizen trace voor operationele functies 4 x pvc ø 110 met trekputten (tenzij anders aangegeven)
hemelwater riool pvc ø variabel (nieuw aan te leggen)
droogweer afvoer (dwa)
tijdelijke aansluiting dwa riool bouwketen
duiker in bestaande sloot beton ø 400
betonnen troettoirkolk met zandvanger
RENVOOI ALGEMEEN
van toepassing:
-- Bouwbesluit 2012
-- NTR 3216 -- 2018
-- standaard RAW bepalingen 2015
-- UAV 2012
-- verkeersklasse > E
-- Alle pvc leidingen en hulpstukken klasse 34 (SN8) KOMO keur volgens BRL 2022
-- betonbuizen en putten in vezel gewapend beton conform NEN--1916 en NEN 7126 certificering conform BRL 9201
-- voor -- en moereinden voorzien van rubber afsluitringen
-- aansluitingenaan putten voorzien van rubber afsluitringen
Nieuwe inritten confom Bijlage 1 standaard detail initten
PEIL 0.00 van te bouwen gebouw = 4.650 + NAP
wijz. 05: 18-03-2022: Positie Inritten aangepast
FRIGO more than cool
raadgevend ingenieursbureau van nunen b.v.
Graafseboan 80 -- 5242 JN Rosmalen
073-5213836
www.nunen.com
bouwbureau de rooij
ontwerp constructies bouwmanagement
Tilburgseweg 3 5161 ME Sprang-Capelle
T: 0416 542828
bouwbureau@de-rooij.net
www.de-rooij.net
project: Nieuwbouw Frigo Moerdijk
aan de Middenweg te MOERDIJK
opdrachtgever: Rijnhier Vastgoed b.v.
Provincialeweg Zuid 29a
4286 LJ ALMKERK
5 18-03-2022 10
4 05-08-2021 9
3 25 -07-2021 8
2 22-07-2021 7
1 15-07-2021 6
d.d.31.03-2021
03.20.678 infra. 03.0
bestektekening prijsvorming infra
onderdeel: aangepaste ondergrondse infr rioleringen & controle putten mantelbuizen & trekputten
status: voorlopig schaal: 1:547.57
03.20.678 infra blad 03.04 gewijzigd terreinriool 01--03.dwg, laatste uitvoer: 18/03/2022 formaat: A0
© 2021 Bureaubureau De Rooij B.V. - aangepaste:
www.de-rooij.net/voorwaarden
