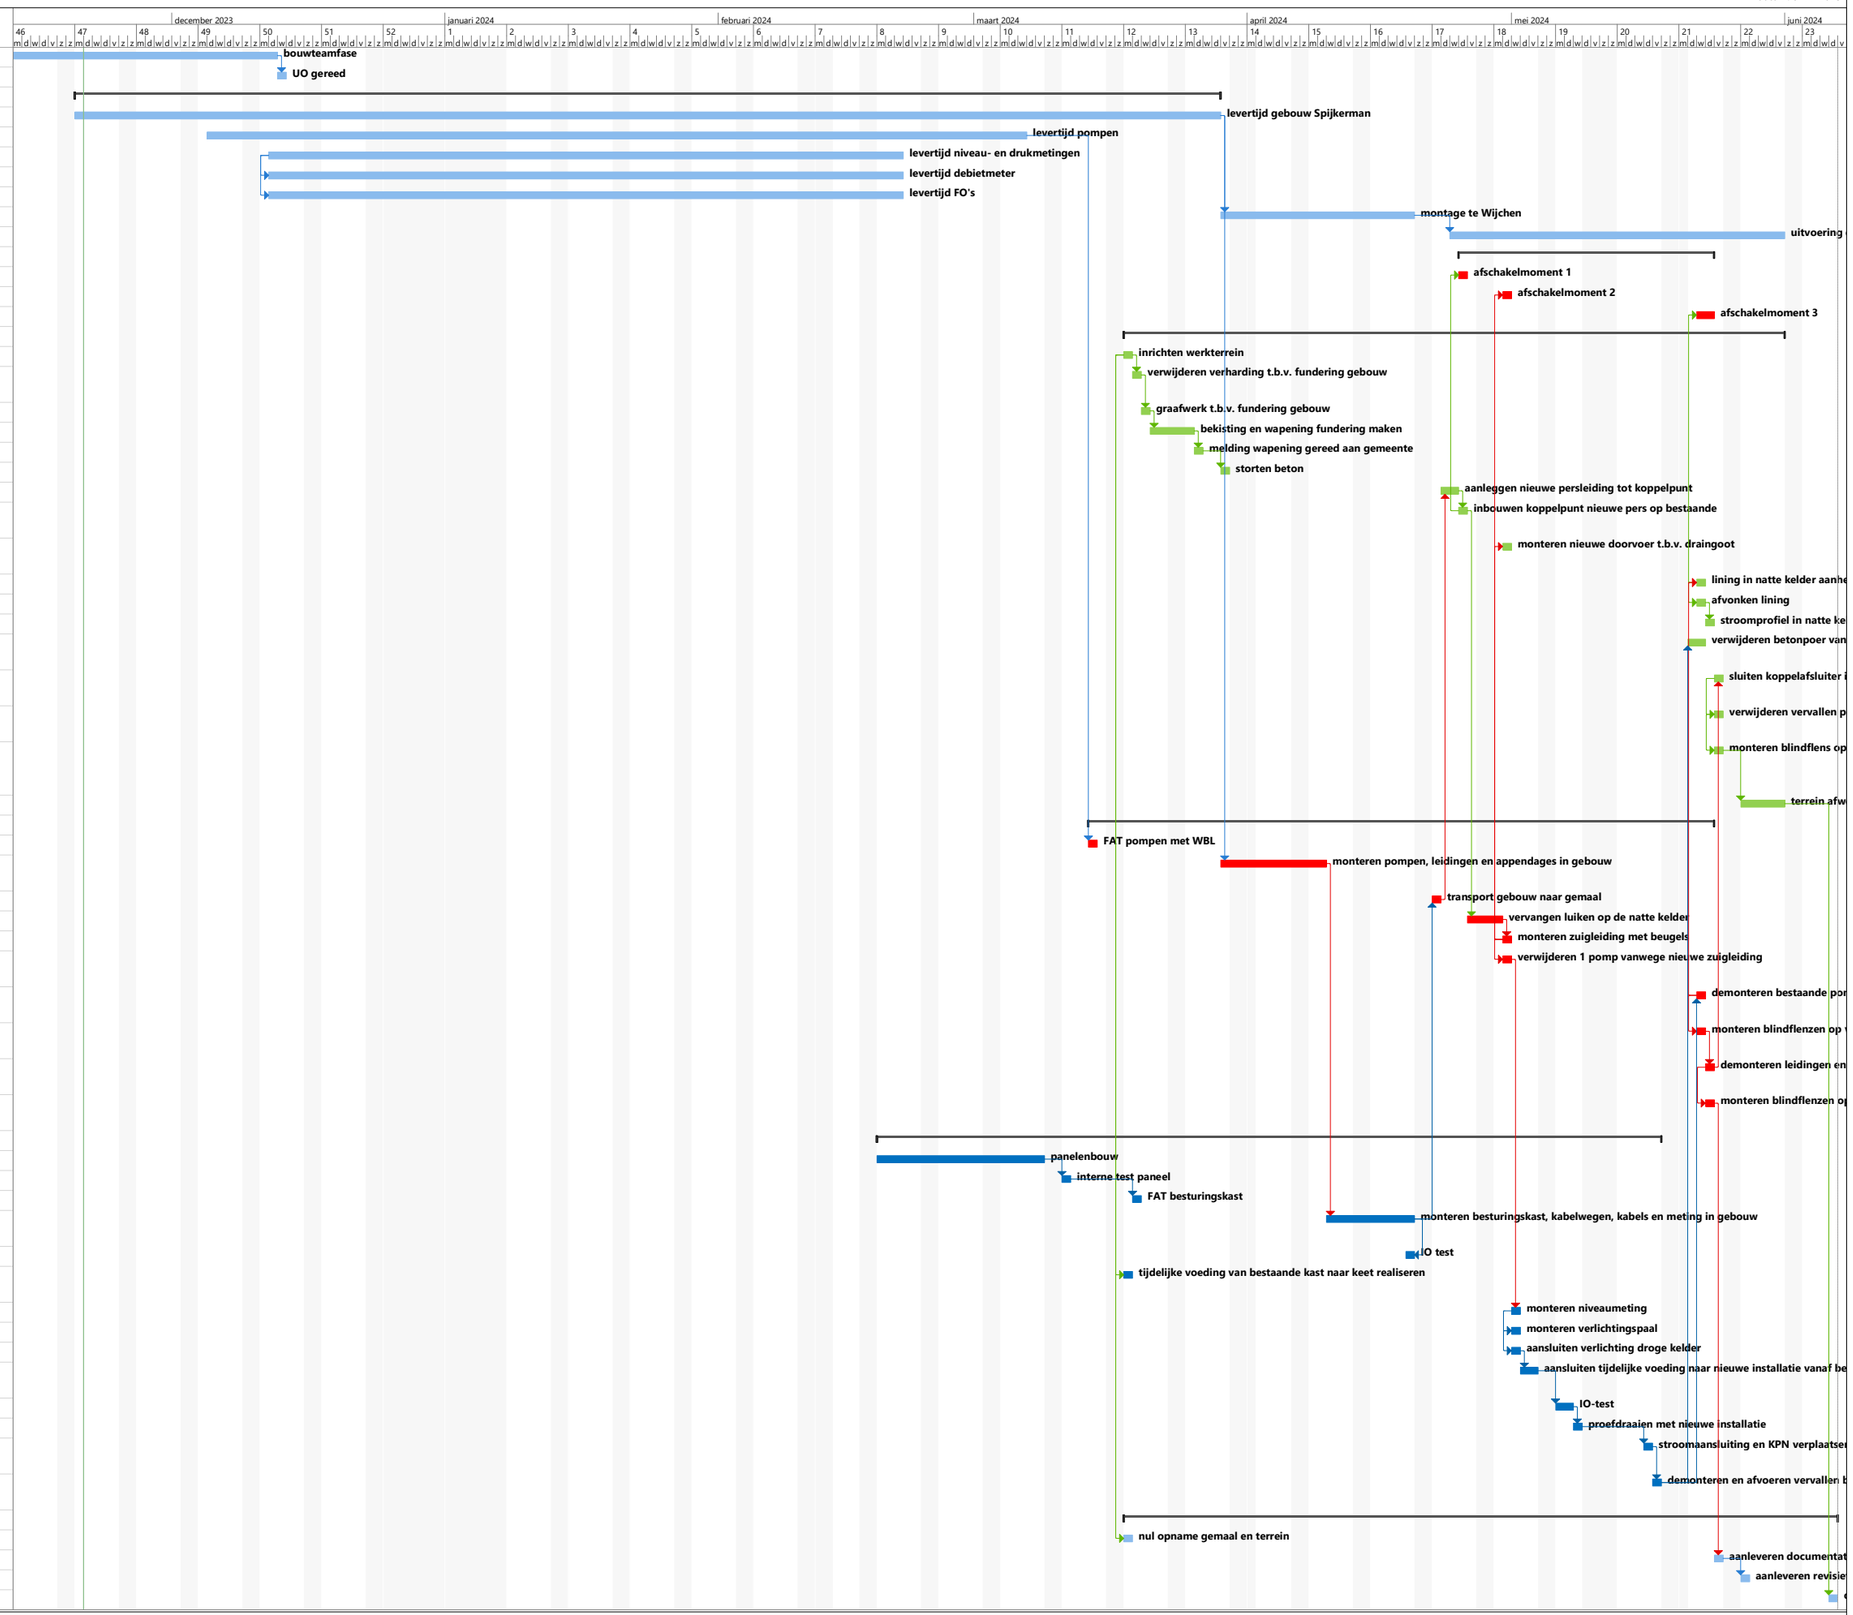Id		Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken
1		bouwteamfase	19 wkn	woe 12-7-23	din 12-12-23	
2		UO gereed	1 dag	woe 13-12-2	woe 13-12-2	1
3		**levertijden materialen**	**82 dagen**	**maa 20-11-2**	**don 28-3-24**	
4		levertijd gebouw Spijkerman	16,4 wkn	maa 20-11-2	don 28-3-24	
5		levertijd pompen	11 wkn	din 5-12-23	woe 6-3-24	
6		levertijd niveau- en drukmetingen	8 wkn	din 12-12-23	woe 21-2-24	
7		levertijd debietmeter	8 wkn	din 12-12-23	woe 21-2-24	6GB
8		levertijd FO's	8 wkn	din 12-12-23	woe 21-2-24	6GB
9		montage te Wijchen	3 wkn	vri 29-3-24	vri 19-4-24	4
10		uitvoering op locatie	5 wkn	woe 24-4-24	vri 31-5-24	9
11		**afschakelmomenten**	**18 dagen**	**don 25-4-24**	**don 23-5-24**	
12		afschakelmoment 1	1 dag	don 25-4-24	don 25-4-24	23GB
13		afschakelmoment 2	1 dag	din 30-4-24	din 30-4-24	38GB
14		afschakelmoment 3	2 dagen	woe 22-5-24	don 23-5-24	25GB
15		**bouwkundig/civiel**	**51 dagen**	**maa 18-3-24**	**vri 31-5-24**	
16		inrichten werkterrein	1 dag	maa 18-3-24	maa 18-3-24	
17		verwijderen verharding t.b.v. fundering gebouw	1 dag	din 19-3-24	din 19-3-24	16
18		graafwerk t.b.v. fundering gebouw	1 dag	woe 20-3-24	woe 20-3-24	17
19		bekisting en wapening fundering maken	3 dagen	don 21-3-24	maa 25-3-24	18
20		melding wapening gereed aan gemeente	1 dag	din 26-3-24	din 26-3-24	19
21		storten beton	1 dag	vri 29-3-24	vri 29-3-24	20BE+2 dagen
22		aanleggen nieuwe persleiding tot koppelpunt	2 dagen	din 23-4-24	woe 24-4-24	36
23		inbouwen koppelpunt nieuwe pers op bestaande	1 dag	don 25-4-24	don 25-4-24	22
24		monteren nieuwe doorvoer t.b.v. draingoot	1 dag	din 30-4-24	din 30-4-24	38GB
25		lining in natte kelder aanhelen en repareren	1 dag	woe 22-5-24	woe 22-5-24	40GB
26		afvonken lining	1 dag	woe 22-5-24	woe 22-5-24	25GB
27		stroomprofiel in natte kelder aanpassen	1 dag	don 23-5-24	don 23-5-24	26
28		verwijderen betonpoer van oude besturingskast	2 dagen	din 21-5-24	woe 22-5-24	58
29		sluiten koppelafsluiter in ondergrondse persleiding	1 dag	vri 24-5-24	vri 24-5-24	42
30		verwijderen vervallen persleiding in de grond tot muurdoorvoer	1 dag	vri 24-5-24	vri 24-5-24	29GB
31		monteren blindflens op muurdoorvoer naar droge kelder en op muurdoorvoer leegloop naar natte kelder	1 dag	vri 24-5-24	vri 24-5-24	30GB
32		terrein afwerken incl bestrating	5 dagen	maa 27-5-24	vri 31-5-24	31
33		**werktuigbouwkundig**	**47 dagen**	**don 14-3-24**	**don 23-5-24**	
34		FAT pompen met WBL	1 dag	don 14-3-24	don 14-3-24	5BE+5 dagen
35		monteren pompen, leidingen en appendages in gebouw	7 dagen	vri 29-3-24	din 9-4-24	4
36		transport gebouw naar gemaal	1 dag	maa 22-4-24	maa 22-4-24	48
37		vervangen luiken op de natte kelder	2 dagen	vri 26-4-24	maa 29-4-24	23
38		monteren zuigleiding met beugels	1 dag	din 30-4-24	din 30-4-24	37
39		verwijderen 1 pomp vanwege nieuwe zuigleiding	1 dag	din 30-4-24	din 30-4-24	38GB
40		demonteren bestaande pompen, voetbochten en leidingen in natte kelder	1 dag	woe 22-5-24	woe 22-5-24	58BE+1 dag
41		monteren blindflenzen op vervallen muurdoorvoeren in natte kelder	1 dag	woe 22-5-24	woe 22-5-24	40GB
42		demonteren leidingen en appendages in droge kelder	1 dag	don 23-5-24	don 23-5-24	41
43		monteren blindflenzen op vervallen muurdoorvoeren	1 dag	don 23-5-24	don 23-5-24	42GB
44		**electrotechnisch**	**62 dagen?**	**maa 19-2-24**	**vri 17-5-24**	
45		panelenbouw	3 wkn	maa 19-2-24	vri 8-3-24	
46		interne test paneel	1 dag	maa 11-3-24	maa 11-3-24	45
47		FAT besturingskast	1 dag	din 19-3-24	din 19-3-24	46BE+5 dagen
48		monteren besturingskast, kabelwegen, kabels en meting in gebouw	8 dagen	woe 10-4-24	vri 19-4-24	35
49		IO test	1 dag?	vri 19-4-24	vri 19-4-24	48GE
50		tijdelijke voeding van bestaande kast naar keet realiseren	1 dag	maa 18-3-24	maa 18-3-24	16GB
51		monteren niveaumeting	1 dag	woe 1-5-24	woe 1-5-24	39
52		monteren verlichtingspaal	1 dag	woe 1-5-24	woe 1-5-24	51GB
53		aansluiten verlichting droge kelder	1 dag	woe 1-5-24	woe 1-5-24	52GB
54		aansluiten tijdelijke voeding naar nieuwe installatie vanaf bestaande kast	2 dagen	don 2-5-24	vri 3-5-24	53
55		IO-test	2 dagen	maa 6-5-24	din 7-5-24	54
56		proefdraaien met nieuwe installatie	1 dag	woe 8-5-24	woe 8-5-24	55
57		stroomaansluiting en KPN verplaatsen naar nieuwe gebouw	1 dag	don 16-5-24	don 16-5-24	56BE+3 dagen
58		demonteren en afvoeren vervallen besturingskast	1 dag	vri 17-5-24	vri 17-5-24	57
59		**algemeen**	**55 dagen**	**maa 18-3-24**	**don 6-6-24**	
60		nul opname gemaal en terrein	1 dag	maa 18-3-24	maa 18-3-24	16GB
61		aanleveren documentatie	1 dag	vri 24-5-24	vri 24-5-24	43
62		aanleveren revisietekeningen	1 dag	maa 27-5-24	maa 27-5-24	61
63		oplevering	1 dag	don 6-6-24	don 6-6-24	32BE+3 dagen
