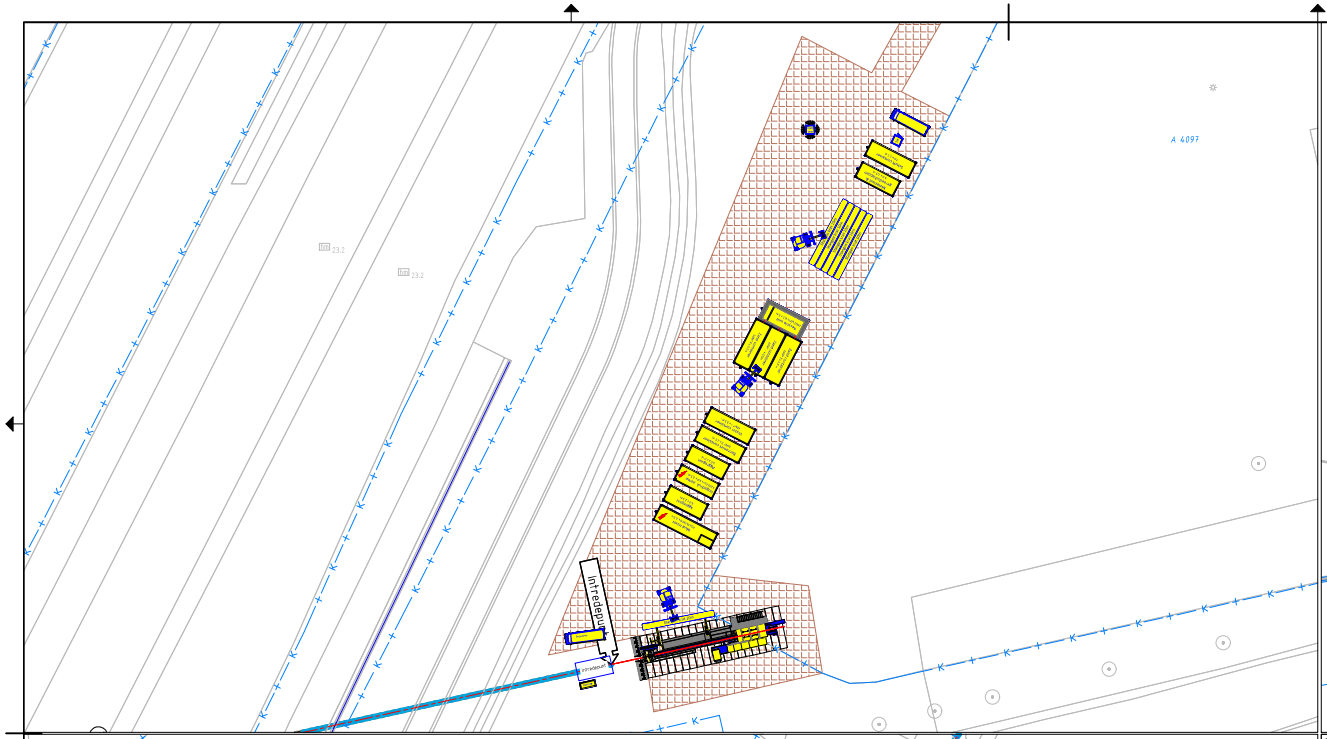
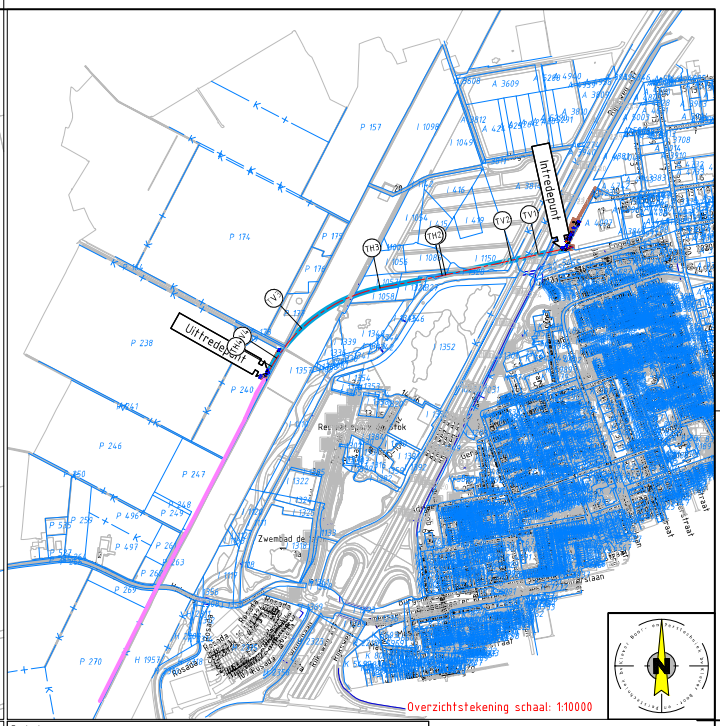
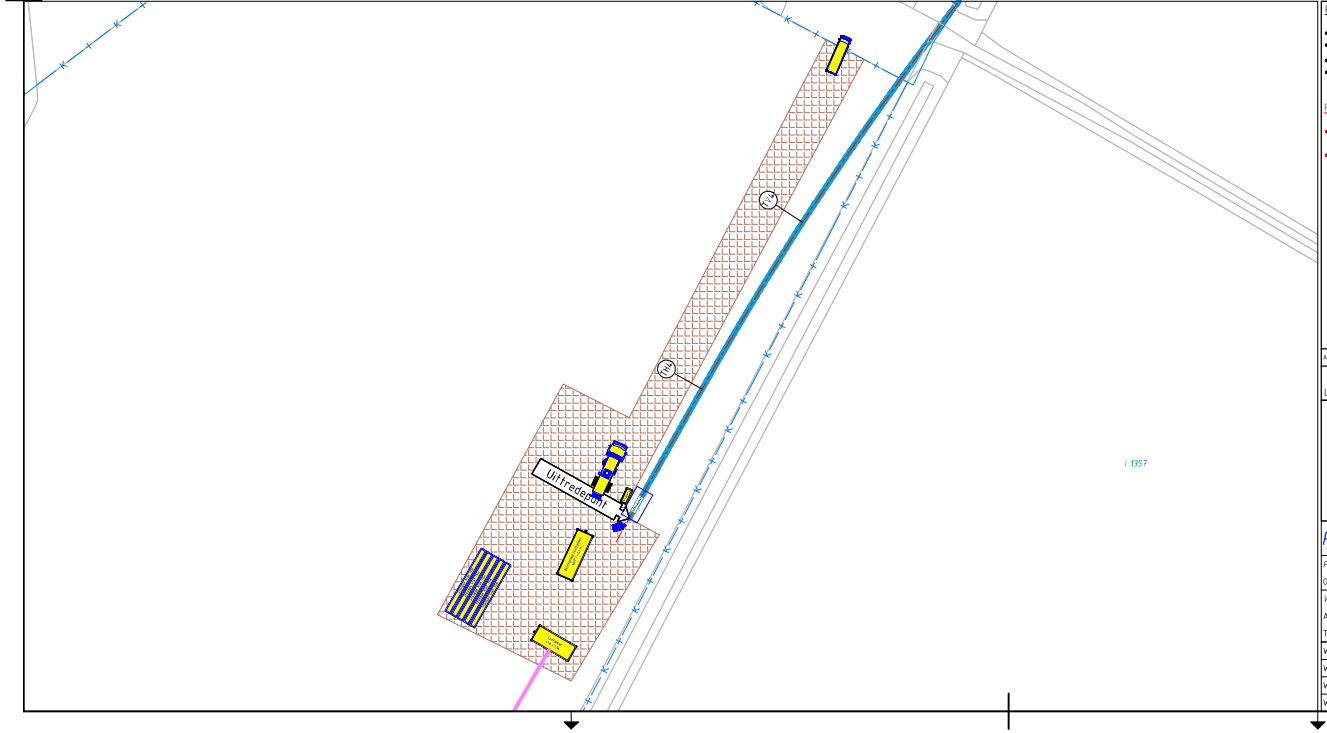



Project gegevens:

- Nabij ITP ~2800m² rijplaten aanbrengen.
- Nabij UTP ~1200m² rijplaten aanbrengen
- Verkeersplan benodigd | Ja
- Rondom ITP en UTP bouwhekken plaatsen.

Risico en aandachtspunten:

- Uitlegstrook kruist Heirweg. Weg afsluiten tijdens de werkzaamheden. Kranen inzetten om de weg open te houden als deze niet dicht mag.
- Aanrijroute naar ITP via Rechtzaad 12 te Roosendaal. Aanrijroute naar het UTP via Hogeweg.

Legenda:

- Boorlijn
- Bestaande Boring
- Hartlijn
- Hulp (zicht) lijn
- Uitleggen buis
- Intrekken buis
- Retour leiding
- Kadasterlijn
- Topografie
- Werkruimte
- Veiligheidsgebied
- Rijplaten staal

| Ontwerp akkoord voor oplevering: | Paraaf akkoord |
|---|---|
| Uitvoerder | |

Alleen tekeningen in pdf formaat die van een stempel met datum en handtekening zijn voorzien zullen bij opdracht tot uitvoering van het project in behandeling worden genomen.

Lengte Boring: n.v.t. m

Klever Boor- en Perstechniek
Bovenend Noordzijde 84c
3445 AK Benschop
0348-554906 info@kleverbv.nl www.kleverbv.nl

infront

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever | Infront |
| Proj. nr. opdrg | n.n.b. |

| | |
|---|---|
| Project nr. | 260084.04 |
| Meet methode | Gyrotool |
| Inzet boor rig | PD235/90 235 tonner |
| Klic nr. | n.v.t. |
| Belang bij: | RWS; LSNed; gem. Roosendaal |
| Formaat | A2 |
| Schaal | Zie Tek. |
| Blad | 1/1 |
| Datum | 16-04-2026 |
| Par. Contrete | |
| Getekend | |
| Gecontroleerd | |
| Status | Terrein Indeling Ontwerp |
| Tekening nr. | 260084.04-TI-A |

# PLANTEKENING/VERGUNNINGSAANVRAAG

Project:
Opstelltekening gestuurde boring HDD04 t.b.v. MS-tracé.

| Werklocatie Intrede: | Werklocatie Uittrede: |
|---|---|
| A17 t.h.v. hm 23.3 | Hogeweg |
| Te Roosendaal | Te Roosendaal |

| Wijziging | | | |
|---|---|---|---|
| Wijziging | | | |
| Wijziging | | | |
| Wijziging | | | |
