33031 Broekhuizenvorst-Meerlo vervanging rioolwatertransportleiding

Planning Leidingvak E (Ontwerp)

waterschap limburg
met de omgeving, voor de omgeving

heijmans
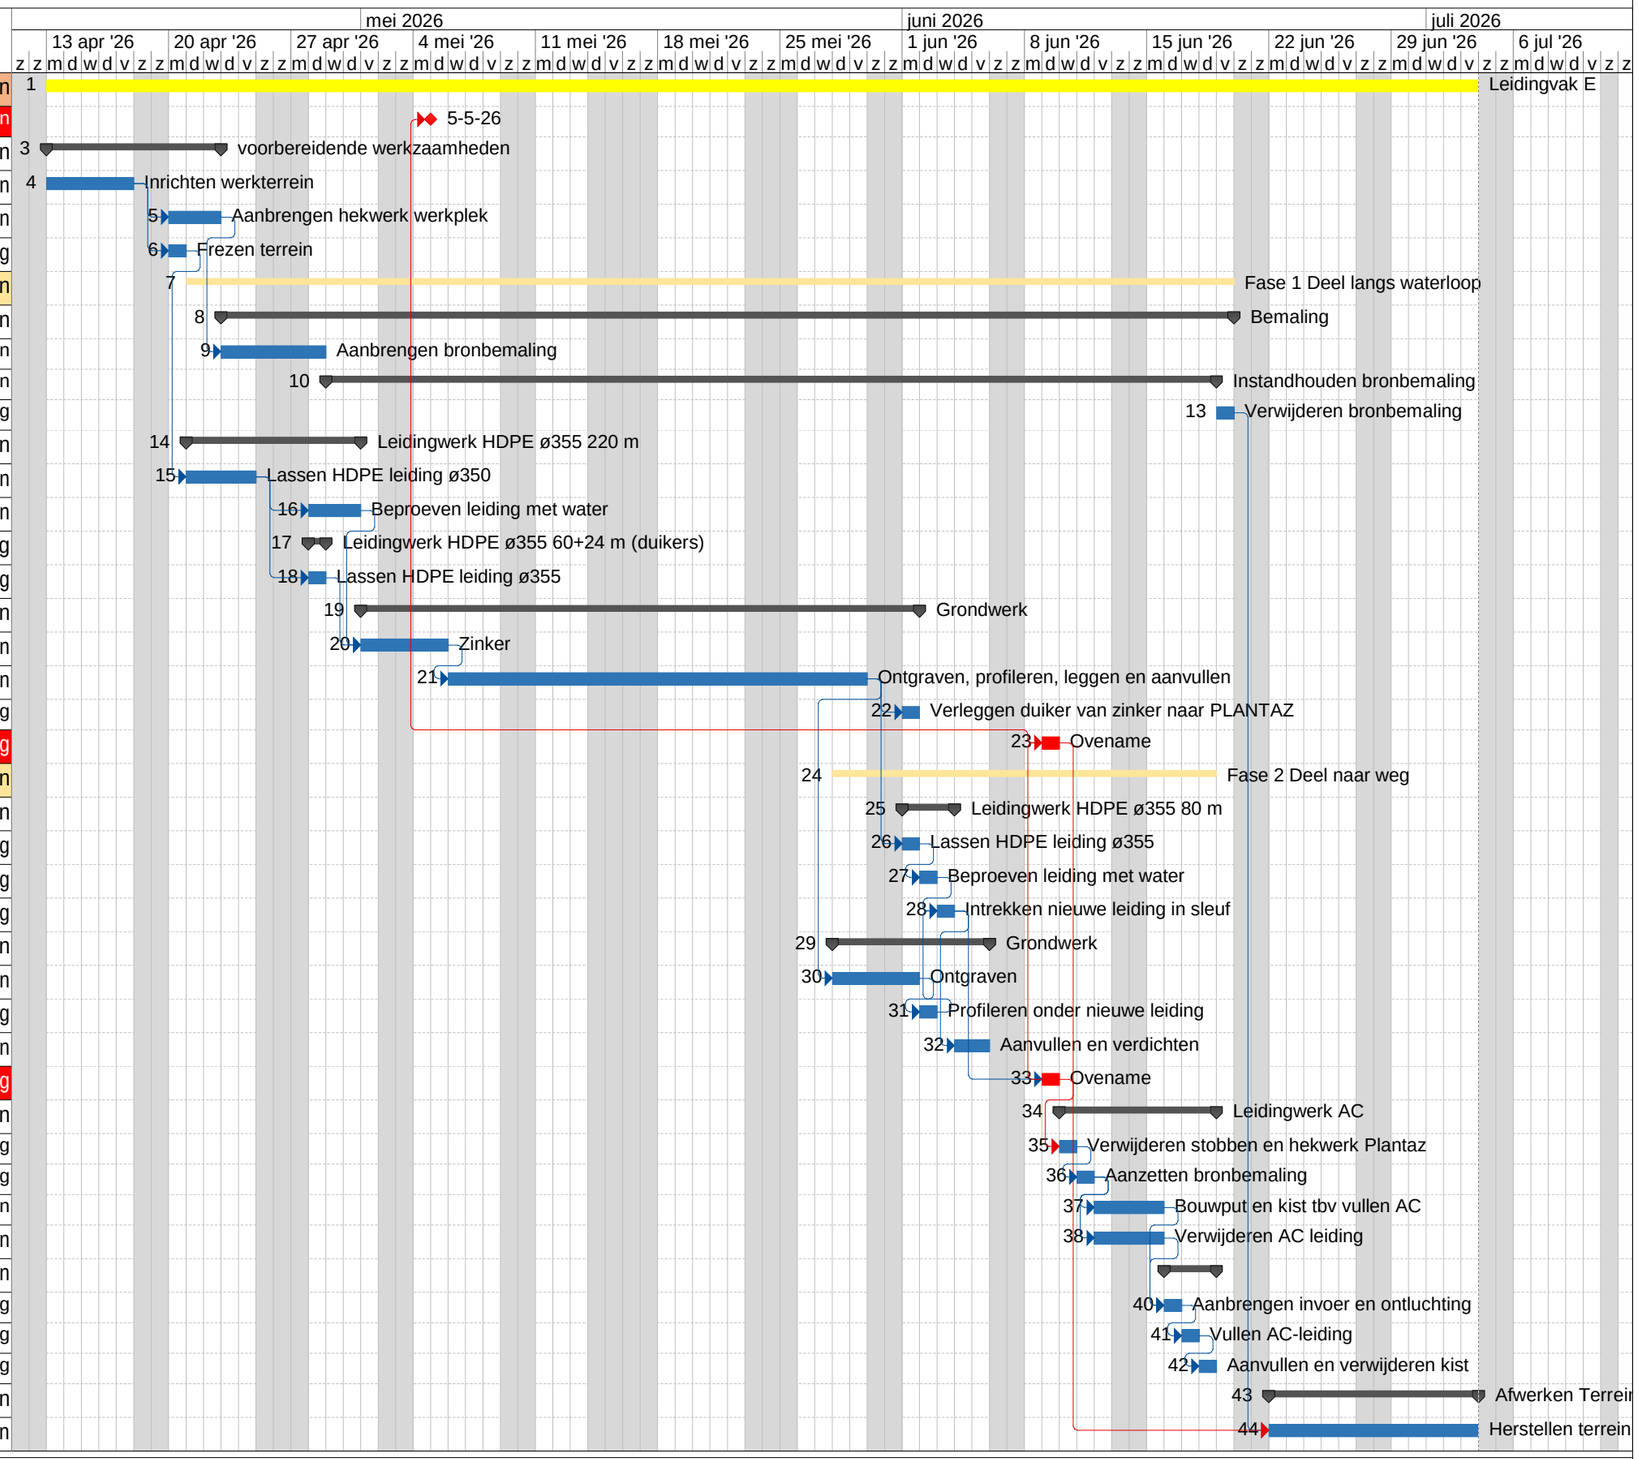
Id	Taaknaam	Begin datum	Eind datum	Duur
1	Leidingvak E	13-4-26	3-7-26	56 dagen
2	Aanvraag overname	5-5-26	5-5-26	0 dagen
3	voorbereidende werkzaamheden	13-4-26	22-4-26	8 dagen
4	Inrichten werkterrein	13-4-26	17-4-26	5 dagen
5	Aanbrengen hekwerk werkplek	20-4-26	22-4-26	3 dagen
6	Frezen terrein	20-4-26	20-4-26	1 dag
7	Fase 1 Deel langs waterloop	21-4-26	19-6-26	40 dagen
8	Bemaling	23-4-26	19-6-26	38 dagen
9	Aanbrengen bronbemaling	23-4-26	28-4-26	3 dagen
10	Instandhouden bronbemaling	29-4-26	18-6-26	34 dagen
13	Verwijderen bronbemaling	19-6-26	19-6-26	1 dag
14	Leidingwerk HDPE ø355 220 m	21-4-26	30-4-26	7 dagen
15	Lassen HDPE leiding ø350	21-4-26	24-4-26	4 dagen
16	Beproeven leiding met water	28-4-26	30-4-26	3 dagen
17	Leidingwerk HDPE ø355 60+24 m (duikers)	28-4-26	28-4-26	1 dag
18	Lassen HDPE leiding ø355	28-4-26	28-4-26	1 dag
19	Grondwerk	1-5-26	1-6-26	19 dagen
20	Zinker	1-5-26	5-5-26	3 dagen
21	Ontgraven, profileren, leggen en aanvullen	6-5-26	29-5-26	15 dagen
22	Verleggen duiker van zinker naar PLANTAZ	1-6-26	1-6-26	1 dag
23	Ovename	9-6-26	9-6-26	1 dag
24	Fase 2 Deel naar weg	28-5-26	18-6-26	16 dagen
25	Leidingwerk HDPE ø355 80 m	1-6-26	3-6-26	3 dagen
26	Lassen HDPE leiding ø355	1-6-26	1-6-26	1 dag
27	Beproeven leiding met water	2-6-26	2-6-26	1 dag
28	Intrekken nieuwe leiding in sleuf	3-6-26	3-6-26	1 dag
29	Grondwerk	28-5-26	5-6-26	7 dagen
30	Ontgraven	28-5-26	1-6-26	3 dagen
31	Profileren onder nieuwe leiding	2-6-26	2-6-26	1 dag
32	Aanvullen en verdichten	4-6-26	5-6-26	2 dagen
33	Ovename	9-6-26	9-6-26	1 dag
34	Leidingwerk AC	10-6-26	18-6-26	7 dagen
35	Verwijderen stobben en hekwerk Plantaz	10-6-26	10-6-26	1 dag
36	Aanzetten bronbemaling	11-6-26	11-6-26	1 dag
37	Bouwput en kist tbv vullen AC	12-6-26	15-6-26	2 dagen
38	Verwijderen AC leiding	12-6-26	15-6-26	2 dagen
39	Vullen AC	16-6-26	18-6-26	3 dagen
40	Aanbrengen invoer en ontluchting	16-6-26	16-6-26	1 dag
41	Vullen AC-leiding	17-6-26	17-6-26	1 dag
42	Aanvullen en verwijderen kist	18-6-26	18-6-26	1 dag
43	Afwerken Terrein	22-6-26	3-7-26	10 dagen
44	Herstellen terrein	22-6-26	3-7-26	2 wkn
