Concept planning aanleg bovenafdichting Hydrostab Dak van Drenthe

Versie 6

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Vergunningverlening**	**40 dagen**	**vri 25-3-22**	**don 19-5-22**
2	Indiening bestek + PVA proefveld	1 dag	vri 25-3-22	vri 25-3-22
3	Beoordeling bestek + PVA	2 mndn	vri 25-3-22	don 19-5-22
4	**Vooronderzoek**	**90 dagen**	**maa 4-4-22**	**vri 5-8-22**
5	Vooronderzoek	90 dagen	maa 4-4-22	vri 5-8-22
6	**Aanbestedingstraject**	**70 dagen**	**vri 25-3-22**	**don 30-6-22**
7	Prijsvorming Boskalis	10 wkn	vri 25-3-22	don 2-6-22
8	Gunning	2 wkn	vri 3-6-22	don 16-6-22
9	Administratieve voorbereiding	2 wkn	vri 17-6-22	don 30-6-22
10	**Aanleg proefveld**	**197 dagen**	**maa 16-5-22**	**din 14-2-23**
11	Opbouw menginstallatie	3 mndn	maa 16-5-22	vri 5-8-22
12	Aanleg proefveld	1 wk	maa 8-8-22	vri 12-8-22
13	Onderzoeken	90 dagen	maa 15-8-22	vri 16-12-22
14	STOPPUNT Besluitvorming Provin	8,4 wkn	maa 19-12-22	din 14-2-23
15	**Winterstop 2022**	**90 dagen**	**din 1-11-22**	**maa 6-3-23**
16	**Realisatie fase 1 (ca. 9 Ha)**	**172 dagen**	**din 7-3-23**	**woe 1-11-23**
17	Voorbereidend grondwerk	6 wkn	din 7-3-23	maa 17-4-23
18	Aanleg Hydrostab	15 wkn	din 18-4-23	maa 31-7-23
19	Aanleg folie	15 wkn	din 2-5-23	maa 14-8-23
20	Aanleg drainagelaag	15 wkn	don 4-5-23	woe 16-8-23
21	Aanbrengen afdeklaag	18 wkn	don 4-5-23	woe 6-9-23
22	Aanbrengen onderbouw fietspad	18 wkn	don 1-6-23	woe 4-10-23
23	Aanleg leidingwerk waterafvoer	6 wkn	don 24-8-23	woe 4-10-23
24	Inzaaien, opruimen etc.	4 wkn	don 5-10-23	woe 1-11-23
25	**Winterstop 2023**	86 dagen	maa 6-11-23	maa 4-3-24
26	**Realisatie fase 2 (ca. 6,6 Ha)**	**157 dagen**	**din 5-3-24**	**woe 9-10-24**
27	Voorbereidend grondwerk	6 wkn	din 5-3-24	maa 15-4-24
28	Aanleg Hydrostab	12 wkn	din 16-4-24	maa 8-7-24
29	Aanleg folie	12 wkn	din 30-4-24	maa 22-7-24
30	Aanleg drainagelaag	12 wkn	don 2-5-24	woe 24-7-24
31	Aanbrengen afdeklaag	15 wkn	don 2-5-24	woe 14-8-24
32	Aanbrengen onderbouw fietspad	15 wkn	don 2-5-24	woe 14-8-24
33	Aanleg leidingwerk waterafvoer	6 wkn	don 1-8-24	woe 11-9-24
34	Inzaaien, opruimen etc.	4 wkn	don 12-9-24	woe 9-10-24

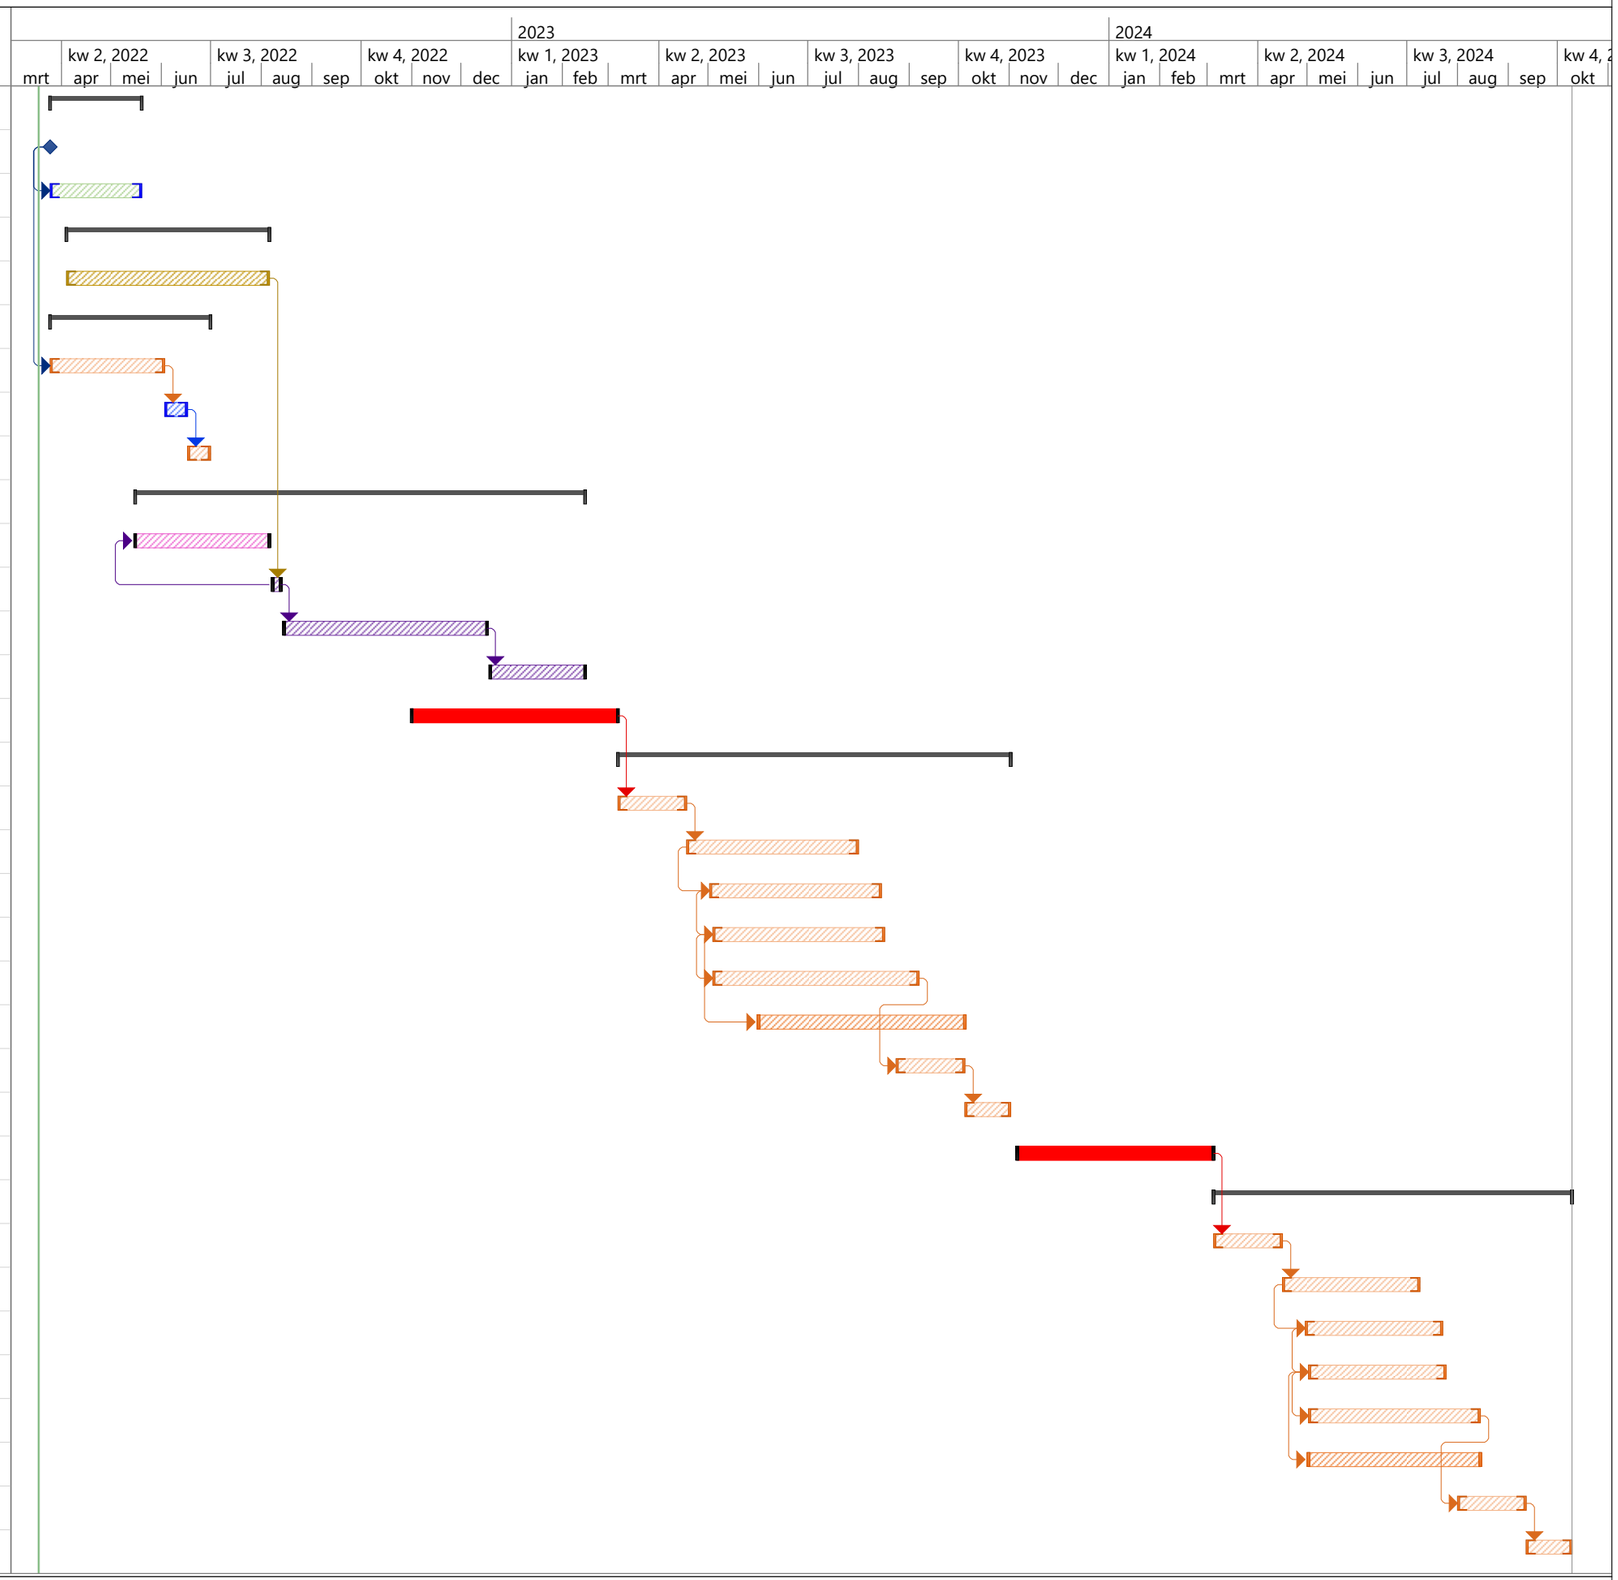

Auteur: [redacted]

Datum: 18-3-2022
