



Figuur 1.1: Overzicht fasering



Figuur 1.2: Overzicht hoofdomleidingen en adviesroutes

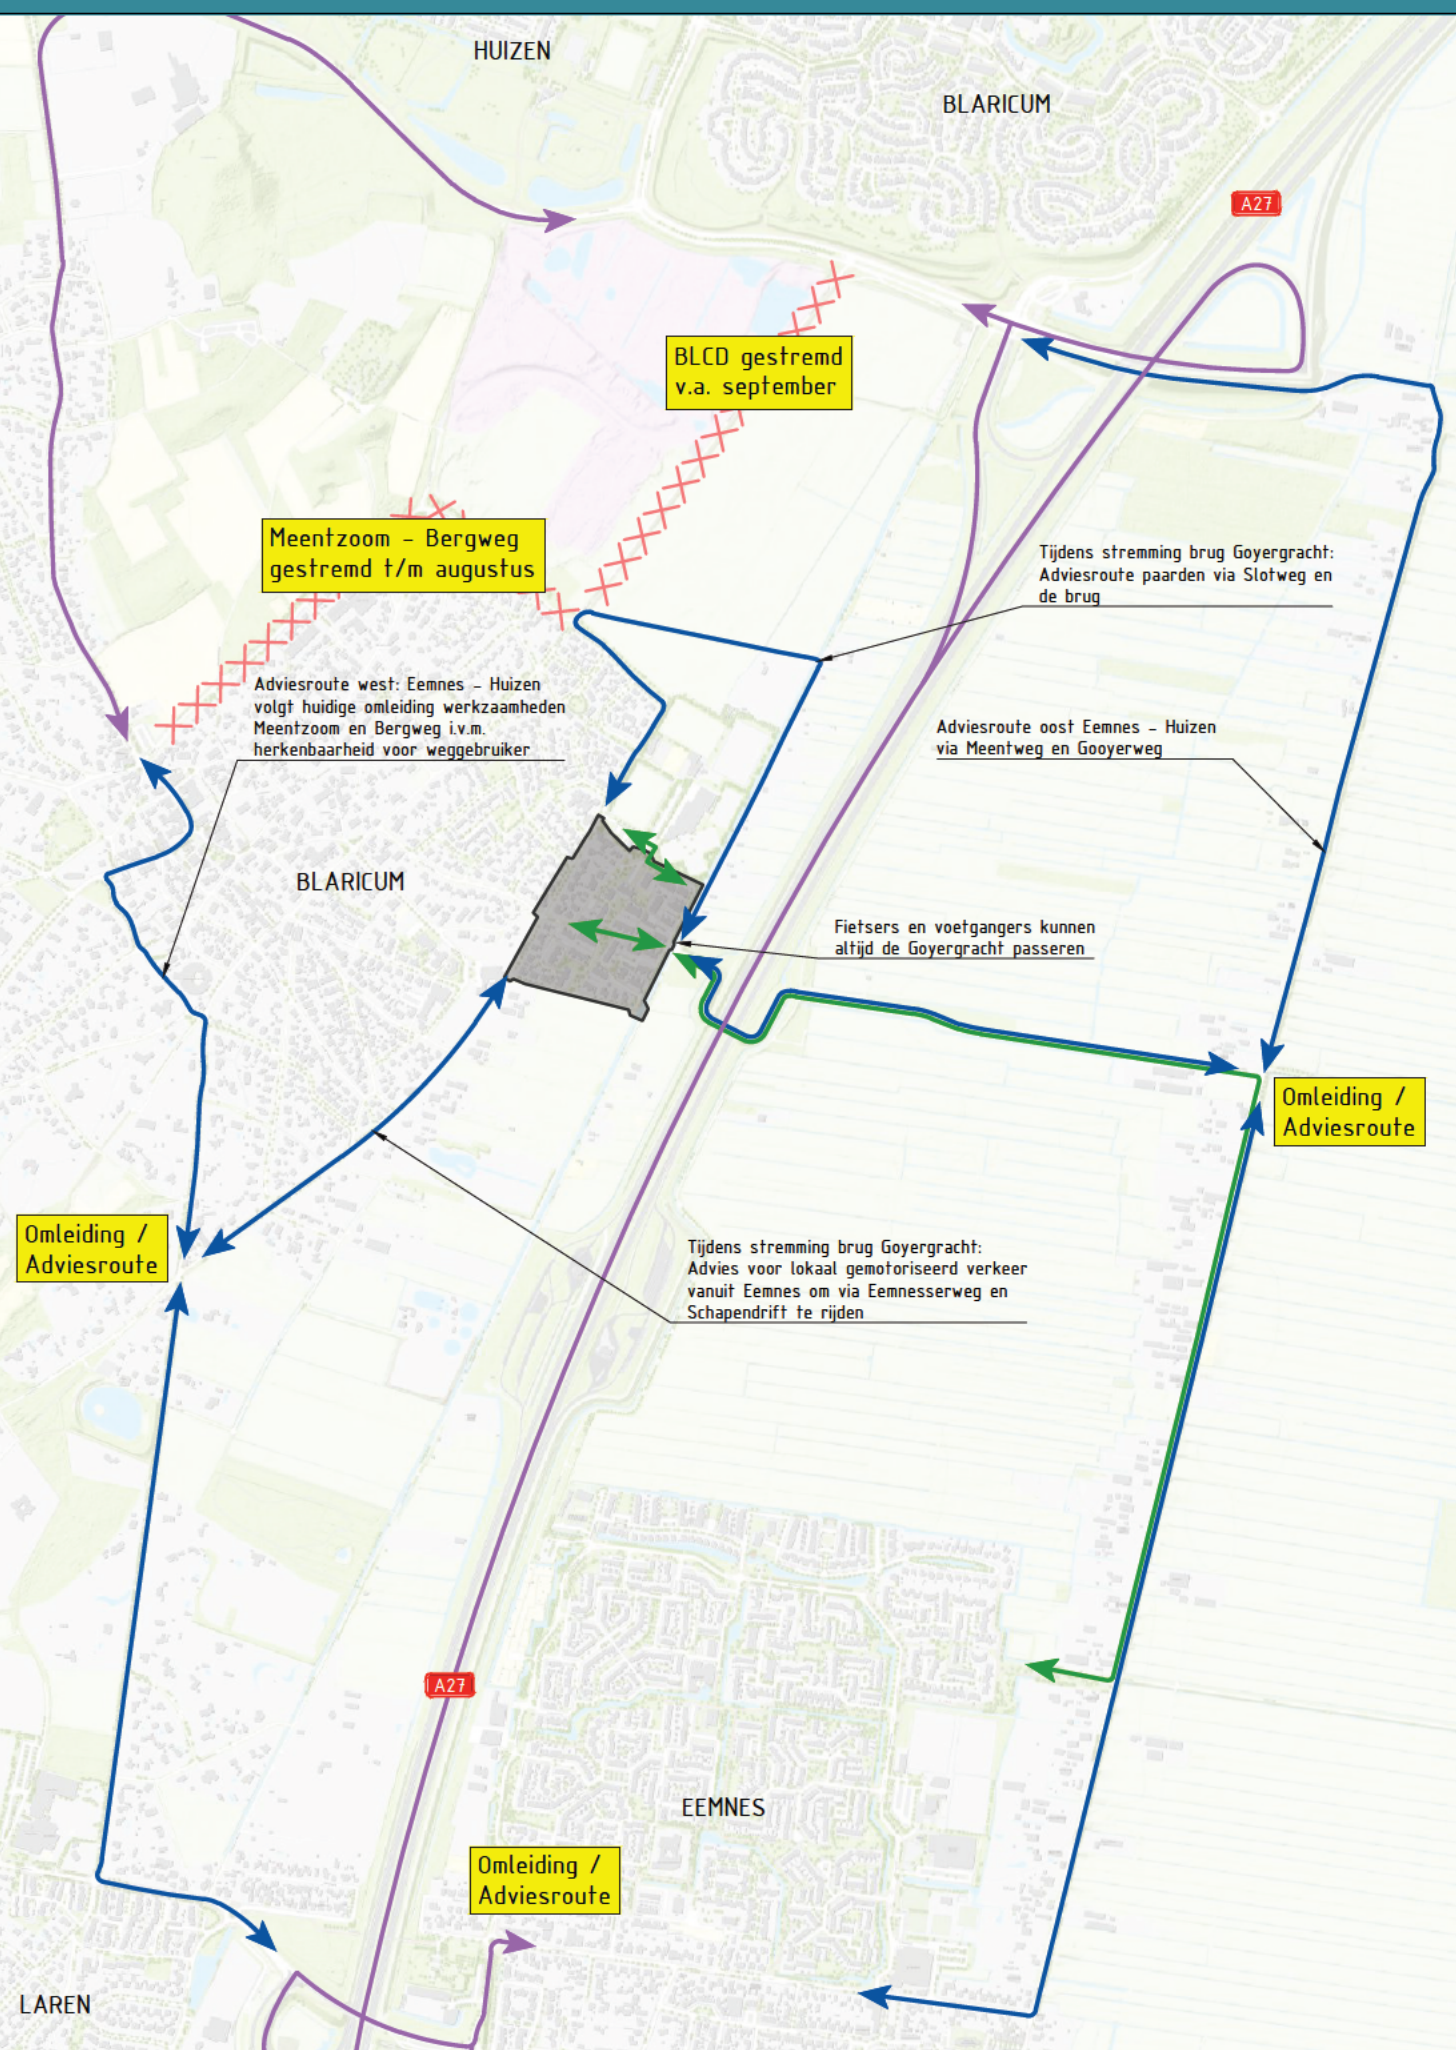

Figuur 1.3: Inrichting depotlocatie in weiland Paul Borsen

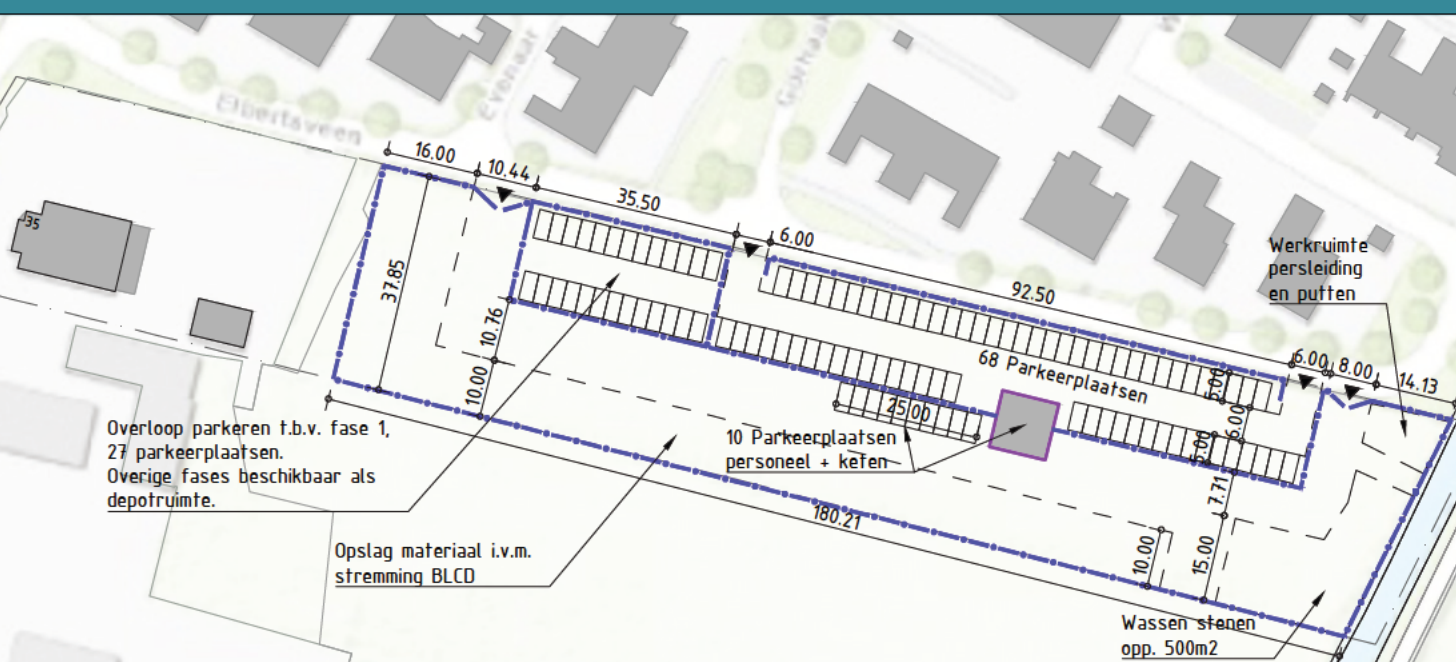


FASE V - Voorbereidingsfase

14 - 25 april 2025
2 weken

Legenda

- 01 Werkvak
- Bestaande situatie
- Uitvoeren werkzaamheden
- Werkzaamheden derden
- Werkzaamheden gereed
- Route fietsers
- Route doorgaand genotoriseerd verkeer
- Route bestemmingsverkeer
- Hoofdroute werkverkeer

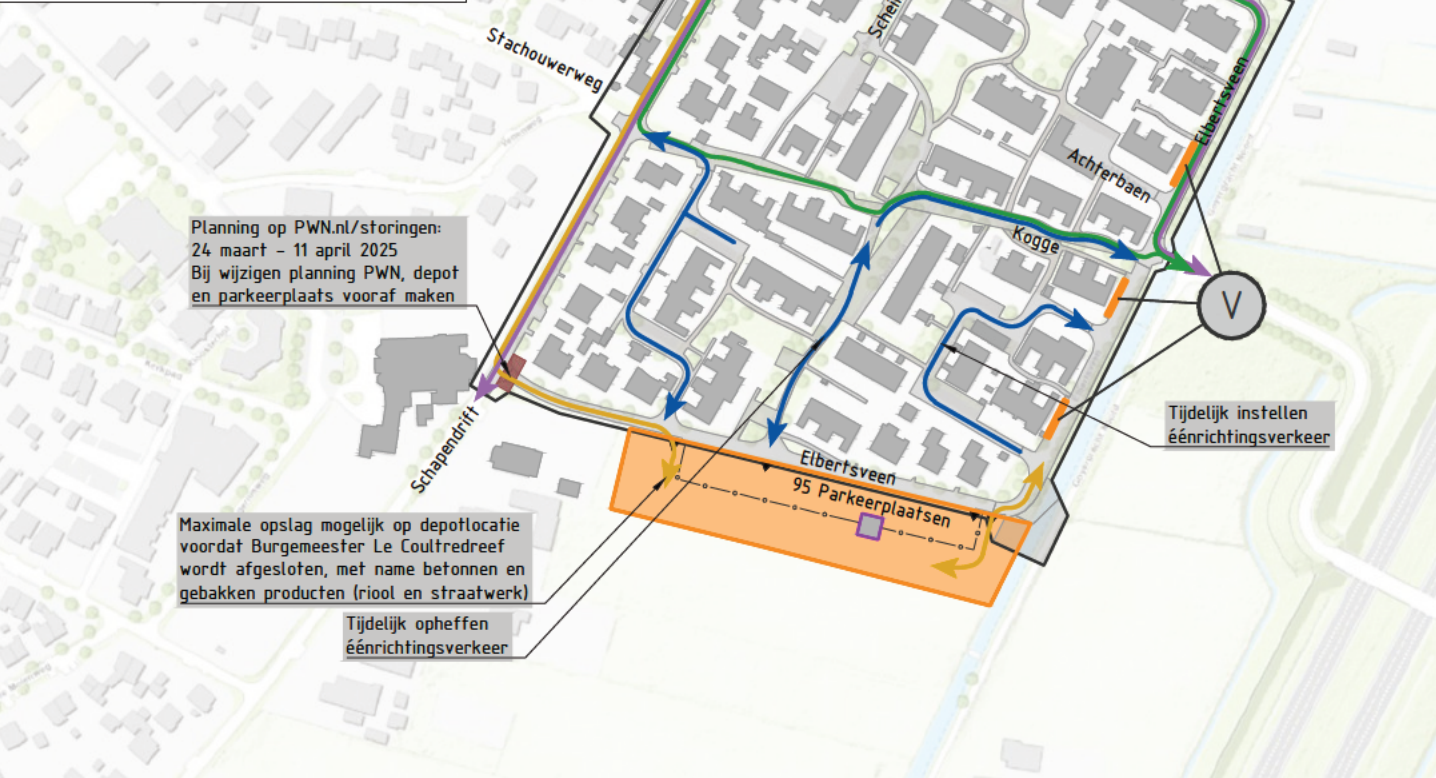

FASE I - Woonstraten noordzijde

22 april - 25 juli 2025
14 weken



FASE P+O1 - Persleiding en eerste overstortput (nr. 1744)

16 juni - 4 juli 2025
3 weken

Werkzaamheden 01 moeten gereed voor start fase 2 i.v.m. veilige ontsluitingsroute



FASE 2 - Elbertsveen noordzijde van de brug

14 juli - 19 september 2025
10 weken



FASE 3 - Evenaar en Oosthout

8 september - 22 oktober 2025
7 weken



FASE 4 - Elbertsveen zuid richting Schapendrift

6 oktober - 9 december 2025
10 weken

Fase kan pas starten na afronden fase P+O1, persleiding en eerste overstortput




FASE 5 - Schapendrift

5 januari - 6 februari 2026
5 weken



FASE 6 - Kogge en Rongen incl. kruispunt voor brug

26 januari - 13 maart 2026
7 weken

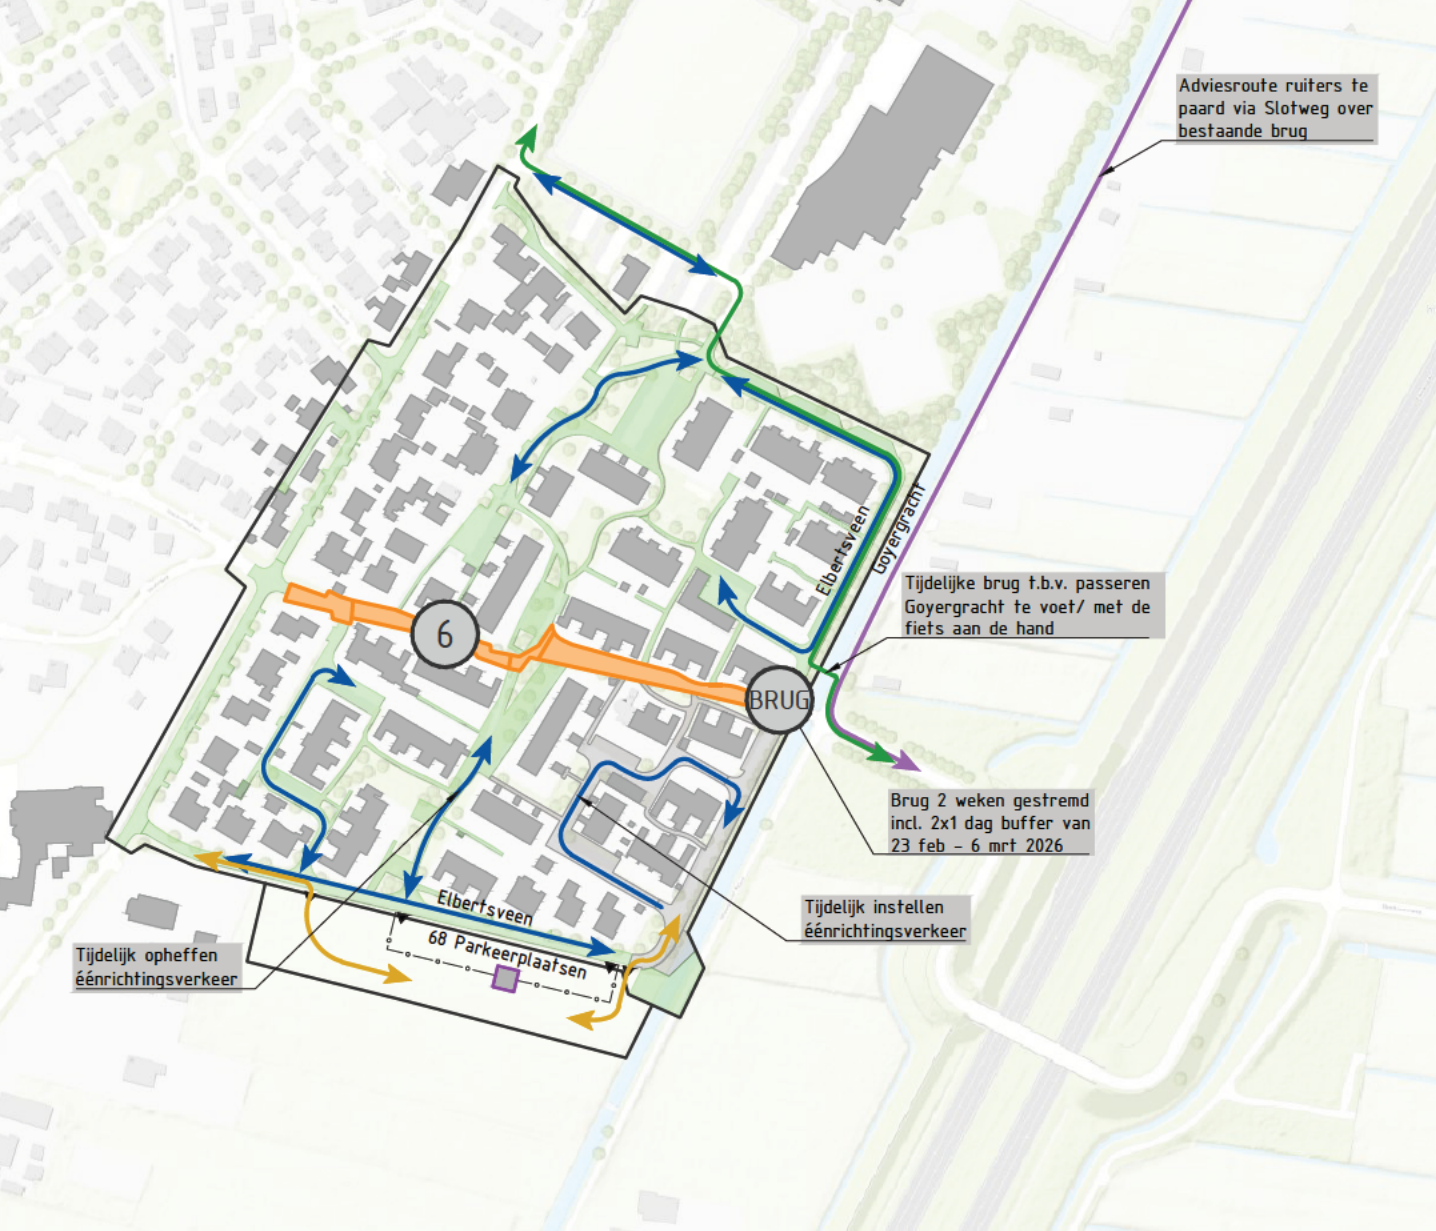

FASE 02 - Plaatsen tweede overstortput (nr. 1746)

2 - 10 maart 2026
2 weken

FASE 7 - Elbertsveen zuidzijde van de brug en Wezenboom

9 maart - 12 juni 2026
14 weken

