waalpartners civil engineering

Museumkwartier te Vlaardingen

Projectplanning (versie 3 d.d. 27-07-2021)

Waalpartners bv
Zuidweg 75, 2671 MP, Naaldwijk
Tel.: 0174 627791

Id	% voltooid	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1					
2	0%	**Planvorming**	320 dagen	woe 25-8-21	don 22-12-22
20					
21	0%	**Woningbouw**	580 dagen	woe 25-8-21	vri 29-12-23
22	0%	Stedenbouwkundig- & Beelkwaliteitsplan	72 dagen	woe 25-8-21	don 2-12-21
26	0%	Bouwkundigplan	285 dagen	maa 4-10-21	don 8-12-22
27	0%	VO bouwplan	90 dagen	maa 4-10-21	vri 18-2-22
33	0%	DO Bouwplan	195 dagen	maa 21-2-22	don 8-12-22
41	0%	Bouwen woningen	260 dagen	don 22-12-22	vri 29-12-23
42	0%	Museumkwartier	260 dagen	don 22-12-22	vri 29-12-23
43	0%	Gunning naar aannemer	0 dagen	don 22-12-22	don 22-12-22
44	0%	Voorbereidingsperiode bouwaannemer	3 mndn	maa 2-1-23	vri 24-3-23
45	0%	Start bouw	0 dagen	vri 24-3-23	vri 24-3-23
46	0%	Bouwperiode tot funderingsbalk	1 mnd	maa 27-3-23	vri 21-4-23
47	0%	Bouwperiode	8 mndn	maa 24-4-23	vri 1-12-23
48	0%	Bouwperiode steigervrij	1 mnd	maa 4-12-23	vri 29-12-23
49	0%	Bouw gereed	0 dagen	vri 29-12-23	vri 29-12-23
50	0%	Oplevering eerste woning	0 dagen	vri 29-12-23	vri 29-12-23
51					
52	6%	**Inventarisatie, Onderzoeken & Advies**	365 dagen	maa 5-10-20	don 24-3-22
81					
82	0%	**Civieltechnische voorbereiding**	585 dagen	din 4-5-21	don 14-9-23
125					
126	0%	**Vergunningen**	228 dagen	woe 28-4-21	don 24-3-22
144					
145	0%	**Kabels en leidingen**	526 dagen	maa 5-10-20	don 24-11-22
165					
166	0%	**Uitvoering Civiel**	110 dagen	vri 8-4-22	woe 28-9-22

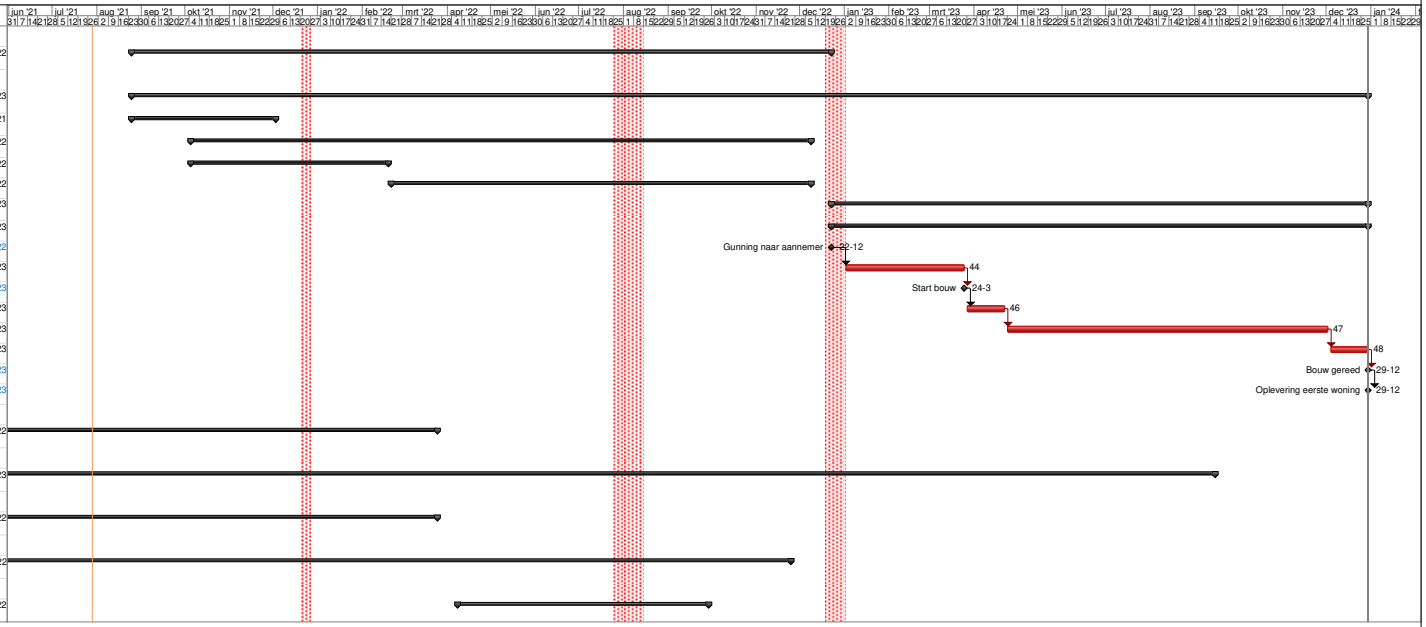

Project: 40118 planning Museumk
Datum: don 29-7-21

Taak	Mijlpaal	Projectsamenvatting	Externe mijlpaal	Inactieve mijlpaal	Handmatig taak	Handmatige samenvatting	Alleen begindatum	Deadline	Kritieke splitsing
Splitsing	Samenvatting	Externe taken	Inactieve taken	Inactieve samenvatting	Alleen duur	Handmatige samenvatting	Alleen einddatum	Kritiek	Voortgang
