


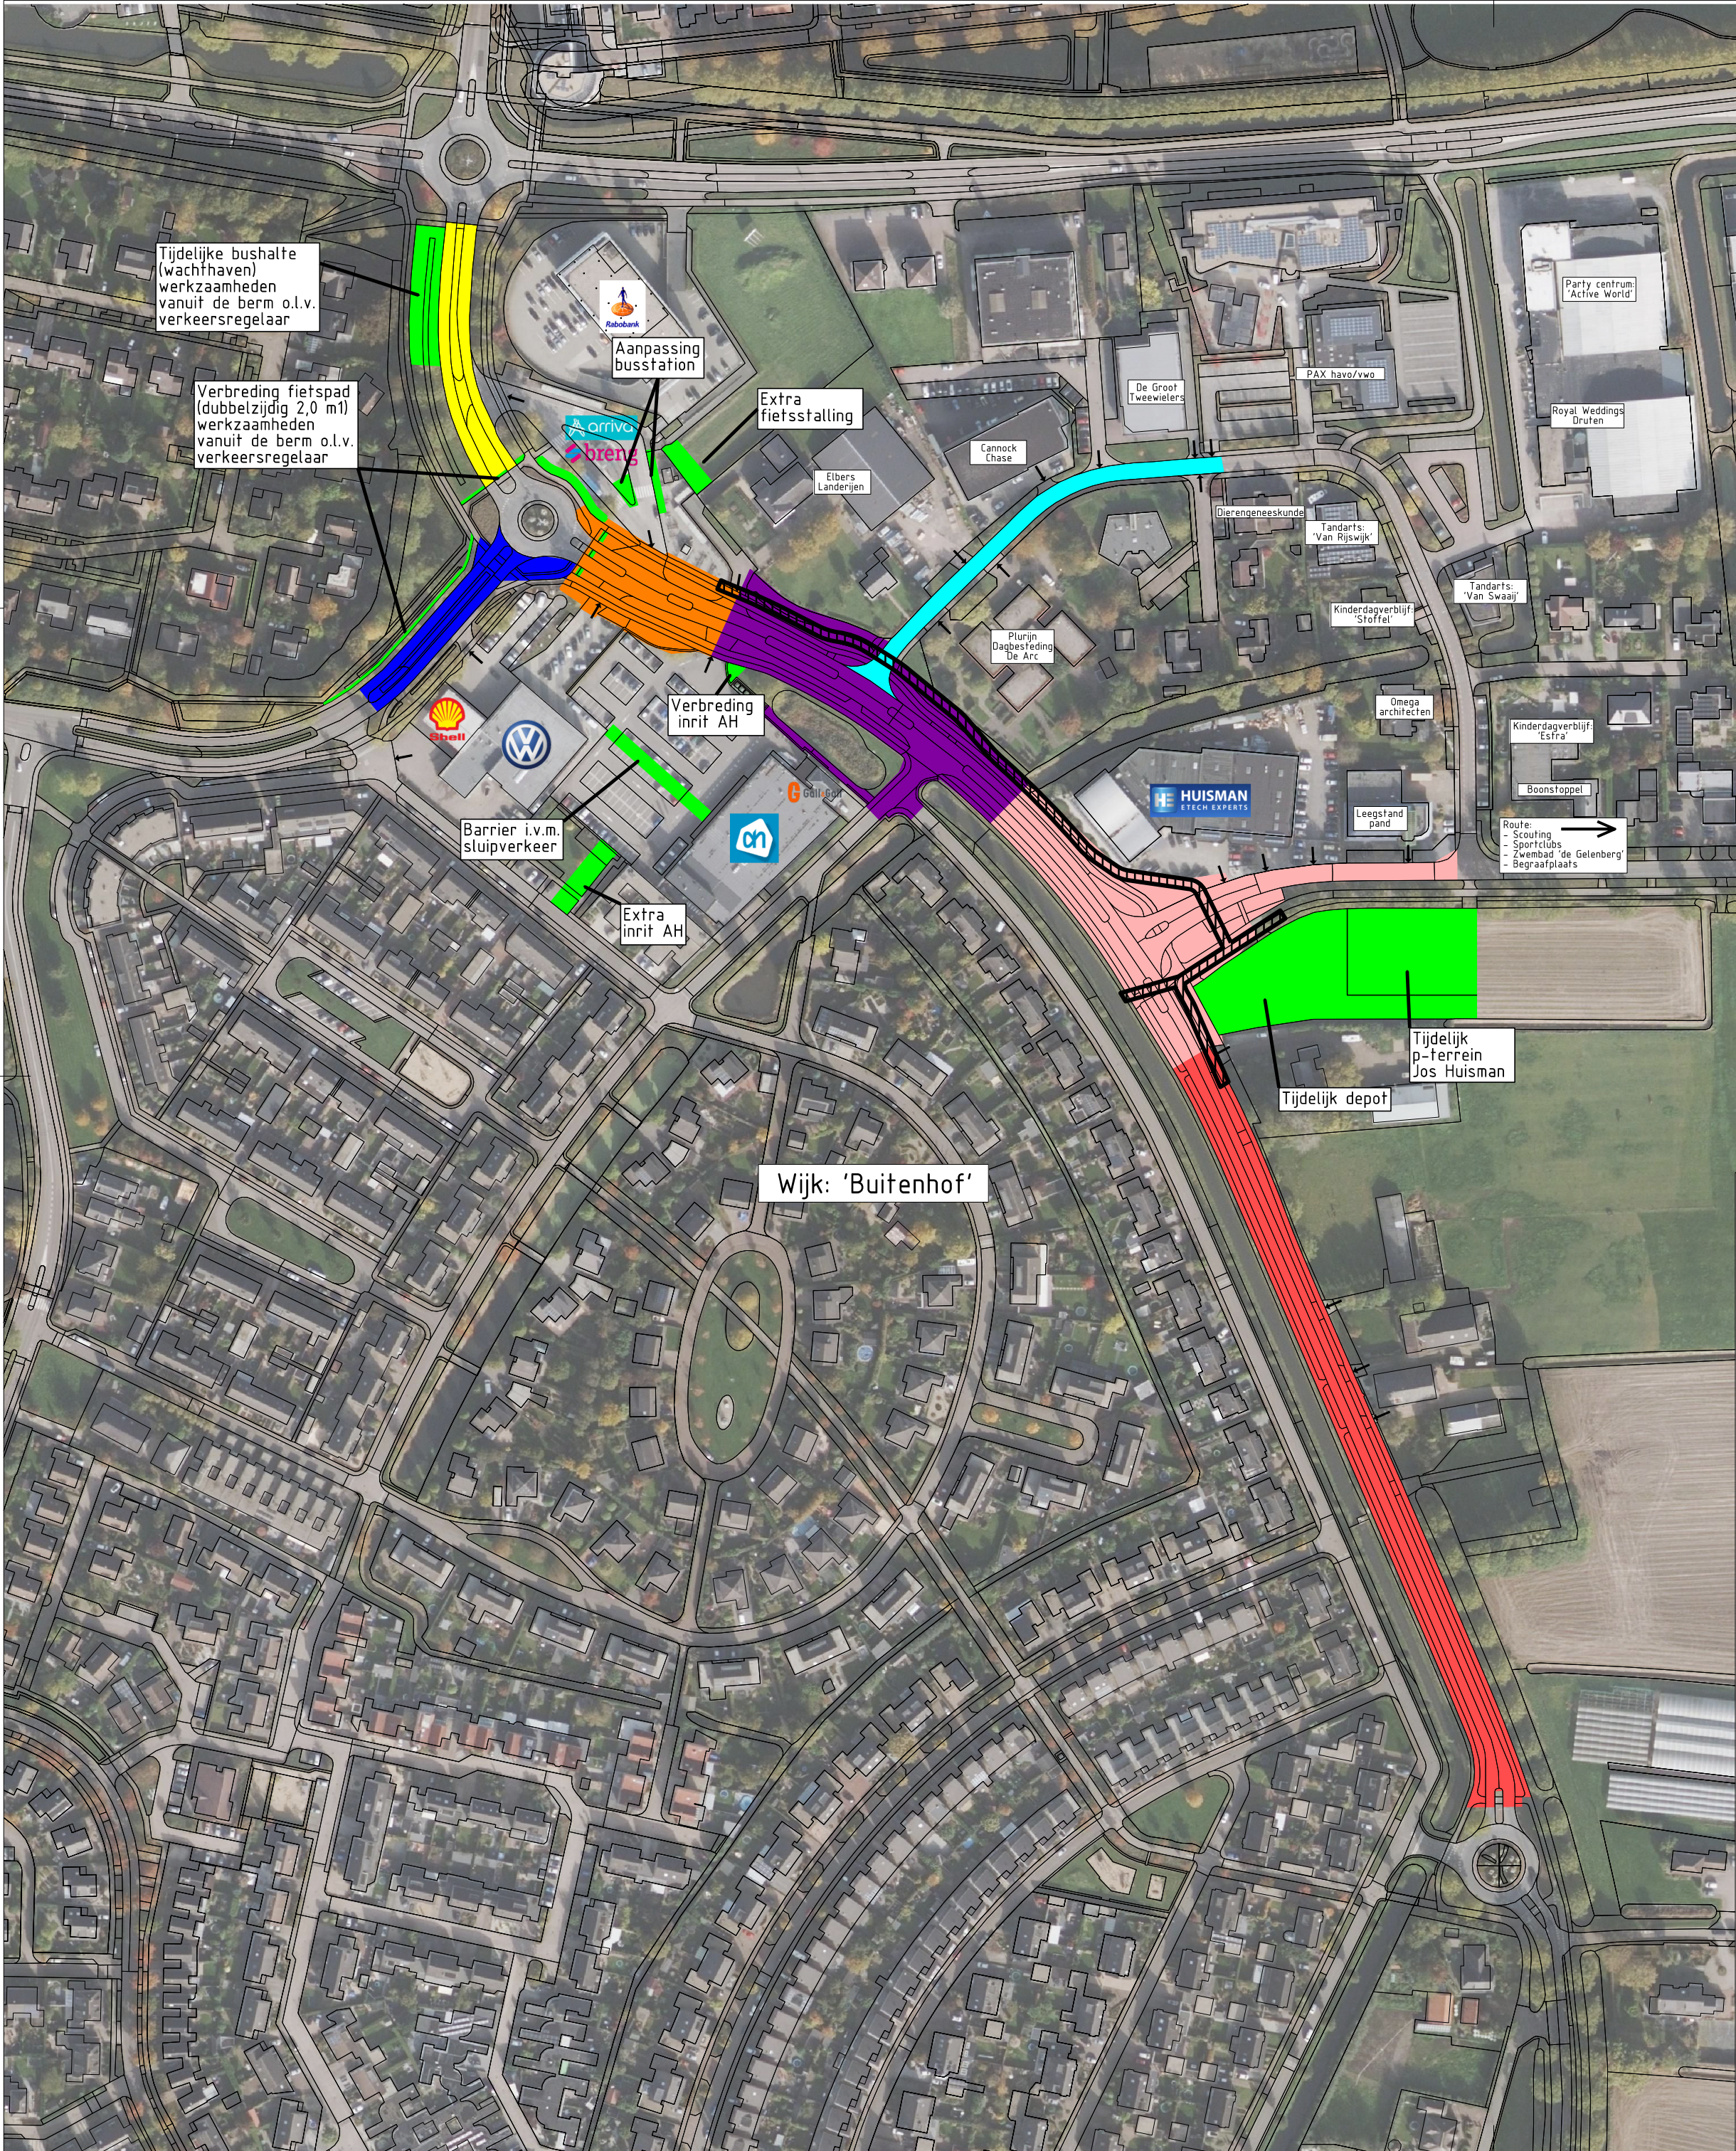

Krachtenveld stakeholdersanalyse Scharenburg Druten

Stakeholder categorie A:
Groot belang – veel invloed

Albert Heijn Druten/ Gall&Gall
Nutsbedrijven
Shell
De Waal autodealer
Huisman Etech Experts
Arriva en Breng (busstation Druten)
Nood- en hulpdiensten
Waterschap

Intensief samenwerken

Stakeholder categorie B:
Klein belang – veel invloed

Pers.
Provincie Gelderland
Politiek Druten

Betrekken en proactief informeren

Stakeholder categorie C:
Groot belang – weinig invloed

Bewoners Schipkeisingel
Bedrijven aan de Klepperheide
Bewoners Scharenbrug (No. 4, 4a, 6 en 8)
Pax ChristiCollege

Actief informeren

Stakeholder categorie D:
Klein belang – weinig invloed

Rabobank
Bewoners achterliggende wijken
Sportvelden, zwembad, scouting De Gelsenberg
Begraafplaats Koningstraat

Informeren

Tijdschema		Week:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Fase 0	Treffen EMVI-maatregelen																					
Fase 1	Werkvak 1 Koekoek																					
	Werkvak 2 Klepperheide																					
	Werkvak 3 Werkzaamheden nuts																					
Fase 2	Werkvak 1 Rotonde Koekoek tot inrit AH																					
	Werkvak 2 Werkzaamheden nuts																					
Fase 3	Werkvak 1 Inrit AH tot aan duiker																					
	Nachtwerk Deklaag asfalt fase 2 en 3 (1 nacht)																					
Fase 4	Werkvak 1 Duiker, rotonde en Koningstraat (incl. deklaag asfalt)																					
	Werkvak 2 Rotonde tot einde werk (incl. deklaag asfalt)																					
	Werkvak 3 Werkzaamheden nuts																					
Fase 5	Opruimen EMVI-maatregelen																					
	Nachtwerk Rotonde Koekoek tot rotonde van Heemstraweg (5 nachten)																					

In de week voor pasen
geen werkzaamheden in Koekoek en Scharenburg

